

			Relatório n°	10	
			Data do relatório	05/10/2023 - 04/11/2023	
			Dia da semana	Quinta-Feira até Sábado	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local		Prazo contratual	456 dias	
Local	Via Antonio Cruaães Filho		Prazo decorrido	304 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	152 dias

Fotos (18)



Muro Ala em concreto armado



Terraplenagem com aterro compactado.




Concretagem de bloco de fundação



Forma para bloco de fundação



Terraplenagem com aterro do muro gabião

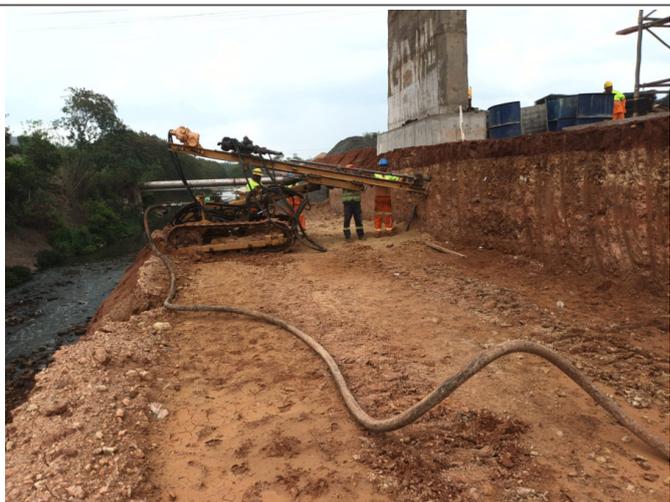

Solo Grampeado



Pilares em concreto armado



Pavimentação



Pavimentação com controle de espessura.



Recuperação estrutural



Controle de concreto



Execução de Sarjetão



Preparo de chumbadores para solo grampeado



Armação de muro em concreto armado.



Concreto projetado



Cimbramento de viga travessa



Análise de concreto e raio x de detecção de armadura do viaduto existente



Execução de canaletão de concreto

Aprovado | 30/10/2024 16:29

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil
