

			Relatório n°	12	
			Data do relatório	05/12/2023 - 04/01/2024	
			Dia da semana	Terça-Feira até Quinta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local		Prazo contratual	456 dias	
Local	Via Antonio Cruaães Filho		Prazo decorrido	365 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	91 dias

Fotos (14)



Forma de concreto de muro em L



Muro Atirantado



Instalação de postes de Iluminação Publica



Relocação de postes de Iluminação Publica



Terraplenagem Aterro



Concretagem de Muro Atirantado



Preparo de pateo para transporte de Vigas longarinas protendidas



Terraplenagem (aterro com correção de greide)



Preparo para protensão de vigas longarinas




Canaletão em concreto armado modelo DER



Terraplenagem (aterro compactado)



Execução de CBUQ

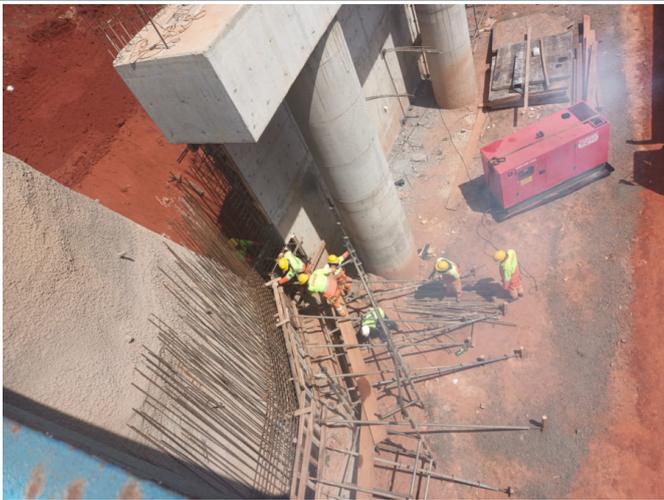

Armação de muro atirantado



Preparo de base para passagem de guindaste sob linha férrea



Aprovado | 30/10/2024 16:56

Nicola Manis
nicola.manis@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil
