

		Relatório n°	6		
		Data do relatório	01/02/2025 - 28/02/2025		
		Dia da semana	Sábado até Sexta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	97/2024		
Obra	Construção de Unidade Básica de Saúde - LOTE 02 - UBS Bairro Geada		Prazo contratual	304 dias	
Local	Rua Adão Francisco Dias, 140 - Bairro Geada		Prazo decorrido	249 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Cristiano Leone Mantovani (Execução)	Prazo a vencer	55 dias


Ocorrências (1)

Execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco), gesso.
 Aplicação de selado e pintura (interna e externa)
 Execução do revestimento cerâmico e piso em granilite pré-moldado.
 Execução das instalações de energia e dados, gases medicinais, água, esgoto e água pluvial. Regularização do solo.
 Estrutura metálica de cobertura e telha metálica.

Fotos (11)





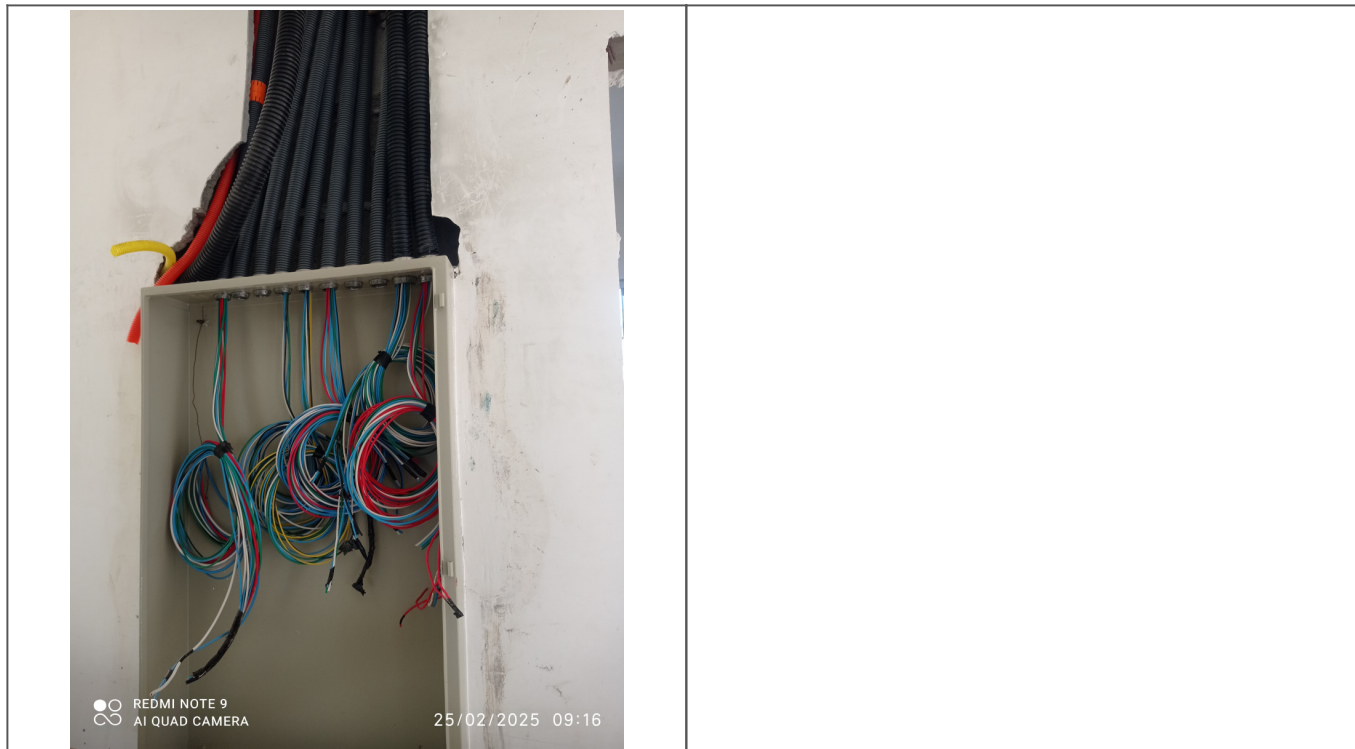

Aprovado 06/03/2025 09:56

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações
