

RELATÓRIO MENSAL

CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES
CONTRATO Nº 149/2024 MUNICÍPIO DE
LIMEIRA



BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

- OUTUBRO 2024 -

BOLETIM INFORMATIVO MENSAL



OUTUBRO 2024


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E ROTATÓRIAS COM MEDIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (CONTRATO 149/2024) – CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES

- Contrato de Modernização das 350 Praças com instalação de postes de Iluminação Pública nas tipologias 4 metros (1080 postes), 6 metros (710 postes) e 8 metros (340 postes), totalizando 2130 postes.
- Valor Global do Contrato: R\$ 10.817.649,91
- Início: 01/10/2024
- Término do Contrato: 30/06/2025



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

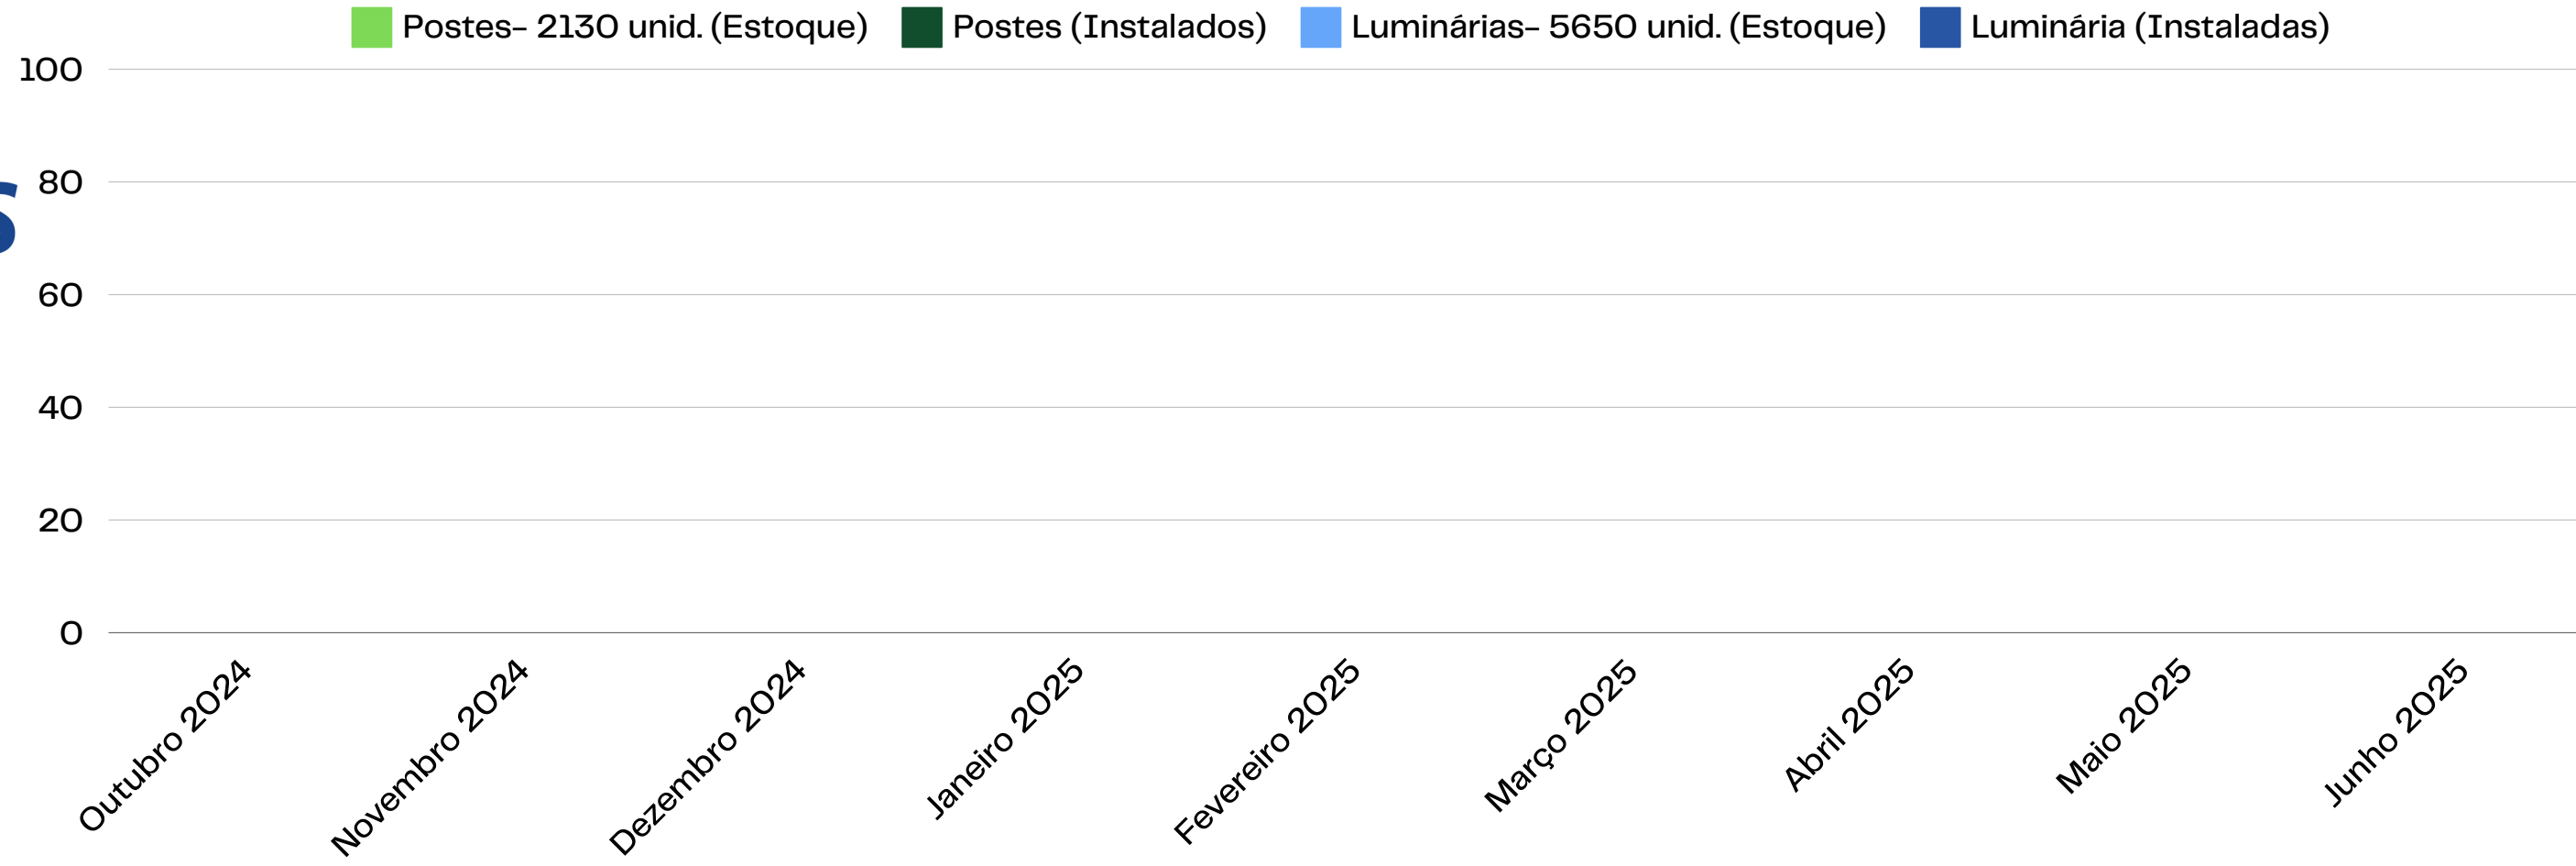


PONTOS POSITIVOS:

O início dos trabalhos na cidade de Limeira deu-se com a emissão das ordens de compra prioritárias para os materiais elétricos e civis. Em paralelo, foram iniciados os estudos luminotécnicos das praças selecionadas durante a reunião, garantindo o avanço das etapas de modernização conforme planejado. As obras civis já foram iniciadas, incluindo atividades como escavação, instalação de eletrodutos e reaterro, que estão em andamento e direcionamentos para progresso o contínuo das atividades. Esse trabalho garante o avanço das etapas de modernização conforme previsto no cronograma.

PONTOS NEGATIVOS:

Houve um atraso na entrega dos postes devido as chuvas intensas que causaram o desabamento da fabrica o que impactou no atraso da entrega.

AVANÇO CONTRATUAL

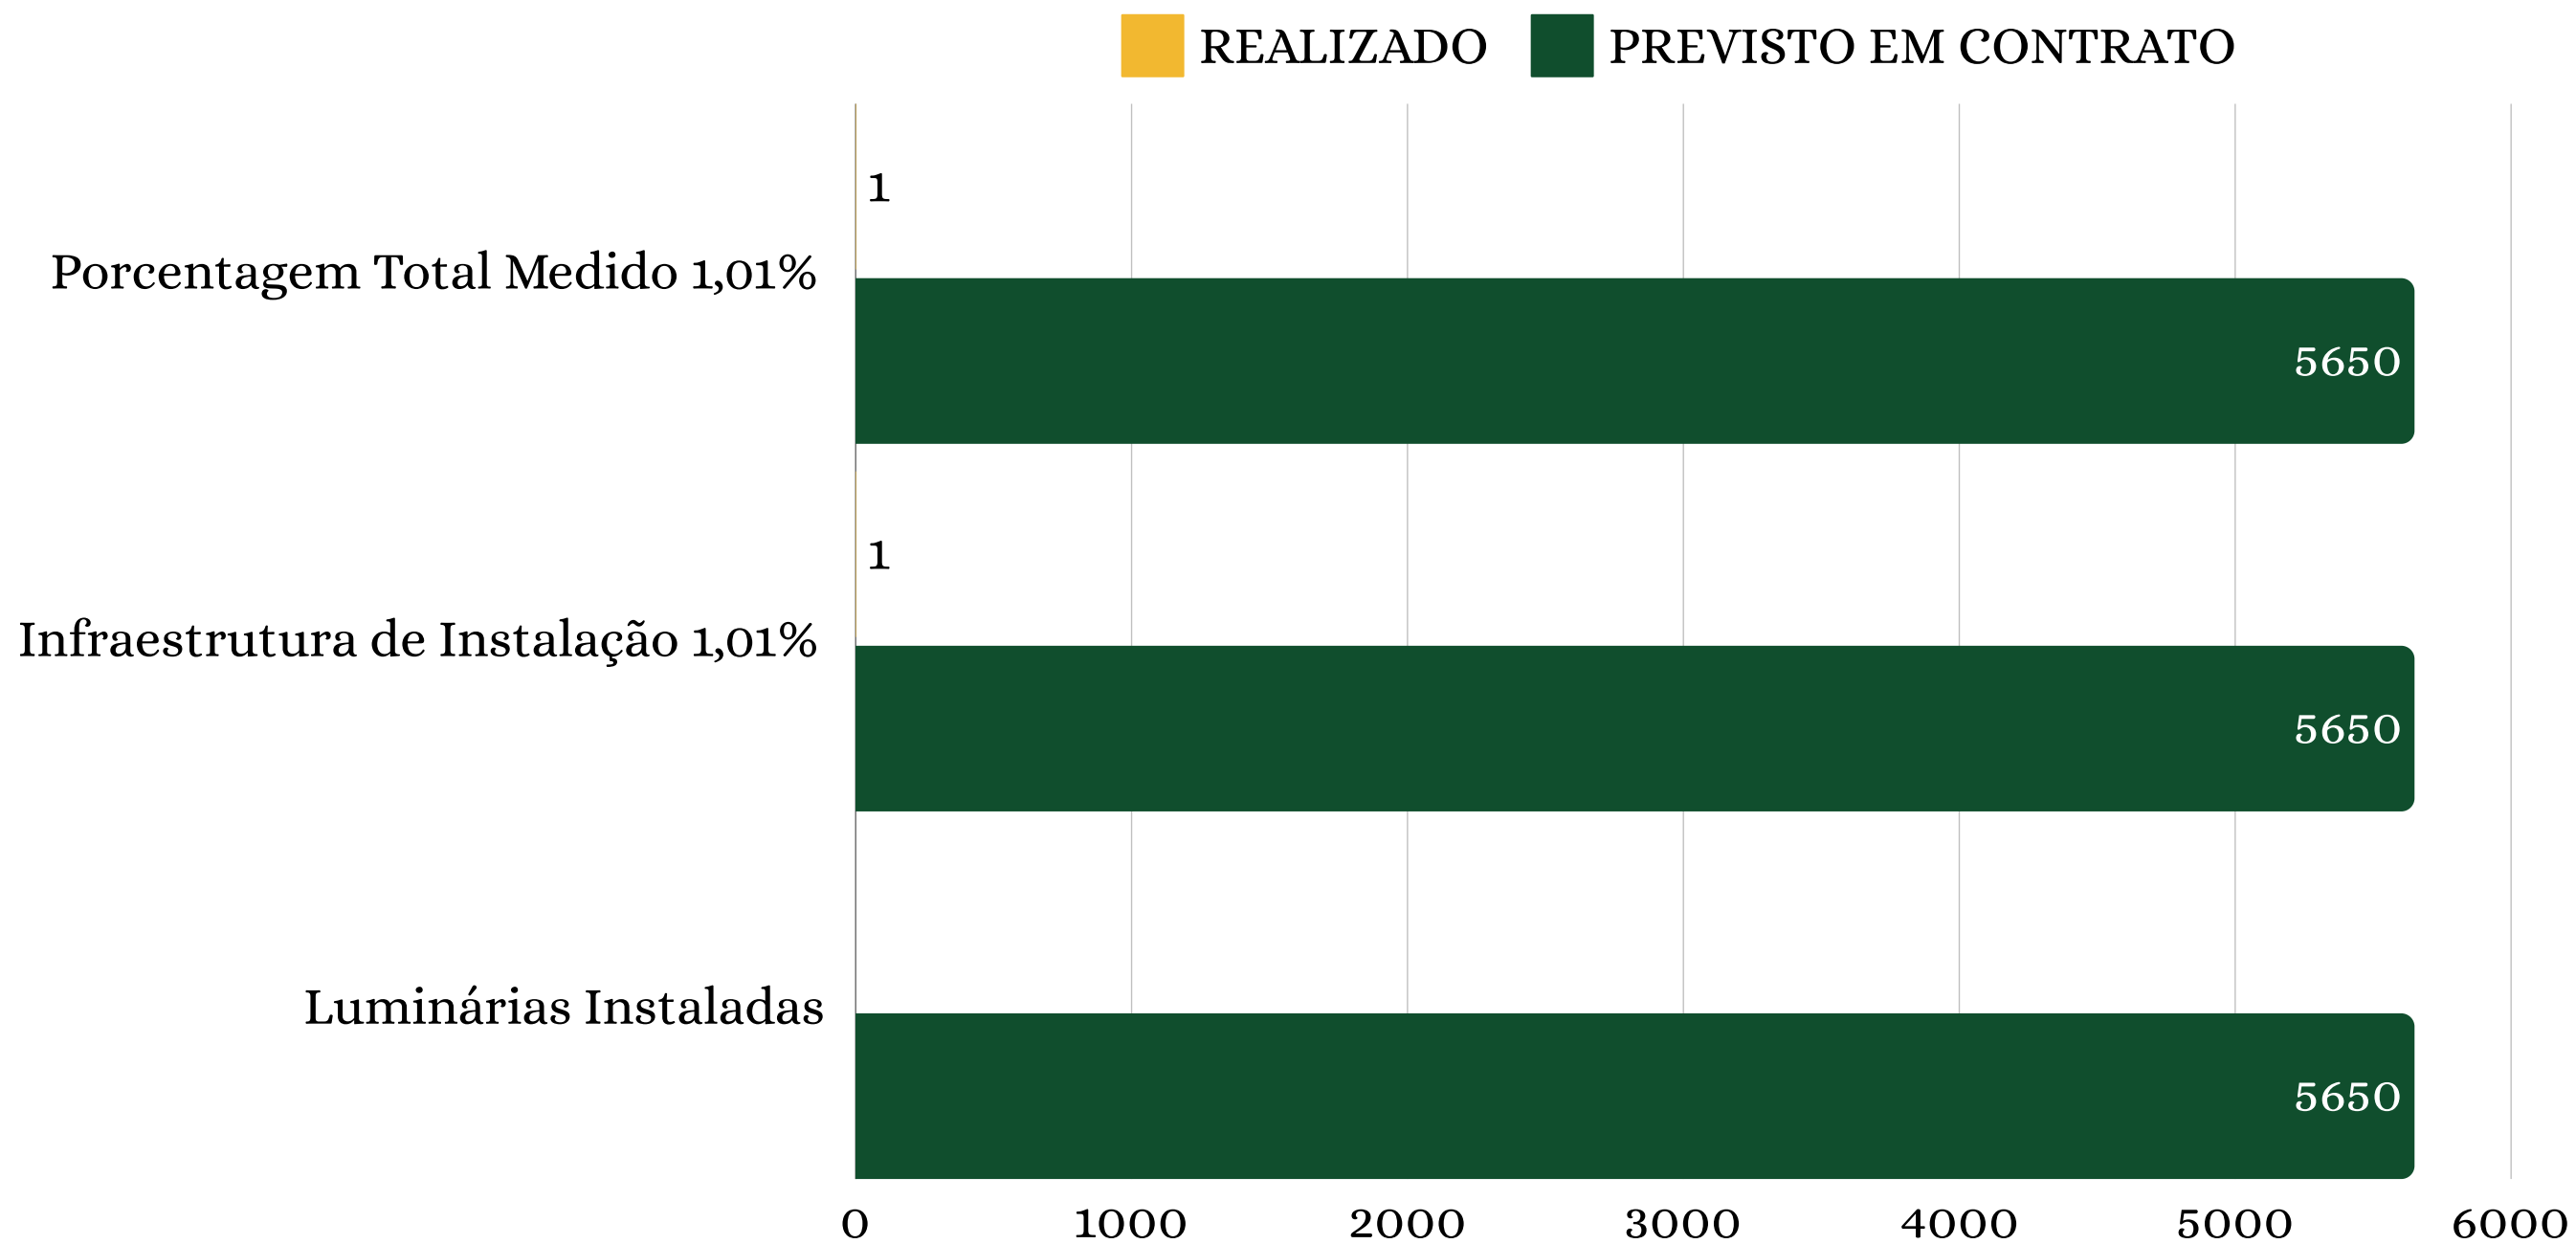

CRÉDITO VERDE LIMEIRA – BRASIL BNDES



Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos



1

Total de economia de energia propiciada pelo projeto: 0

2

Tempo do projeto: 0

3

Volume total de carbono capturado pelo projeto: 0 tCO₂e



OBSERVAÇÃO: Este item só poderá ser apresentado com a evolução do projeto

PONTOS RELEVANTES

MÊS DE OUTUBRO 2024



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



- **Vistoria Técnica:** Foram realizadas vistorias técnicas nas praças selecionadas para conhecer as condições atuais e identificar as áreas que serão modernizadas.
- **Análise de Localizações:** O projetista iniciou a análise das localizações dos postes existentes, a fim de elaborar os croquis que darão suporte aos estudos técnicos de luminotécnica.
- **Sinalização e Redefinição:** Foram realizadas as sinalizações das novas posições dos postes e a redefinição dos pontos de iluminação para a melhoria da distribuição luminotécnica das praças.
- **Preparação de Documentos:** O engenheiro responsável técnico da obra está organizando as medições realizando as ordens de compras prioritárias, elaborado os relatórios diários, bem como os relatórios semanais no padrão BNDES.
- **Início das Obras Civas:** Foram realizados serviços nas praças piloto e prioritárias de escavação (bases e passagem de infraestrutura dos eletrodutos), instalação de eletrodutos e reaterro das valas, nas seguintes praças:
 - UC 220132 - (PCA ADAO JOSE DUARTE DO PATEO, 0 - SEMA-IP - PRACA ADAO DUARTE DO PATEO)
 - UC 1308661 - (R ARGENTINA, 0 - SEMA-IP - PRACA - JD SANTANA)
 - UC 33062951 - (R IZABEL PACHECO, 36 - SEMA-IP - PRACA - JD BRASIL)



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



OBRIGADO!
