

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 26/10/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
NOME FANTASIA: R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ANTÔNIO DE BARROS, 314 - JARDIM PIRATININGA
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ: 64.141.708/0001-45
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9815-64168
INSC.MUNICIPAL: 18190
CEP: 13484-316
E-MAIL: rmalufengenharia@gmail.com
SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL: 417097585113
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
COMPLEMENTO: edifício prada
CPF/CNPJ/NIF: 45.132.495/0001-40
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP
TELEFONE: (19) 3404-9600
INSC.MUNICIPAL: 53153
CEP: 13481-900
E-MAIL: pmfz@limeira.sp.gov.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB

TOMADA DE PREÇOS 08/2023
CONTRATO 128/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.248/2022

DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2023

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER (033)
AG 0013
CC 13013961-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DIVISÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
31 OUT 2023
ASSINATURA

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

21/10/2023

Eng. Dagoberto de Campos
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 688.635,95
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 536.717,23
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 151.918,72
IR..... R\$ 8.263,63	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 27.048,73
INSS..... R\$ 18.785,10	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 10.734,34
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 151.918,72	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 650.852,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 92.621,54 Federal e 29.817,94 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00500
Data da Emissão
26/10/2023 15:20:38
Código de Verificação
B3FF0FAB3

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 16590

Pag. 1/ 1

Pague-se a: R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 05792
C.N.P.J. : 64.141.708/0001-45
C/C : Banco 0001 Ag. 3383-9 C/C 000000002367-1

A quantia de R\$ 688.635,95
Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco centavos *****

Vencimento 10/11/2023
Emissao 10/11/2023

Proveniente de : T.08/23-EXECUCAO DE PROJ.CONSTR.REFORMA TEATRO VITORIA

Nota de ----- DOTACAO -----					
Empenho	Org/Unid	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
05226	17.01.00	4.4.90.39.00	13.391.3001	2780 28428/2023	359.841,00
07732	17.01.00	4.4.90.39.00	13.391.3001	2780 28428/2023	328.794,95
I.S.S					10.734,34
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL					18.785,10
17003-(IR 1,2%)-SERVICO PRESTADOS C/ EMPREGO DE MA					8.263,63
VALOR LIQUIDO DA ORDEM					650.852,88

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
104	000317	0006.672008-3	CV	0829	EMENDAS ESPE Av.Deb.	322.057,93
104	000317	0006.672008-3	CV	0829	EMENDAS ESPE Av.Deb.	328.794,95
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						650.852,88

Responsavel: Emitente

KARINE DOS SANTOS
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-459.668.038-89

Ordenador:

ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 07732 de 27/10/2023 Processo: T00008-2023

Fornecedor: 05792 R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Descricao: EXECUCAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E
REFORMA - TEATRO VITORIA-PEDIDO:1085/23-----
Classificacao da Despesa No. 02806

Institucional

Orgao: 17 Secretaria de cultura
Unidade Orcamentaria: 01 Cultura e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 13 Cultura
Subfuncao: 391 Patr.historico, artistico e arqueologico
Programa: 3001 Valorizacao e universalizacao da cultura
Acao: 2780 Defesa do patrimonio historico e cultural

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.39.00 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 10/11/2023

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000500

Data da Exigibilidade.: 10/11/2023

Processo Contabil.....: 28428/2022-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao... 8000059 EMENDA ESPECIAL N.202230640003 - INVESTIMENTOS

Valor da Liquidacao: 328.794,95-----
EMITENTE

VILMA BARBOSA VIEIRA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-260.500.698-08

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTARIA

Empenho: 05226 de 27/06/2023 Processo: T00008-2023

Fornecedor: 05792 R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Descricao: EXECUCAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E
REFORMA - TEATRO VITORIA - PED.1085/2023

Classificacao da Despesa No. 02736

Institucional

Orgao: 17 Secretaria de cultura
Unidade Orcamentaria: 01 Cultura e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 13 Cultura
Subfuncao: 391 Patr.historico, artistico e arqueologico
Programa: 3001 Valorizacao e universalizacao da cultura
Acao: 2780 Defesa do patrimonio historico e cultural

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.39.00 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica

Data Liquidacao: 10/11/2023

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000500

Data da Exigibilidade.: 10/11/2023

Processo Contabil.....: 28428/2022-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao... 8000059 EMENDA ESPECIAL N.202230640003 - INVESTIMENTOS
-----Valor da Liquidacao: 359.841,00

EMITENTE

_____
VILMA BARBOSA VIEIRA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CPF-260.500.698-08

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672008-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.132.495/0001-40

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0013/00013013961-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	64.141.708/0001-45
Valor:	R\$ 650.852,88
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	10/11/2023
Data da Operação:	10/11/2023
Código da Operação:	00119864
Chave de Segurança:	U3WF3S77PKKVRANW
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIM
Conta Origem:	0317/006/00672008-3
Conta Destino:	0317/006/00000174-3
Nome do Destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 37.783,07
Identificação da Operação:	03_REMUNERACAO_PESSOAL_TE
Data de Débito:	10/11/2023 - 16:01:14
Data da Operação:	10/11/2023
Código da Operação:	83277196
Chave de Segurança:	F7SRRHYCM2S6PRMZ
Operação realizada com sucesso.	

Insc. Municipal: 53153
 CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
 Empresa: MUNICIPIO DE LIMEIRA
 Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFICIO PRADA / CENTRO
 CEP: 13.481-900 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

OUTUBRO/2023

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Nº Controle: 04143361

MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
259	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38684	NFS (A)	26/10/2023	4.03	CA	0%	Tributada	Dentro	21.267,18	21.267,18	0,00	0,00	-
260	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38685	NFS (A)	26/10/2023	4.03	CA	0%	Tributada	Dentro	7.262,36	7.262,36	0,00	0,00	-
261	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38686	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	5.224,65	5.224,65	0,00	0,00	0
262	13.374.725/0001-91	ROGER PETRIK DOS SANTOS	00105	NFS (A)	26/10/2023	17.11	A	2%	Retida	Dentro	1.350,00	1.350,00	27,00	27,00	0
263	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38687	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	21.267,18	21.267,18	0,00	0,00	0
264	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38688	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	7.626,36	7.626,36	0,00	0,00	0
265	22.573.292/0001-94	EMPREITEIRA GSA EIRELI	00091	NFS (M)	26/10/2023	7.02	A	2%	Retida	Dentro	90.000,00	90.000,00	1.800,00	1.800,00	0
266	64.141.708/0001-45	R MALUF ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	00500	NFS (A)	26/10/2023	7.02	A	2%	Retida	Dentro	688.635,95	536.717,23	10.734,34	10.734,34	0
267	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38689	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	491.259,71	491.259,71	0,00	0,00	0
268	51.469.187/0001-08	SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA	01133	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	563.387,90	563.387,90	0,00	0,00	0
269	51.469.187/0001-08	SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA	01134	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	904,96	904,96	0,00	0,00	0
270	51.469.187/0001-08	SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA	01135	NFS (A)	26/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	61.732,41	61.732,41	0,00	0,00	0
271	54.017.108/0001-16	MECÂNICA SCIAMART LTDA ME	00690	NFS (A)	26/10/2023	14.01	A	3.37%	Retida	Dentro	74,00	74,00	2,49	2,49	0
272	51.469.187/0001-08	SOCIEDADE OPERARIA HUMANITARIA	01138	NFS (A)	27/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	38.844,83	38.844,83	0,00	0,00	0
273	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	38691	NFS (A)	27/10/2023	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	39.940,52	39.940,52	0,00	0,00	0
274	10.324.311/0001-60	DHOMA CONSTRUTORA LTDA EPP	00142	NFS (A)	27/10/2023	7.02	A	2%	Retida	Dentro	23.357,78	23.357,78	467,16	467,16	0
275	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	01058	NFS (A)	27/10/2023	7.02	A	2%	Retida	Dentro	375.037,69	338.981,23	6.779,62	6.779,62	0
276	23.610.910/0001-91	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA	00241	NFS (A)	27/10/2023	7.02	A	2%	Retida	Dentro	226.065,88	178.297,59	3.565,95	3.565,95	0
277	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00369	NFS (A)	30/10/2023	14.01	A	2%	Retida	Dentro	233,64	233,64	4,67	4,67	0
278	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00370	NFS (A)	30/10/2023	14.01	A	2%	Retida	Dentro	804,77	804,77	16,10	16,10	0
279	05.113.984/0001-30	PAULA CRISTINA DE ÂNGELO MOURA LIMEIRA - ME	00101	NFS (A)	30/10/2023	16.02	A	2.41%	Retida	Dentro	22.346,73	22.346,73	538,56	538,56	0
280	38.226.337/0001-94	LUCAS FELIPE DE LIMA SOUZA ME	00195	NFS (A)	30/10/2023	17.06	A	2%	Retida	Dentro	426,66	426,66	8,53	8,53	0
281	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00371	NFS (A)	30/10/2023	14.01	A	2%	Retida	Dentro	2.621,98	2.621,98	52,44	52,44	0
282	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00372	NFS (A)	30/10/2023	14.01	A	2%	Retida	Dentro	2.855,62	2.855,62	57,11	57,11	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO GERAL
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

TERMO DE CONTRATO Nº 128/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DOTAÇÃO Nº 17.01.00 - 4.4.90.39.00 - 13 391 3001 2780




ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> 1.028.670,72

VALOR DESTA MEDIÇÃO =====> 688.635,95
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO =====> 66,94%

ACUMULADO [PORCENTAGEM] =====> 66,94%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] =====> 33,06%

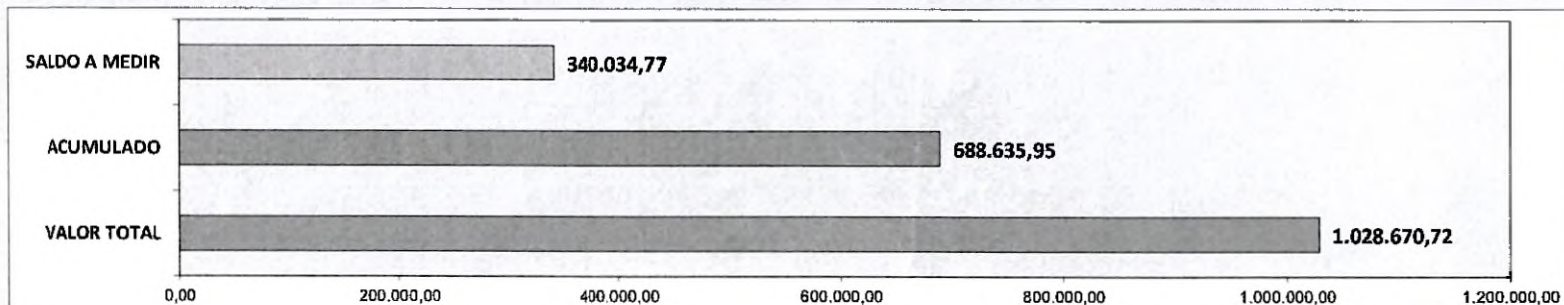

FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato	VISTO: Recursos	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1	1a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi		Osmar R. da Silva Engº Civil CREA 5053595040	Daniilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5081.85068-2
de	PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Secretário Municipal de Obras			
13		e Serviços Públicos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM	M2	6,00	219,88	1.319,28	100,00%	6,00	1.319,28	100,00%	6,00	1.319,28		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ,CONFORME PERCENTUAIS	GL	1,0000	28.470,00	28.470,00	66,94%	0,6694	19.059,03	66,94%	0,6694	19.059,03	0,3306	9.410,97
2	INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
2.1	EXTINTORES												
2.1.1	RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 10BC	UN	3,00	10,19	30,57	100,00%	3,00	30,57	100,00%	3,00	30,57		
2.1.2	RETIRADA EXTINTOR - PQS 4 KG - 20 BC	UN	3,00	10,19	30,57	100,00%	3,00	30,57	100,00%	3,00	30,57		
2.1.3	RETIRADA EXTINTOR - ÁGUA 10 L - 2A	UN	3,00	10,19	30,57	100,00%	3,00	30,57	100,00%	3,00	30,57		
2.1.4	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG -	UN	6,00	237,00	1.422,00							6,00	1.422,00
2.1.5	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS -	UN	4,00	240,19	960,76							4,00	960,76
2.1.6	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG -	UN	1,00	321,38	321,38							1,00	321,38
2.2	SINALIZAÇÃO												
2.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - A5	UN	11,00	20,25	222,75							11,00	222,75
2.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA - C1	UN	36,00	15,38	553,68							36,00	553,68
2.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E1	UN	2,00	20,25	40,50							2,00	40,50
2.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E2 / E3	UN	6,00	15,88	95,28							6,00	95,28
2.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - E5	UN	13,00	20,25	263,25							13,00	263,25
2.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME - E7	UN	3,00	15,88	47,64							3,00	47,64
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
2 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Osmeir R. F. Silva Engº Civil CREA 5053595049			Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.2.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA - E17 - 1,00 X 1,00 M	M2	16,00	44,63	714,08							16,00	714,08
2.2.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (1,10X1,70M), COM INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA - M1	UN	1,00	1.088,75	1.088,75							1,00	1.088,75
2.2.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2A	UN	1,00	57,00	57,00							1,00	57,00
2.2.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (886X443M), COM INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA - M2B	UN	1,00	228,75	228,75							1,00	228,75
2.2.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (443X221M), COM INDICAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - M3	UN	3,00	57,00	171,00							3,00	171,00
2.2.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (0,316X0,158M), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA - S1	UN	1,00	29,00	29,00							1,00	29,00
2.2.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (380X190M), COM INDICAÇÃO DE ROTAS - S2-18 / S8-2 / S9-3 / S10-1 / S11-1 / S12-14 / S13-3	UN	42,00	42,00	1.764,00							42,00	1.764,00
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
3.1	FOLHA 01 - PAVIMENTO TÉRREO												
3.1.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	22,00	367,75	8.090,50	100,00%	22,00	8.090,50	100,00%	22,00	8.090,50		
3.1.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	UN	3,00	380,88	1.142,64							3,00	1.142,64
3.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	M	10,00	13,00	130,00	100,00%	10,00	130,00	100,00%	10,00	130,00		
3.1.4	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	UN	2,00	120,38	240,76	100,00%	2,00	240,76	100,00%	2,00	240,76		
3.1.5	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	UN	2,00	105,25	210,50	100,00%	2,00	210,50	100,00%	2,00	210,50		
3.1.6	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	18,00	319,44	5.749,92	100,00%	18,00	5.749,92	100,00%	18,00	5.749,92		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
3 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Osmer R. de Silva Engº Civil CREA 5063595040			Dario Rodrigues Maluf Eng. Civil CREA 506185068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.7	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	M	26,00	46,94	1.220,44							26,00	1.220,44
3.1.8	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,68	17,44	11,86	100,00%	0,68	11,86	100,00%	0,68	11,86		
3.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	75,00	7,40	555,00	100,00%	75,00	555,00	100,00%	75,00	555,00		
3.1.10	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO SAÍDA SLIM FACE ÚNICA 50X25CM VERDE COM SELETOR E ADESIVO	UN	3,00	104,00	312,00							3,00	312,00
3.1.11	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, SINALIZAÇÃO BANHEIRO FU 30X20 SLIM	UN	2,00	158,00	316,00							2,00	316,00
3.1.12	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE -	CJ	2,00	325,38	650,76							2,00	650,76
3.2	FOLHA 01 - PAVIMENTO INFERIOR												
3.2.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	4,00	367,75	1.471,00	75,00%	3,00	1.103,25	75,00%	3,00	1.103,25	1,00	367,75
3.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,38	30,76							2,00	30,76
3.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO -	M	80,00	13,00	1.040,00	100,00%	80,00	1.040,00	100,00%	80,00	1.040,00		
3.2.4	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	6,00	319,44	1.916,64							6,00	1.916,64
3.2.5	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -	M	30,00	46,94	1.408,20							30,00	1.408,20
3.2.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,78	17,44	13,60							0,78	13,60
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
4	1a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi						Comar. R. da Silva			Daniilo Rodrigues Maluf		
de	PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Secretário Municipal de Obras						Engº Civil			Engº Civil		
13		e Serviços Públicos						CREA 5053595040			CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	120,00	7,40	888,00							120,00	888,00
3.2.8	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES -	M2	0,25	5.288,25	1.322,06							0,25	1.322,06
3.2.9	CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF -	UN	1,00	404,44	404,44							1,00	404,44
3.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A -	UN	2,00	158,19	316,38							2,00	316,38
3.2.11	EXAUSTOR AXIAL 1 (COM DUTO SOB PATAMAR) 'QUALITAS' MODELO EQ300M6 1.200M³/H - 220V	UN	4,00	1.222,75	4.891,00							4,00	4.891,00
3.2.12	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -	KG	21,56	69,19	1.491,74							21,56	1.491,74
3.3	FOLHA 01 - MEZANINO												
3.3.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	5,00	367,81	1.839,05	80,00%	4,00	1.471,24	80,00%	4,00	1.471,24	1,00	367,81
3.3.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS -	UN	3,00	380,88	1.142,64							3,00	1.142,64
3.3.3	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V -	UN	1,00	937,50	937,50	100,00%	1,00	937,50	100,00%	1,00	937,50		
3.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,38	30,76							2,00	30,76
3.3.5	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO -	UN	1,00	120,38	120,38	100,00%	1,00	120,38	100,00%	1,00	120,38		
3.3.6	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA -	UN	1,00	105,31	105,31	100,00%	1,00	105,31	100,00%	1,00	105,31		
3.3.7	SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 -	UN	2,00	204,19	408,38	100,00%	2,00	408,38	100,00%	2,00	408,38		
3.3.8	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	6,00	319,44	1.916,64	83,33%	5,00	1.597,20	83,33%	5,00	1.597,20	1,00	319,44
3.3.9	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	3,00	46,94	140,82	100,00%	3,00	140,82	100,00%	3,00	140,82		
3.3.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,08	17,44	1,40	100,00%	0,08	1,40	100,00%	0,08	1,40		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
5 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Osmar R. da Silva Engº Civil CREA 5053595040			Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	10,00	7,40	74,00	100,00%	10,00	74,00	100,00%	10,00	74,00		
3.4	FOLHA 02 - PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO												
3.4.1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W -	UN	7,00	367,81	2.574,67	100,00%	7,00	2.574,67	100,00%	7,00	2.574,67		
3.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,41	15,41							1,00	15,41
3.4.3	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL -	UN	10,00	319,44	3.194,40	100,00%	10,00	3.194,40	100,00%	10,00	3.194,40		
3.4.4	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	3,00	46,94	140,82	100,00%	3,00	140,82	100,00%	3,00	140,82		
3.4.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	0,08	17,44	1,40	100,00%	0,08	1,40	100,00%	0,08	1,40		
3.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	20,00	7,40	148,00	100,00%	20,00	148,00	100,00%	20,00	148,00		
3.5	ILUMINAÇÃO PISO E ESCADAS												
3.5.1	BALIZADOR LED EXTERNO PAREDE SOBREPOR LED 3W - 127 V 4000K	UN	20,00	90,44	1.808,80	50,00%	10,00	904,40	50,00%	10,00	904,40	10,00	904,40
3.5.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS -	M	34,00	37,88	1.287,92	100,00%	34,00	1.287,92	100,00%	34,00	1.287,92		
3.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES -	M	102,00	7,40	754,80	100,00%	102,00	754,80	100,00%	102,00	754,80		
3.5.4	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA -	CJ	2,00	32,19	64,38							2,00	64,38
3.5.5	CONDULETE METÁLICO DE 3/4" -	CJ	2,00	46,56	93,12	100,00%	2,00	93,12	100,00%	2,00	93,12		
3.5.6	PERFIL DE BALIZAMENTO DIMERIZAVEL LED 1,2W/M-12VCC TEMP. COR 4000K, ALUMÍNIO ESTRUDADO ANODIZADO PRETO, DIFUSOR EM PVC FUMÊ TRANSLÚCIDO- REFERÊNCIA POWER LUME	m	180,00	232,00	41.760,00	80,00%	144,00	33.408,00	80,00%	144,00	33.408,00	36,00	8.352,00

FOLHA 6 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	VISTO: Gestor do Contrato	VISTO: Recursos	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Osmar R. da Silva Engº Civil CREA 5033595040	Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.5.7	CABO PARALELO BICOLOR 2X2,5MM ² - PARA INTERLIGAÇÃO PERFIL DE BALIZAMENTO- REFERÊNCIA TIAFLEX	m	70,00	14,63	1.024,10	100,00%	70,00	1.024,10	100,00%	70,00	1.024,10		
3.5.8	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZAVEL ENTRADA 127/220VCA - SAÍDA 12VCC DIMERIZAVEL-POTÊNCIA 180W	un	2,00	643,50	1.287,00							2,00	1.287,00
3.5.8	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	40,00	46,94	1.877,60	100,00%	40,00	1.877,60	100,00%	40,00	1.877,60		
3.5.8	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM	M	40,00	46,56	1.862,40	100,00%	40,00	1.862,40	100,00%	40,00	1.862,40		
3.5.8	RECOMPOSIÇÃO DE RASGO NO PISO	M	40,00	15,94	637,60	100,00%	40,00	637,60	100,00%	40,00	637,60		
3.6	SPDA												
3.6.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 -	UN	4,00	881,38	3.525,52							4,00	3.525,52
3.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2 -	UN	1,00	3.280,13	3.280,13							1,00	3.280,13
3.6.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) -	UN	4,00	168,06	672,24							4,00	672,24
3.6.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS -	M	6,00	47,75	286,50							6,00	286,50
3.6.5	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa -	UN	2,00	83,94	167,88							2,00	167,88
3.6.6	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM ² -	M	270,00	69,31	18.713,70	100,00%	270,00	18.713,70	100,00%	270,00	18.713,70		
3.6.7	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM ² -	M	50,00	46,06	2.303,00	100,00%	50,00	2.303,00	100,00%	50,00	2.303,00		
3.6.8	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO -	M	115,00	41,94	4.823,10							115,00	4.823,10
3.6.9	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M -	UN	16,00	198,63	3.178,08	100,00%	16,00	3.178,08	100,00%	16,00	3.178,08		
3.6.10	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 50-50MM ² A 95- 50MM ² -	UN	64,00	77,44	4.956,16	100,00%	64,00	4.956,16	100,00%	64,00	4.956,16		
3.6.11	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM ² A 95MM ² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" -	UN	16,00	77,38	1.238,08	100,00%	16,00	1.238,08	100,00%	16,00	1.238,08		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
7 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Osmer R. da Silva Engº Civil CREA 5053595040			Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.6.12	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO CABO DE 16MM² A 70MM² -	UN	10,00	43,25	432,50	100,00%	10,00	432,50	100,00%	10,00	432,50		
3.6.13	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² -	UN	4,00	56,25	225,00	100,00%	4,00	225,00	100,00%	4,00	225,00		
3.6.14	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² -	UN	4,00	30,88	123,52							4,00	123,52
3.6.15	CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 3/16" (4,76 MM) -	M	20,00	26,63	532,60							20,00	532,60
3.6.16	CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2" -	UN	6,00	256,13	1.536,78							6,00	1.536,78
3.6.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M -	M3	40,50	73,00	2.956,50	100,00%	40,50	2.956,50	100,00%	40,50	2.956,50		
3.6.18	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO -	M3	40,50	22,69	918,95	100,00%	40,50	918,95	100,00%	40,50	918,95		
3.6.19	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	M2	135,00	47,44	6.404,40	90,00%	121,50	5.763,96	90,00%	121,50	5.763,96	13,50	640,44
3.6.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA -	UN	135,00	22,00	2.970,00							135,00	2.970,00
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
3.7.1	REMOÇÃO DE SUPORTE PARA CABO DE PARA-RAIOS	UN	60,00	13,25	795,00							60,00	795,00
3.7.2	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS -	M	120,00	46,94	5.632,80							120,00	5.632,80
3.7.3	CONDULETE METÁLICO DE 3/4" -	CJ	40,00	46,56	1.862,40							40,00	1.862,40
3.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -	M	360,00	4,38	1.576,80							360,00	1.576,80
3.7.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	UN	1,00	254,44	254,44							1,00	254,44
3.7.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM -	UN	2,00	254,44	508,88							2,00	508,88
3.7.7	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS -	M	20,00	222,13	4.442,60							20,00	4.442,60
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
8	1a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi						Camila R. da Silva			Daniel Rodrigues Maluf		
de	PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						Engª Civil			Eng. Civil		
13								CREA 5053595040			CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.7.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM -	M	20,00	95,94	1.918,80							20,00	1.918,80
3.7.9	RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 -	UN	7,00	23,25	162,75							7,00	162,75
3.7.10	LAMPADA LED BULBO 50 W	UN	7,00	82,81	579,67							7,00	579,67
3.7.11	REMOÇÃO DE CONDUTOR ESPECIAL -	M	150,00	42,06	6.309,00							150,00	6.309,00
4	SERVIÇOS ARQUITETÔNICO												
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
4.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS - PARTE SUPERIOR DIVISÓRIA	M2	1,13	8,00	9,04	100,00%	1,13	9,04	100,00%	1,13	9,04		
4.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO - FURO Ø 300 MM	M3	0,06	97,25	6,22							0,06	6,22
4.1.3	RETIRADA DE DEGRAU EM MADEIRA -	M	16,00	16,13	258,08	100,00%	16,00	258,08	100,00%	16,00	258,08		
4.1.4	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - GUARDA CORPO ESCADAS CAMARIM	M	6,70	16,13	108,07	100,00%	6,70	108,07	100,00%	6,70	108,07		
4.1.5	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS - GUARDA CORPO METÁLICO MEZANINO	M	44,52	12,94	576,09	100,00%	44,52	576,09	100,00%	44,52	576,09		
4.1.6	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS - CORRIMÃO DE MADEIRA ACESSO MEZANINO	M	47,22	16,13	761,66	100,00%	47,22	761,66	100,00%	47,22	761,66		
4.1.7	RETIRADA DAS CADEIRAS DA PLATÉIA E DO MEZANINO	UN	1,00	5.465,00	5.465,00	100,00%	1,00	5.465,00	100,00%	1,00	5.465,00		
4.1.8	RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA - CARPETE	M2	855,43	5,38	4.602,21	100,00%	855,43	4.602,21	100,00%	855,43	4.602,21		
4.1.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - DEGRAUS DE CONCRETO NA PLATÉIA DO MEZANINO	M3	2,22	486,69	1.080,45	100,00%	2,22	1.080,45	100,00%	2,22	1.080,45		
4.1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M - RAMPA EXTERNA	M3	0,80	73,00	58,40	100,00%	0,80	58,40	100,00%	0,80	58,40		
4.1.11	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL -	M3	102,96	144,44	14.871,54	90,00%	92,66	13.383,81	90,00%	92,66	13.383,81	10,30	1.487,73
FOLHA 9 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	VISTO: Gestor do Contrato Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização Osmar R. da Silva Engº Civil CREA 5053595040			VISTO: Contratada Danilo Rodrigues Maluf Eng. Civil CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2	TROCAR CAIXILHO PARA FIXAR EXAUSTOR												
4.2.1	REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PADRÃO - GRADE DE PROTEÇÃO E CAIXILHO	UN	2,76	41,88	115,59							2,76	115,59
4.2.2	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA - 95 X 40 CM - 2 UNDS	M2	0,76	944,38	717,73							0,76	717,73
4.2.3	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM -	M2	2,76	221,00	609,96							2,76	609,96
4.2.4	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - GRADE DE PROTEÇÃO	M2	2,00	53,94	107,88							2,00	107,88
4.3	ESCADAS METÁLICA E CONCRETO - ACESSO AO PAVTO. INFERIOR												
4.3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA - ESCADAS - 3,35X0,80 M - 2 UNDS	KG	371,40	25,00	9.285,00	100,00%	371,40	9.285,00	100,00%	371,40	9.285,00		
4.3.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA -	KG	371,40	6,94	2.577,52	100,00%	371,40	2.577,52	100,00%	371,40	2.577,52		
4.3.3	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA -	KG	371,40	3,69	1.370,47	80,00%	297,12	1.096,37	80,00%	297,12	1.096,37	74,28	274,09
4.3.4	PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA -	M3	0,20	4.049,63	809,93	100,00%	0,20	809,93	100,00%	0,20	809,93		
4.3.5	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" -	UN	20,00	30,75	615,00	100,00%	20,00	615,00	100,00%	20,00	615,00		
4.3.6	SELANTE DE POLIURETANO	M	42,00	51,25	2.152,50							42,00	2.152,50
4.3.7	DEGRAU (PISO E ESPELHO) EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA COM TESTEIRA ? COLADO - DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DO IPT E CERTIFICADO DO LOTE CLASSE IIA P/ CMAR	M	16,00	281,25	4.500,00							16,00	4.500,00
4.4	DEGRAUS DO MEZANINO												
4.4.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM -	M2	12,87	105,00	1.351,35	100,00%	12,87	1.351,35	100,00%	12,87	1.351,35		
4.4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM -	M3	0,60	1.106,88	664,13	100,00%	0,60	664,13	100,00%	0,60	664,13		
4.4.3	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA CAIXÃO PERDIDO -	M2	9,18	148,13	1.359,83	100,00%	9,18	1.359,83	100,00%	9,18	1.359,83		
4.4.4	ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO P-1 -	M3	1,13	412,75	466,41	100,00%	1,13	466,41	100,00%	1,13	466,41		

FOLHA 10 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	VISTO: Gestor do Contrato	VISTO: Recursos	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Osmar R. da Silva Engº Civil CREA 5063595040	Daniel Rodrigues Maluf Eng. Civil CREA 5061.85068-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.4.5	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO -	KG	30,93	17,69	547,15	100,00%	30,93	547,15	100,00%	30,93	547,15		
4.4.6	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA -	M3	0,43	574,13	246,88	100,00%	0,43	246,88	100,00%	0,43	246,88		
4.4.7	CHAPISCO -	M2	10,05	8,31	83,52	100,00%	10,05	83,52	100,00%	10,05	83,52		
4.4.8	CIMENTADO DESEMPENADO -	M2	21,57	40,25	868,19	100,00%	21,57	868,19	100,00%	21,57	868,19		
4.5	REVESTIMENTO PAREDE												
4.5.1	CHAPISCO -	M2	100,00	8,31	831,00							100,00	831,00
4.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 -	M2	100,00	44,13	4.413,00							100,00	4.413,00
4.5.3	GUARNIÇÃO DE MADEIRA - ARREMATE CARPETE NA PAREDE	M	78,10	12,00	937,20	80,00%	62,48	749,76	80,00%	62,48	749,76	15,62	187,44
4.6	REVESTIMENTO PISO												
4.6.1	REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM - PISO E PAREDE	M2	855,43	194,75	166.594,99	80,00%	684,34	133.275,22	80,00%	684,34	133.275,22	171,09	33.319,78
4.6.2	DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M	80,30	480,38	38.574,51							80,30	38.574,51
4.6.3	RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M	58,72	107,50	6.312,40							58,72	6.312,40
4.6.4	REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO -	M2	10,88	542,38	5.901,09							10,88	5.901,09
4.6.5	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA -	M2	7,18	55,38	397,63							7,18	397,63
4.6.6	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA -	M	9,50	7,50	71,25							9,50	71,25
4.7	ESQUADRIAS METÁLICAS												
4.7.1	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE -	M	69,80	590,00	41.182,00	100,00%	69,80	41.182,00	100,00%	69,80	41.182,00		
FOLHA		VISTO: Gestor do Contrato			VISTO: Recursos			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
11 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos						Gsmar R. de Silva Engº Civil CREA 5063595040			Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB**

CONTRATADA:
**R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.7.2	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' -	M	13,50	1.729,50	23.348,25	100,00%	13,50	23.348,25	100,00%	13,50	23.348,25		
4.7.3	GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' - COMPLEMENTO GUARDA-CORPO MEZANINO - H=0,40 M	M2	8,66	1.880,00	16.280,80							8,66	16.280,80
4.7.4	CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE -	M2	36,94	2.043,50	75.486,89	90,01%	33,25	67.946,38	90,01%	33,25	67.946,38	3,69	7.540,52
4.8	PINTURA												
4.8.1	VERNIZ INTUMESCENTE - MADEIRA, TETOS, FORROS, PISOS, PALCO	M2	692,35	54,63	37.823,08	90,00%	623,12	34.041,05	90,00%	623,12	34.041,05	69,23	3.782,03
4.8.2	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS- PAREDES INTERNAS	M2	2.035,58	37,81	76.965,28	90,00%	1.832,02	69.268,68	90,00%	1.832,02	69.268,68	203,56	7.696,60
4.8.3	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - TETO	M2	402,81	37,81	15.230,25	100,00%	402,81	15.230,25	100,00%	402,81	15.230,25		
4.8.4	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 2 DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS	M2	1.836,79	37,81	69.449,03	60,00%	1.102,07	41.669,27	60,00%	1.102,07	41.669,27	734,72	27.779,76
4.8.5	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO -	M2	50,00	56,06	2.803,00							50,00	2.803,00
4.8.6	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA - FRONTAL PALCO	M2	19,20	33,13	636,10							19,20	636,10
4.8.7	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -	M2	304,50	55,63	16.939,34	60,00%	182,70	10.163,60	60,00%	182,70	10.163,60	121,80	6.775,73
4.8.8	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS -	M2MES	588,00	16,13	9.484,44	100,00%	588,00	9.484,44	100,00%	588,00	9.484,44		
4.8.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M - PARTE INTERNA	M2	1.601,50	14,75	23.622,13	100,00%	1.601,50	23.622,13	100,00%	1.601,50	23.622,13		
4.8.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA SUPERIOR A 10 M - PARTE EXTERNA	M2	1.836,79	37,50	68.879,63	60,00%	1.102,07	41.327,63	60,00%	1.102,07	41.327,63	734,72	27.552,00
4.9	DIVERSOS												
4.9.1	INVERTER SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS DO FOYER - 1,50 X 2,10 M	UN	2,00	611,25	1.222,50							2,00	1.222,50
4.9.2	APLICAR TRATAMENTO ANTI-CHAMA NA CORTINA DO PALCO E CARPETES	M2	930,00	17,50	16.275,00							930,00	16.275,00

FOLHA 12 de 13	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 19-JUN a 18-SET-2023	VISTO: Gestor do Contrato		VISTO: Recursos		VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada	
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos				Osmar R. de Silva Engº Civil CREA 5053595040		Danilo Rodrigues Maluf Engº Civil CREA 5061.85068-2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA PARA ADEQUAR AS DEPENDÊNCIAS DO
TEATRO VITÓRIA PARA RECEBIMENTO DE AVCB
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
R. MALUF ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 64.141.708/0001-45

[illegible]
