

  			Relatório n°	4	
			Data do relatório	05/04/2023 - 04/05/2023	
			Dia da semana	Quarta-Feira até Quinta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	05/2023	
Obra	Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local			Prazo contratual	456 dias
Local	Via Antonio Cruaães Filho			Prazo decorrido	120 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	Prazo a vencer	336 dias

Fotos (9)



Motoniveladora para Terraplenagem



Início de terraplenagem margeando rio Tatu



Área coberta para corte e dobra de aço



Caminhões basculantes para transporte de materiais de terraplenagem



Recebimento de Pedra Rachão para futura execução de muro Gabião




Redes de Drenagem



Colocação de Gabião saco para base do muro



Caixas de drenagem

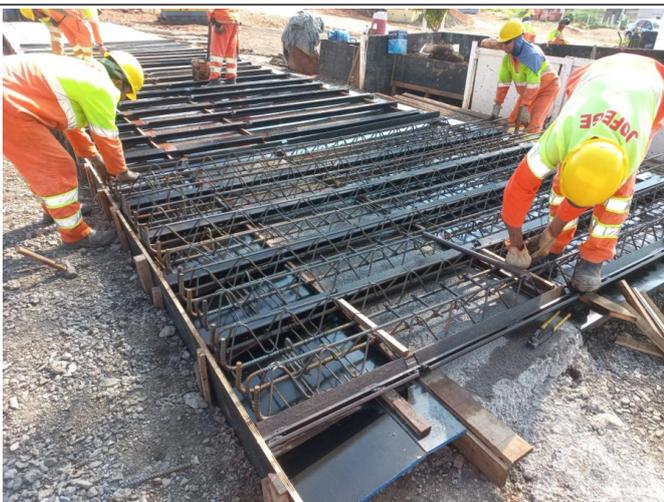

Formas para prelaje
