



Período 01/05 a 31/05/2023





5º Mês, Período 01/05 a 31/05/2023





CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.

■ Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias

■ Valor Global do Contrato: 26.876.761,83

■ Início: 27/09/2022

■ Término do Contrato: 26/03/2024

5º Mês, Período 01/05 a 31/05/2023





## RESULTADO ECONÔMICO

Natureza	Orçado Abril	%	Realizado Abril	%	Orçado até Abril	%	Realizado até Abril	%
Faturamento Bruto	1.347.832	100,00	2.050.107	100,00	5.443.121	100,00	3.660.154	100,00
Dedução de Faturamento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Impostos S/ Faturamento	-152.305	-11,30	-259.805	-12,67	-615.072	-11,30	-470.291	-12,85
Faturamento Líquido	1.195.526	100,00	1.790.302	100,00	4.828.047	100,00	3.189.862	100,00
Material	-956.421	-80,00	-1.435.125	-80,16	-3.821.092	-79,14	-2.528.001	-79,25
Subcontratação	0	0,00	-25.537	-1,43	-39.850	-0,83	-42.239	-1,32
Pessoal (OP)	-72.997	-6,11	-63.664	-3,56	-291.466	-6,04	-255.417	-8,01
Veículos (OP)	-49.097	-4,11	-45.536	-2,54	-196.388	-4,07	-147.658	-4,63
Estrutura (OP)	-1.150	-0,10	-6.242	-0,35	-4.600	-0,10	-65.598	-2,06
Viagem (OP)	0	0,00	-14.578	-0,81	-11.610	-0,24	-21.889	-0,69
Margem Contributiva	115.860	9,69	199.617	11,15	463.038	9,59	129.055	4,05
Pessoal	-29.742	-2,49	-27.107	-1,51	-107.989	-2,24	-99.210	-3,11
Veículos	-4.535	-0,38	-5.289	-0,30	-18.140	-0,38	-18.787	-0,59
Estrutura	-12.696	-1,06	-12.506	-0,70	-50.410	-1,04	-64.699	-2,03
Viagem	80	0,01	-1.617	-0,09	-9.355	-0,19	-8.229	-0,26
Margem Bruta	68.966	5,77	153.097	8,55	277.141	5,74	-61.872	-1,94


5º Mês, Período 01/05 a 31/05/2023







## **AVANÇO CONTRATUAL**

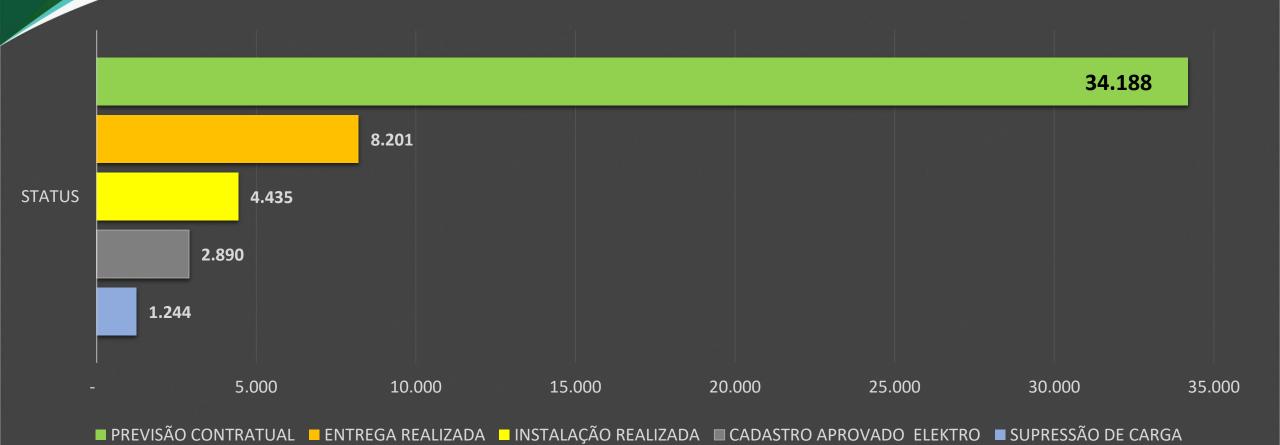


5º Mês, Período 01/05 a 31/05/2023







## ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

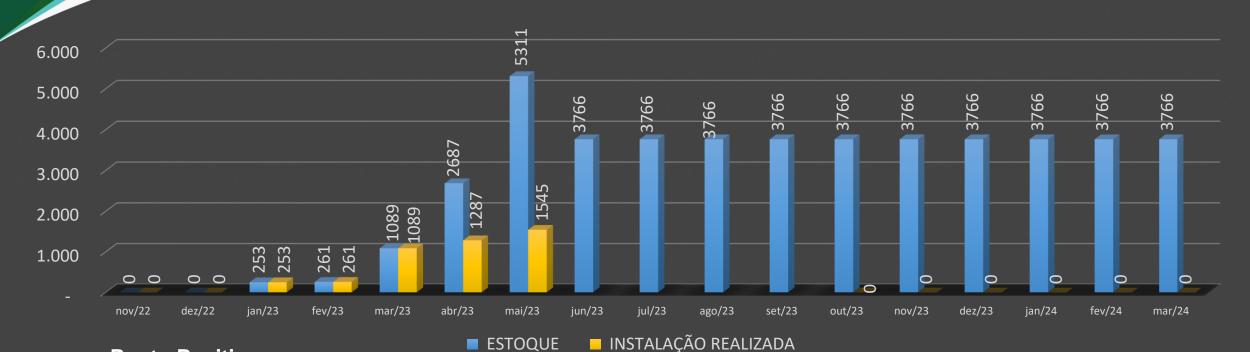

#### **Ponto Positivo:**

Instalação de 1.545 luminárias de Led nas principais Avenidas e bairros da cidade de Limeira. Entrega de 3911 luminárias.


#### **Ponto Negativo:**

Aguardando entrega de 1.233 luminárias que foram para realizar conserto na fábrica da Unicoba.

5º Mês, Período 01/05 a 31/05/2023





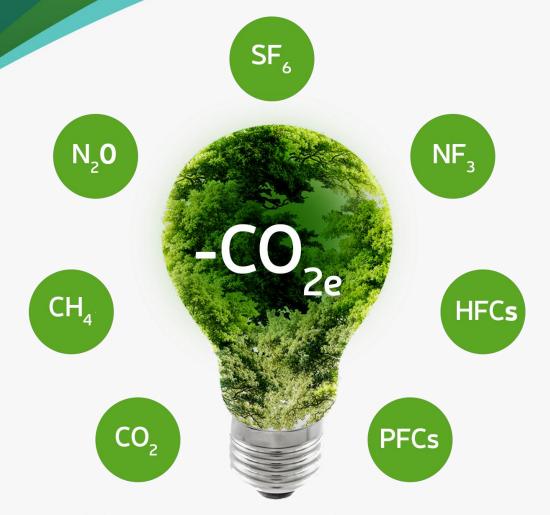

## CRÉDITO VERDE LIMEIRA BRASIL BNDES

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos						
1- Total de economia de energia propiciada pelo projeto:	<b>536.040,72</b> kWh/ano					
2 - Tempo do projeto:	1 ano					
3 - Total de economia Acumulado pelo projeto:	<b>1.584.140</b> kWh/ano					
1 - Volume total de carbono capturado pelo projeto:	44,1 tCO2e					
2 - Volume Acumulado de carbono capturado pelo projeto:	130,3tCO2e					

5º Mês, Período 01/5 a 31/05/2023







### **PONTOS RELEVANTES**

Condições climáticas estáveis ao longo do mês de Maio, sendo que, dois dias com chuvas intensas.

Cumprimento nas ações do cronograma operacional: (i) contratação de mais uma equipe operacional (ii) início dos trabalhos no Anél Viário e (iii) contratação de mais uma equipe da empresa terceirizada;

Avanço com a entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro: (i) envio de 1.545 pontos de Iluminação modernizados no mês de maio, (ii) recebimento da carta de aceite da concessionária referente a entrega do mês de março e (iii) aguardando a retirada de 118 pontos pertencentes a condomínios privados.

Dificuldades na execução das atividades: (i) modernização de avenidas com poste de madeira e (ii) poste com enxame de abelhas, aguardando apoio da concessionária Elektro.

# Obrigado-!



www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
