

9º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

Período 01/09 a 30/09/2023



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.


- **Contrato de Modernização de:** 34.188 luminárias
- **Valor Global do Contrato:** 26.876.761,83
- **Início:** 27/09/2022
- **Término do Contrato:** 26/03/2024

9º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

9º Mês. Período
01/09 a 30/09/2023



AVANÇO CONTRATUAL

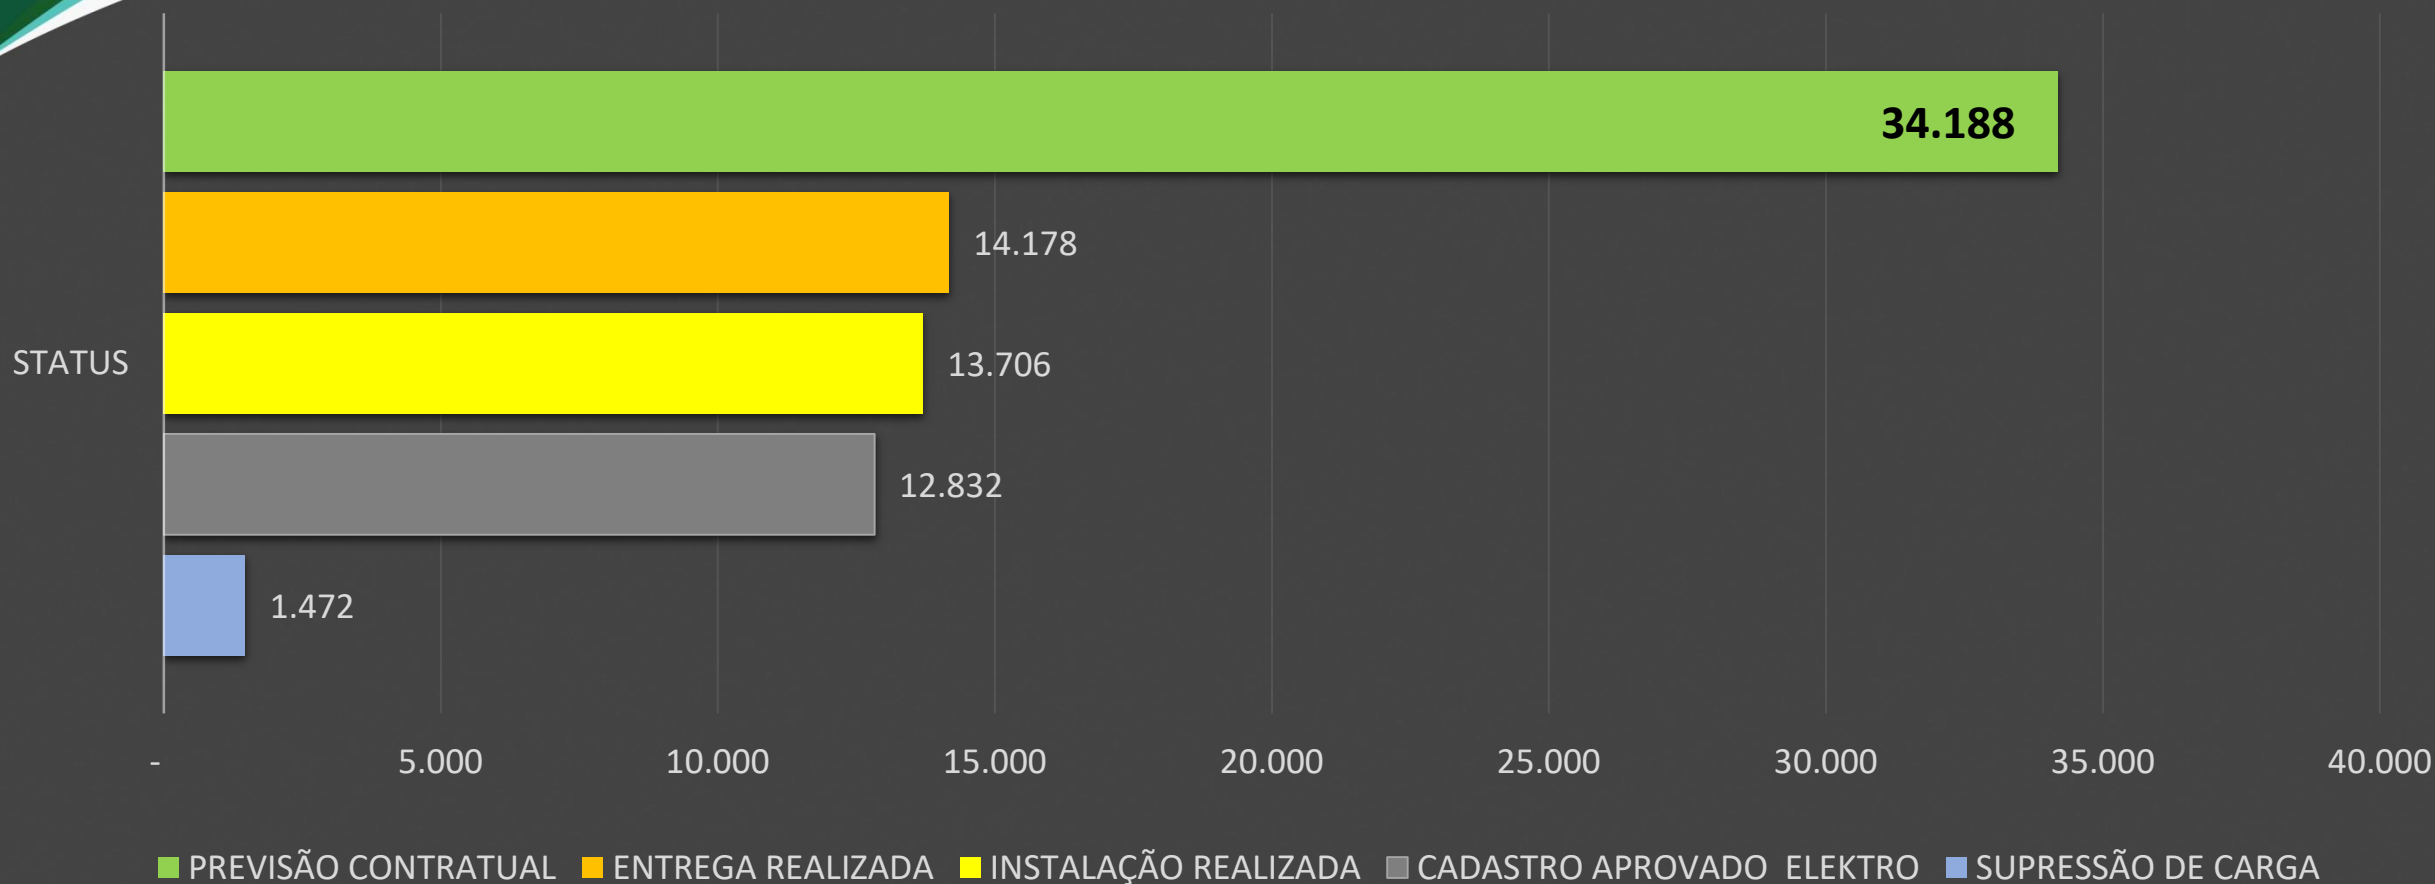


9º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

9º Mês. Período
01/09 a 30/09/2023



ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

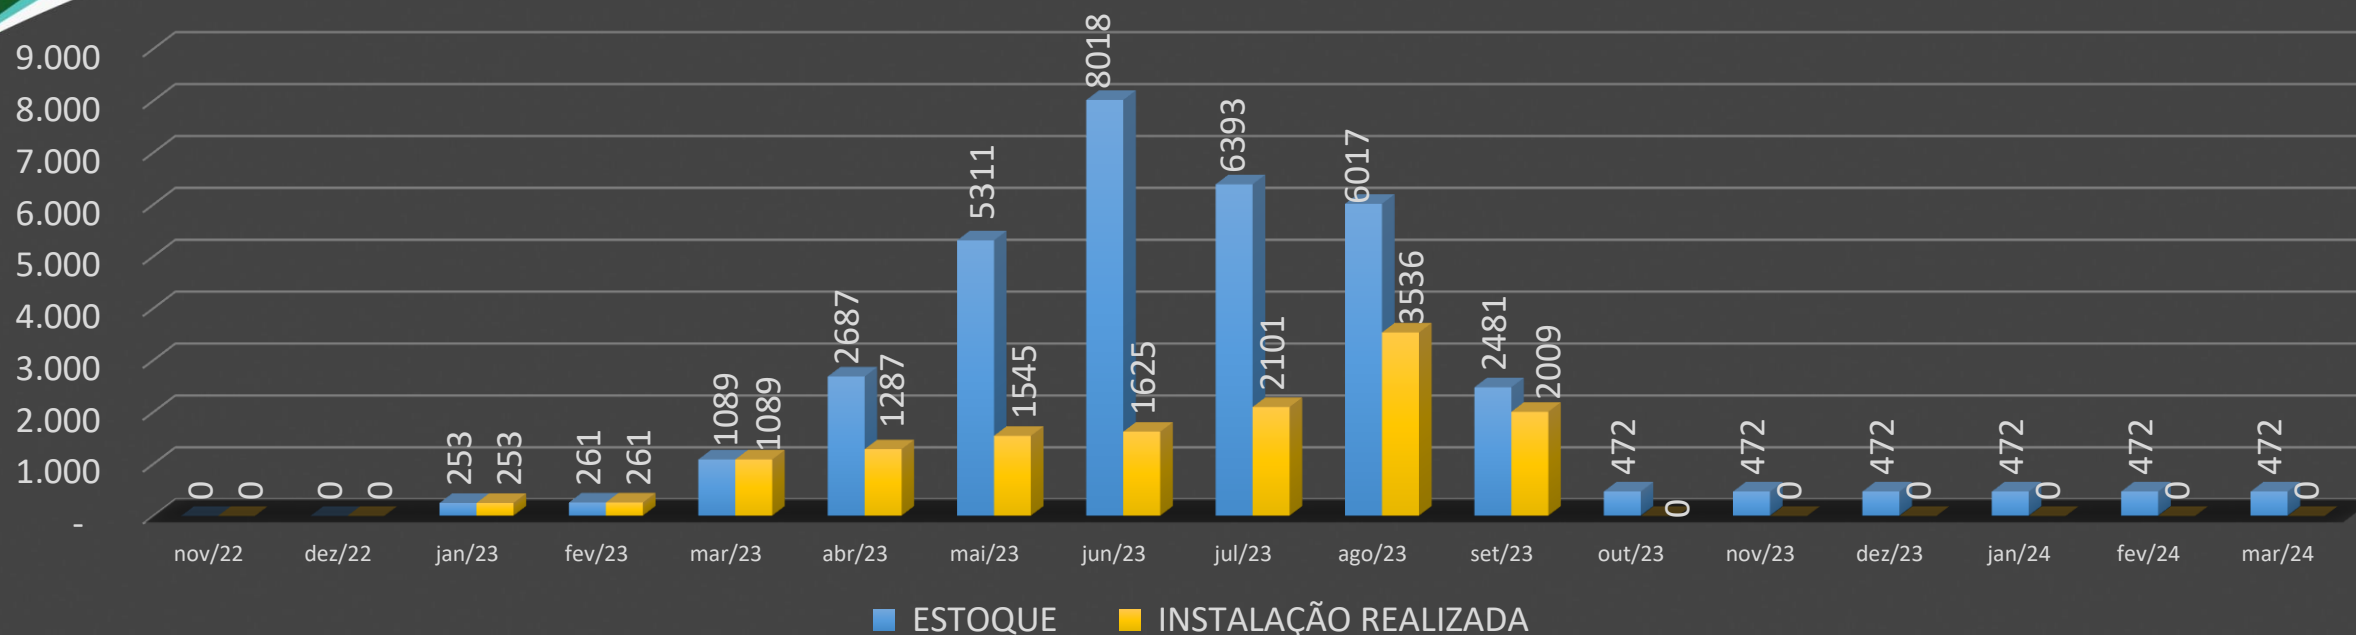


Ponto Positivo:

Conclusões de modernizações em pontos importantes da cidade, como a região central, Anel Viário e arredores do Parque da Cidade.

Ponto Negativo:

Diversos problemas relacionados aos braços e cabos deteriorados, causando falhas de funcionamento e conclusão de vias.



CRÉDITO VERDE LIMEIRA BRASIL BNDES

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos

1- Total de economia de energia propiciada no mês:	658.776 kWh/ano
--	-----------------

2 - Tempo do projeto:	1 ano
-----------------------	-------

3 - Total de economia Acumulado até o mês:	4.590.204 kWh/ano
--	-------------------

1 - Volume total de carbono capturado no mês:	54,2 tCO2e/ano
---	----------------

2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o mês:	377,4 tCO2e/ano
--	-----------------

PONTOS RELEVANTES

Finalizações das modernizações do anel viário, áreas próximas ao Parque da Cidade e região central

Avanço na entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro: (i) envio de pontos de Iluminação modernizados no mês de Setembro, (ii) recebimento de cartas de aceite da concessionária referente às entregas de 4676 pontos.

Obrigado!



Conexão, eficiência e energia.

www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
