

**10º BOLETIM INFORMATIVO
MENSAL**

Período 01/10 a 31/10/2023



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO Nº 21.2.0288.1-BNDES.


- **Contrato de Modernização de:** 34.188 luminárias
- **Valor Global do Contrato:** 26.876.761,83
- **Início:** 27/09/2022
- **Término do Contrato:** 26/03/2024

10º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

10º Mês. Período
01/10 a 31/10/2023



AVANÇO CONTRATUAL

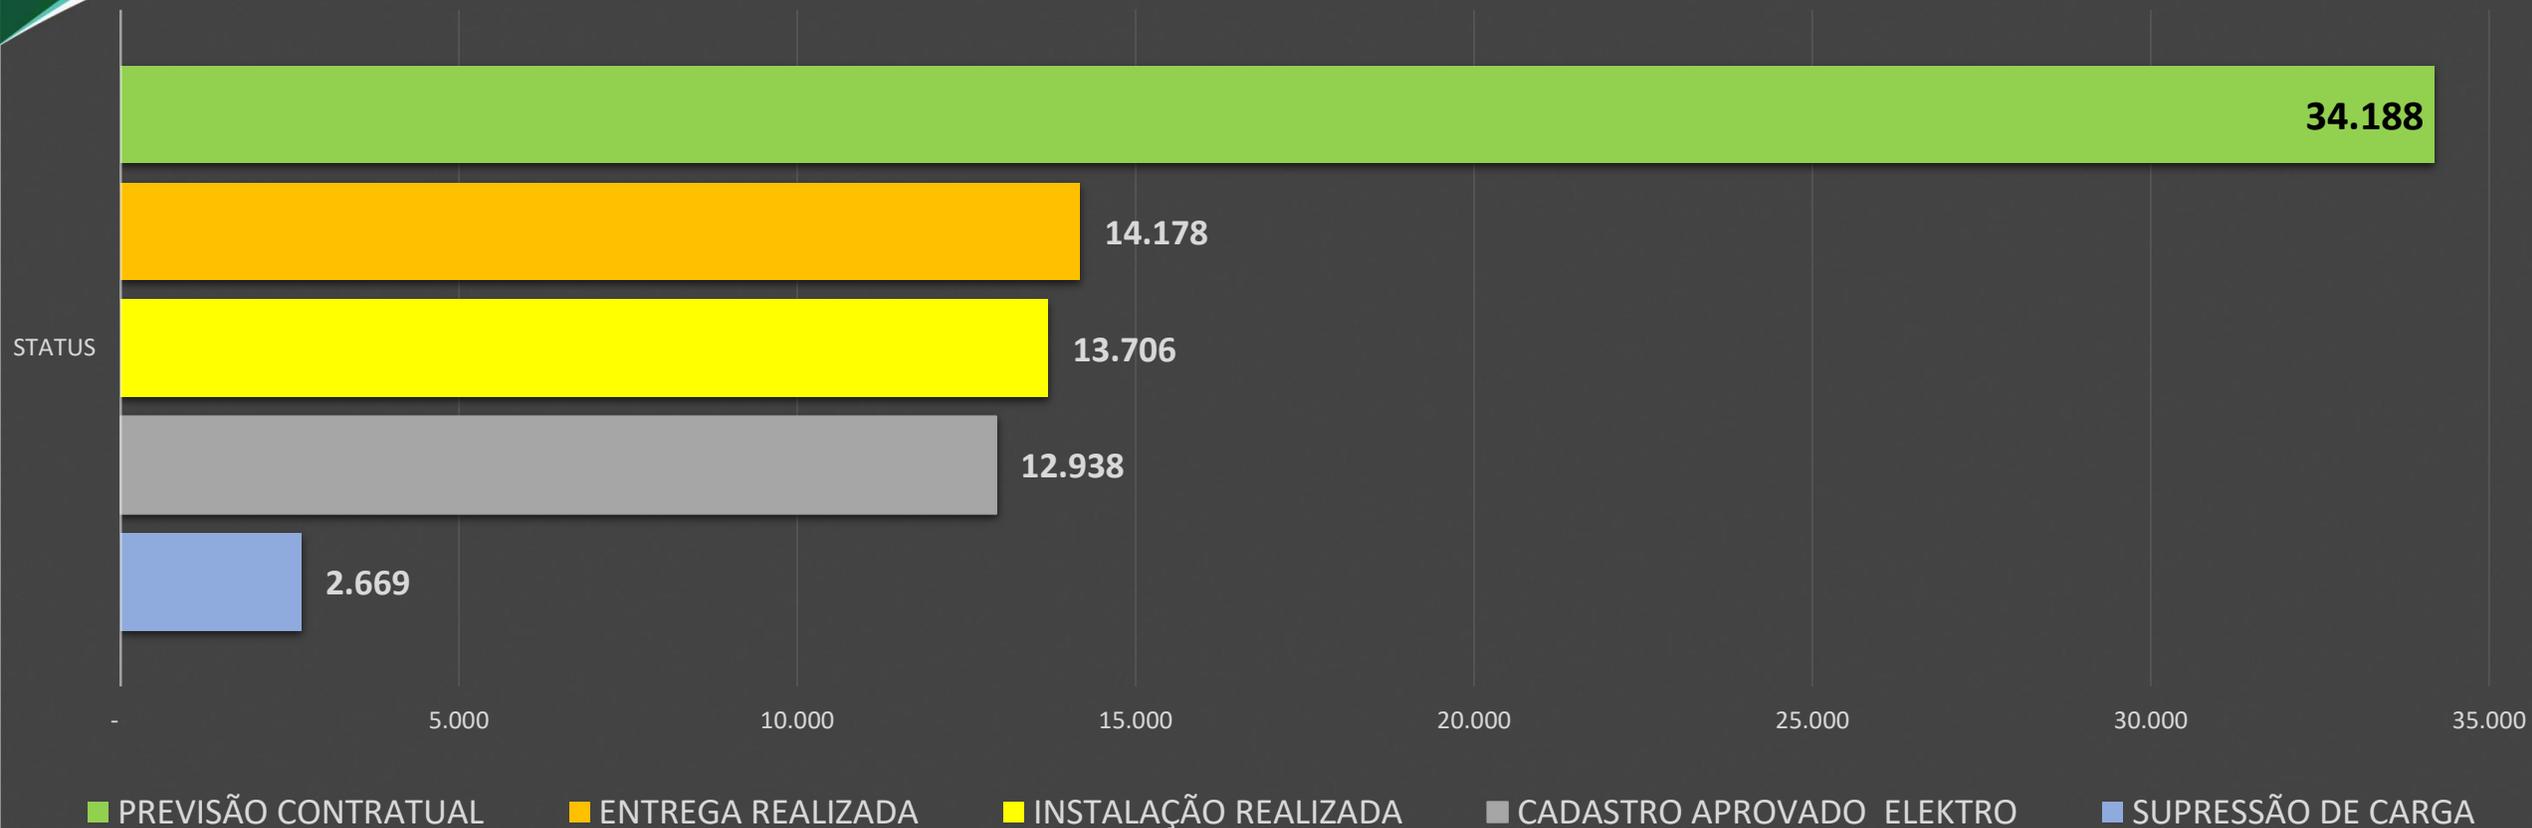


10º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

10º Mês. Período
01/10 a 31/10/2023



ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

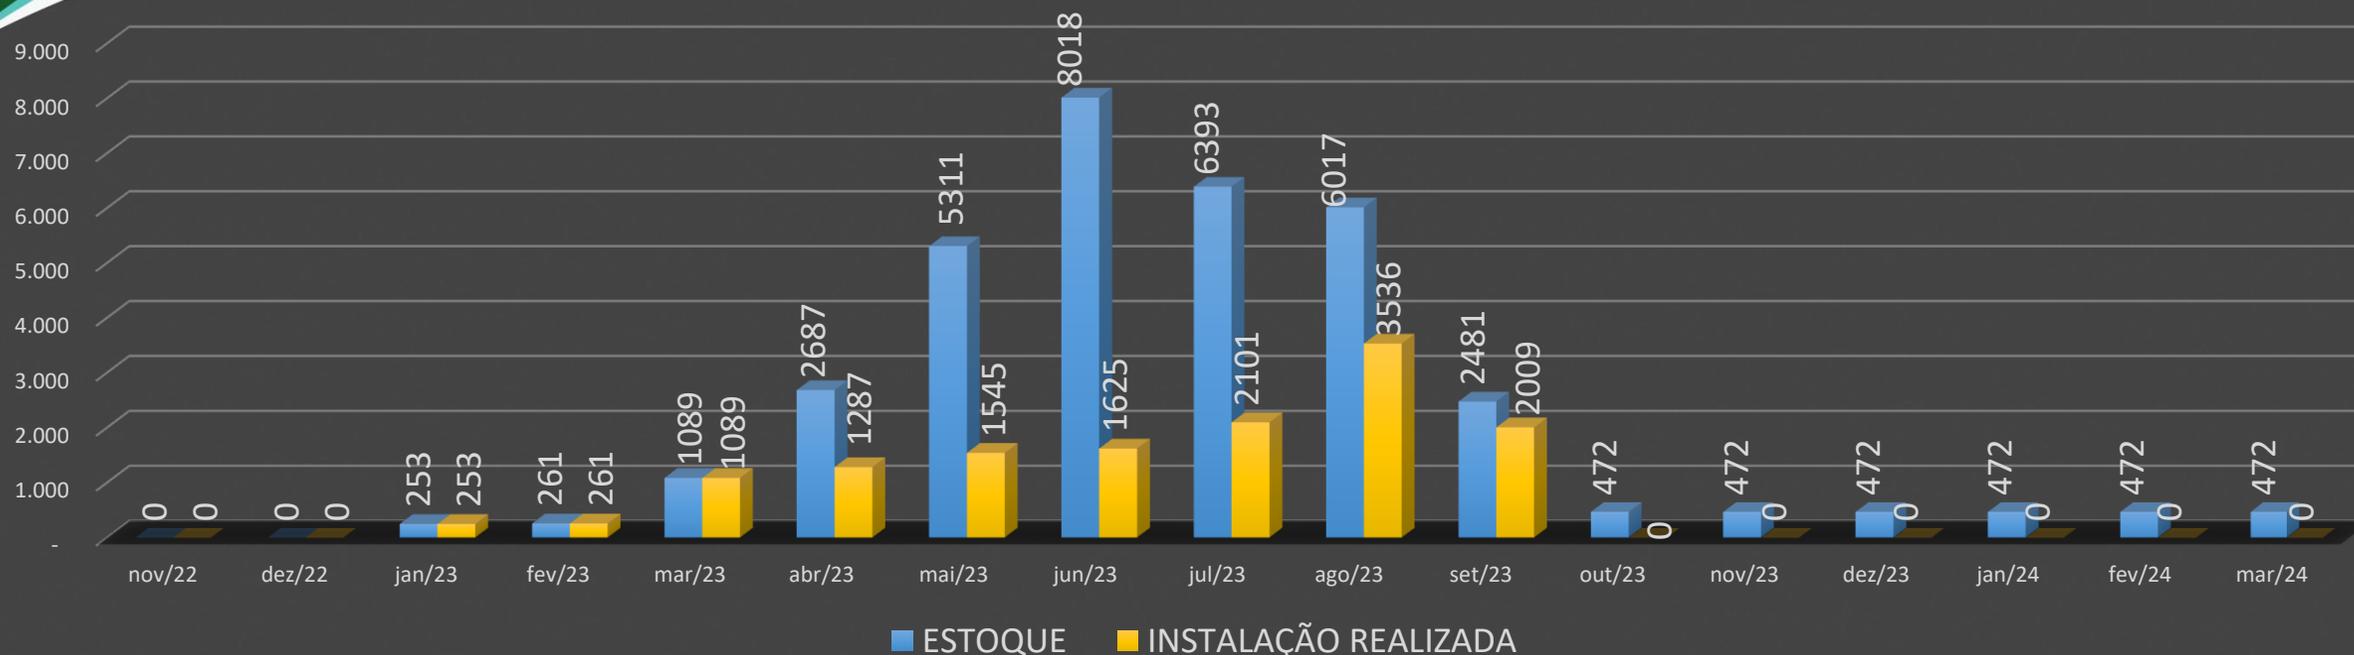

Ponto Positivo:


- Avanço de remoções de cargas dos condomínios fechados.

Pontos Negativos:

- Falta de materiais, paralisação das modernizações.
- Manutenções devido a braços, cabos, conectores deteriorados.

10º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

10º Mês. Período
01/10 a 31/10/2023



CRÉDITO VERDE LIMEIRA BRASIL BNDES

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos

1- Total de economia de energia propiciada no mês: **694.753 kWh/ano**

2 - Tempo do projeto: **1 ano**

3 - Total de economia Acumulado até o mês: **5.284.957 kWh/ano**

1 - Volume total de carbono capturado no mês: **57,10 tCO2e/ano**

2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o mês: **434,5 tCO2e/ano**

PONTOS RELEVANTES

Problemas no suprimento de insumos impactaram o andamento das modernizações.

Avanço na entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro:

- Recebimento de cartas de aceite da concessionária referente a 1303 pontos.

Obrigado!



alques

Conexão, eficiência e energia.

www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
