

  		<b>Relatório n°</b>	<b>1</b>	
		<b>Data do relatório</b>	<b>27/07/2023</b>	
		<b>Dia da semana</b>	Quinta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	176/2023	
<b>Obra</b>	<b>Implantação de Estacionamento em Canteiro Central em Frente ao Residencial Los Alpes</b>		<b>Prazo contratual</b>	31 dias
<b>Local</b>	Av. Nelson Aparecido Nascimento, Jd. Vitória Lucato		<b>Prazo decorrido</b>	4 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi(Gestor Contratual), Ana Patrícia Aranha de Castro e Júlio César Epifânio (Fiscalização) e Fábio Henrique V. de Carvalho (Execução)	
			<b>Prazo a vencer</b>	27 dias

**Ocorrências (3)**

A obra "Implantação de estacionamento em canteiro central em frente ao Residencial Los Alpes" tem início no dia 27/07/2023 com a remoção da camada vegetal e da camada superficial de solo, conforme previsão de projeto.

Na semana iniciada em 31/07/2023, foi lançada a nova guia, remoção da guia antiga, escavação para execução da base do pavimento e compactação do solo.

Nos dias 04 e 07 de agosto foi lançada a base do pavimento (solo-brito + brita graduada).

No dia 08/08/2023, foi realizada a imprimação da base para lançamento do binder e lançamento da capa asfáltica.

Nos dias 09/08 e 10/08/2023 foi executado parcialmente o passeio, necessitando de ajustes.

Na semana do dia 14/08/2023 foram feitos os ajustes na calçada e na guia e a execução da rampa de acessibilidade prevista em projeto.

No dia 11/09/2023 foi realizada a pintura da sinalização horizontal e no dia 12/09/2023 foi realizada a instalação da sinalização por placa.

Ana Patrícia Aranha de Castro  
Engenheira Civil  
CREA/SP 5069209518

A guia possui muitos defeitos de execução, e terá que reparada. Já conversado com a empresa (Ofício 1972-23, de 10/08/23).

Retrabalho

A calçada apresentou fissuras logo após a concretagem, demandando solução por parte da empresa.

Ademais, uma parte do trecho de projeto não foi executada. A empresa também foi notificada sobre isso.

(Ofício 1986-23, de 11/08/2023)

Retrabalho

**Comentários (1)**

**Jaqueline** 08/08/2023 15:02  
Valor total da obra: R\$ 138.483,43

**Objeto da Obra:**  
Recuperação das galerias existentes e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Implantação de estacionamento em canteiro central em frente ao Res. Los Alpes na Av. Nelson Aparecido Nascimento, Jd. Vitório Lucato.

**Estudos Técnicos:**  
Carta Convite nº 10/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Recursos orçamentários e fontes de Recursos:**  
FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070.

**Finalidade da Obra:**  
Proporcionar melhorias significativas nas condições de utilização e segurança do local.

**Agentes Participantes:**  
Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

**Público Alvo:**  
Moradores e usuários da região.

**Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:**  
Carta Convite nº 10/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Projeto básico e projetos executivos da obra:**  
Carta Convite nº 10/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Editais de licitação:**  
Carta Convite nº 10/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

**Contrato firmado:**  
Contrato nº 176/2022 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

**Empresa Responsável:**  
FPF Construções e Serviços Ltda EPP.

**Fotos (38)**



Situação original do canteiro central onde será realizado a obra.



Situação original do canteiro central onde será realizado a obra.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo, e sinalização da obra.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo, e sinalização da obra.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo.



Remoção da vegetação e da camada superficial de solo.



Remoção da guia antiga.



Escavação para execução do pavimento.



Lançamento da nova guia.



Abertura de vala para execução da base do pavimento.



Compactação do solo para execução da base do pavimento.



Compactação do solo para execução da base do pavimento.



Compactação do solo para execução da base do pavimento.



Mistura solo-brita para base de pavimento.



Solo-brita já lançado para base de pavimento e lançamento de brita graduada.



Solo-brita já lançado para base de pavimento.



Imprimação da base.



Execução do pavimento.



Execução do pavimento.



Execução de passeio ao lado do estacionamento.



Execução de passeio ao lado do estacionamento.



Placa da obra.



Passeio já executado.



Passeio já executado.



Execução da rampa de acessibilidade.



Vista geral do passeio.



Passeio executado e rampa de acessibilidade.



Execução da pintura de sinalização.



12 de setembro de 2023 08:41

Execução da pintura de sinalização.



12 de setembro de 2023 08:41

Execução da pintura de sinalização.




12 de setembro de 2023 08:41

Execução da pintura de sinalização.



12 de setembro de 2023 08:41

Execução da pintura de sinalização.

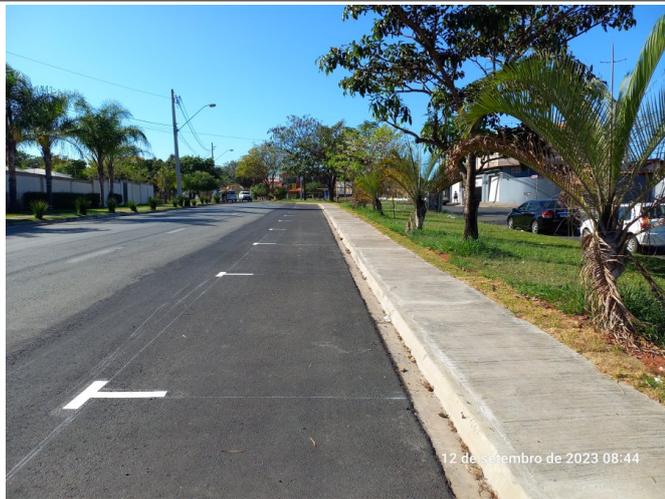

12 de setembro de 2023 08:44

Execução da pintura de sinalização.



14 de setembro de 2023 08:39

Execução da sinalização vertical.



Execução da sinalização horizontal.



Execução da sinalização horizontal.

**Aprovado** 19/09/2023 09:11

Ana Patrícia Aranha de Castro  
ana.castro@limeira.sp.gov.br  
Engenheira Civil

**Aprovado** 19/09/2023 09:31

Júlio César Epifânio  
julio.epifanio@limeira.sp.gov.br  
Tecnólogo em Edificações
