

  		Relatório n°	1		
		Data do relatório	13/05/2024 - 26/09/2024		
		Dia da semana	Segunda-Feira até Quinta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	66/2024		
Obra	Melhorias viárias na Via Antônio Cruães Filho		Prazo contratual	123 dias	
Local	Trecho entre viaduto Monsenhor Gustavo Mantovani e R. Dr. Willian Silva.		Prazo decorrido	123 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Júlio César Epifânio e Nicola Manis Rodrigus (Fiscalização), Cleiton Welber O. de Araújo (Execução)	Prazo a vencer	-14 dias

Ocorrências (2)

Na data de 13/05/2023 foi emitida a ordem de serviço a empresa contratada Pavinc Construtora e Pavimentadora Ltda.

Parecer técnico

Na data de 30/07/2024 foi verificada a existência de uma tubulação de rede de água próximo ao trecho de realocação dos postes de iluminação. Foi solicitado o deslocamento da rede de água na concessionária BRK

Parecer técnico


Fotos (43)



Placa de Obra.



Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.

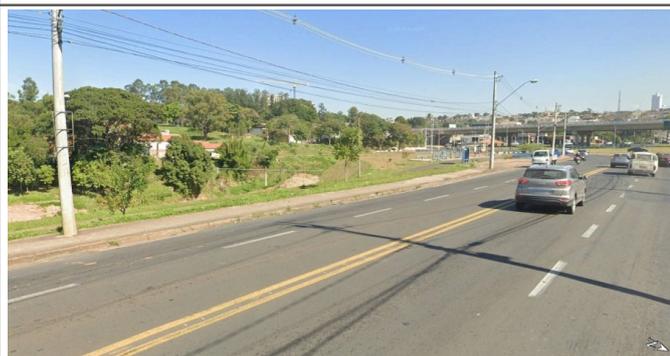

Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.



Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.



Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.



Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.



Situação original do local onde será feito o alargamento do anel viário no referido trecho.



Canteiro de Obra.



Canteiro de Obra.



Canteiro de Obra.



Escavação e compactação de talude.



Escavação e compactação de talude.



Escavação e aterro em talude.



Aterro e compactação do solo em talude onde será executado uma nova calçada.



Aterro e compactação do solo em talude onde será executado uma nova calçada.



Aterro e compactação do solo em talude onde será executado uma nova calçada



Remanejamento da rede de água.



Remanejamento da rede de água.



Remanejamento da rede de água. Compactação do solo.



Remanejamento dos Postes de Iluminação no trecho de alargamento da via.



Remanejamento dos Postes de Iluminação no trecho de alargamento da via.



Remanejamento dos Postes de Iluminação no trecho de alargamento da via.



Demolição de calçada existente para alargamento da via.



Demolição de calçada existente para alargamento da via.



Demolição de calçada existente para alargamento da via.



Demolição de calçada existente para alargamento da via.



Escavação. Abertura de caixa para execução de pavimento.



Escavação. Abertura de caixa para execução de pavimento.



Escavação. Abertura de caixa para execução de pavimento.



Execução de camada de Macadame no subleito



Execução de camada de Macadame no subleito.



Execução de compactação no subleito.



Execução de camada de Brita Graduada.



Execução de camada de Brita Graduada.



Execução de Guia e Sarjeta.



Execução de Guia e Sarjeta.



Execução de Guia e Sarjeta.




Execução de Guia e Sarjeta.



Execução de Calçada.



Execução de Calçada.

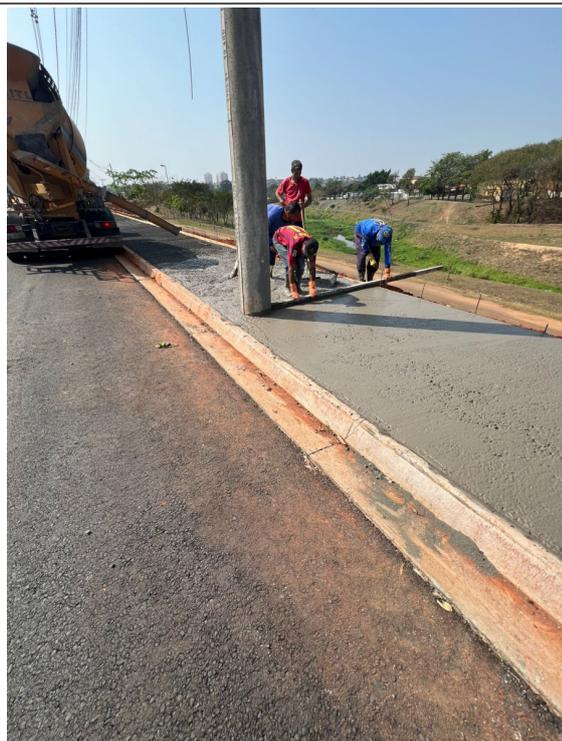

Execução de Calçada.



Execução de Calçada.



Execução de Calçada.
