

			<b>Relatório nº</b>	<b>3</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>14/11/2023 - 27/12/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Terça-Feira até Quarta-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	172/2023	
<b>Obra</b>	<b>Recuperação Estrutural e Troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica</b>		<b>Prazo contratual</b>	92 dias	
<b>Local</b>	Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João - Limeira- SP		<b>Prazo decorrido</b>	92 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engª Ana Patrícia A. de Castro (Fiscalização) e Eng. Paulo Roberto Moreira (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	-65 dias

**Ocorrências (3)**

Na semana do dia 20/11/2023, a pintura da estrutura metálica continua sendo realizada.  
 No dia 27/11/2023 está sendo finalizada a pintura da telha de fechamento lateral e tendo continuidade a pintura da estrutura metálica.  
 No dia 06/12/2023 está sendo executada a instalação da tela anti-pombo.

Ana Patrícia Aranha de Castro  
 Engenheira Civil  
 CREA/SP: 5069209518

[Parecer técnico](#)

No dia 15/11/2023 ocorrerá a Parada LGBT no Parque Cidade, impossibilitando a ocorrência dos trabalhos, que retornará no dia 16/11/2023.

[Dia parado](#)

No dia 08/12/2023 houve paralisação na atividade devido à instalação de tendas na área de trabalho, decorrente de festividade que aconteceria no final de semana.

[Dia parado](#)

**Comentários (1)**

Ana Patrícia Aranha de Castro 26/09/2023 15:06

Valor total da obra: R\$ 318.576,45

Objeto da Obra:

Recuperação Estrutural e troca de Calhas da Cobertura da Biblioteca Pedagógica, localizada na Rua João Kuhl Filho s/n - Vila São João.

Estudos Técnicos:

Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação SOSP nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 2410

Finalidade da Obra:

Recuperação e troca de calhas, pois a cobertura da Biblioteca Pedagógica apresenta corrosão na estrutura metálica e nas calhas, com risco de colapso.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

Usuários e frequentadores do espaço pedagógico.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Convite nº 08/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Convite nº 08/2023- Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Edital de licitação:

Convite nº 08/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Contrato firmado:

Contrato nº 172/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05

**Fotos (22)**



Perfil metálico utilizado para no reforço estrutural da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.




Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.

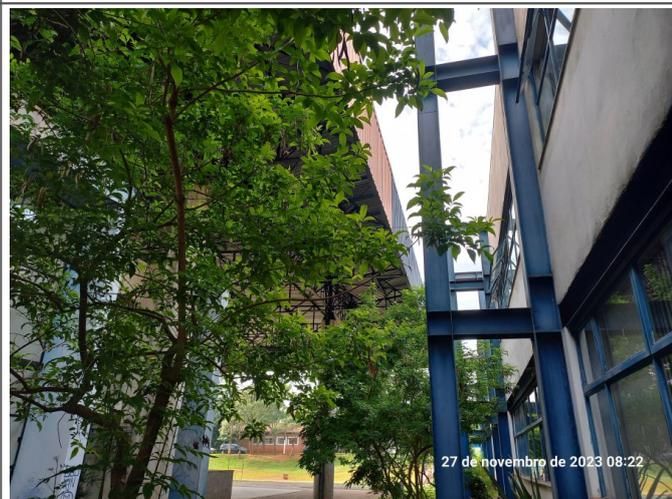

Execução da pintura da telha de fechamento lateral.



Execução da pintura da estrutura metálica da cobertura.



Finalização da pintura da telha lateral.



Remoção das luminárias para instalação da tela antipombo.



Alinhamento executado para instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.



No dia 08/12/2023 houve paralisação na atividade devido à instalação de tendas na área de trabalho, decorrente de festividade que aconteceria no final de semana.



No dia 08/12/2023 houve paralisação na atividade devido à instalação de tendas na área de trabalho, decorrente de festividade que aconteceria no final de semana.



Instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.



Instalação da tela anti-pombo.

**Aprovado** 27/12/2023 10:43

Ana Patrícia Aranha de Castro  
ana.castro@limeira.sp.gov.br  
Engenheira Civil
