

21/05/2020

Locamail :: Medição 1 - 2 e Relatório Fotográfico Prefeitura Quadra

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 02


Assunto: **Medição 1 - 2 e Relatório Fotográfico Prefeitura Quadra**
De: Pamela merlin <pamela.acovia@gmail.com>
Para: <protocolo@quadra.sp.gov.br>
Data: 21/05/2020 09:16

- MEDIÇÃO UNICA QUADRA 1 E 2 PREFE QUADRA.xls (~188 KB)

Bom dia !

Segue o anexo com a medição 1-2 e o relatório fotográfico 1-2,
como solicitado.

Atenciosamente

Pamela Merlin



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - MED UNI...



Fornecedor: AÇO VIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURA METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
CNPJ: 05.942.509/0001-77
Endereço: RODO, MARECHAL RONDON, SP 300, S/Nº, KM 183 - DIST. DE MARISTELA
Cidade: LARANJAL PAULISTA
Fone: (15) 3287-5555
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
Obra: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA
Local: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO - CENTRO - QUADRA

Inscrição Estadual: 412.070.410.113
Estado: SP
CEP: 18.510-000
Data: 31/03/2020
MEDIÇÃO 1



		DADOS CONTRATO				PESO	EXECUTADO MÊS			ACUMULADO			SALDO		%
Referência	Discriminação dos Serviços	Un	Qtde.	R\$ Unitário	Valor Total	%	Qtde	Valor (R\$)	%	Anterior	Atual	Valor	Valor (R\$)	Físico (%)	CONTRATO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
01.01.001	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E	M2	200,00	3,17	R\$ 634,00	0,053%	200,00	R\$ 634,00	100,00%			R\$ -	R\$ 634,00	100,00%	0,053%
03	SUPERESTRUTURA														
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	1092,00	42,12	R\$ 45.995,04	3,845%	500,00	R\$ 21.060,00	45,79%			R\$ -	R\$ 45.995,04	100,00%	8,397%
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FVK= 600 M PA)	KG	1425,00	7,90	R\$ 11.257,50	0,941%		R\$ -				R\$ -	R\$ 11.257,50	100,00%	
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	84,10	259,15	R\$ 21.794,52	1,822%	64,00	R\$ 16.585,60	76,10%			R\$ -	R\$ 21.794,52	100,00%	2,394%
03.03.018	LAJE PRÉ-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-	M2	838,20	93,77	R\$ 78.598,01	6,570%		R\$ -				R\$ -	R\$ 78.598,01	100,00%	
04	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS														
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	99,79	46,18	R\$ 4.608,30	0,385%	99,79	R\$ 4.608,30	100,00%			R\$ -	R\$ 4.608,30	100,00%	0,385%
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	680,22	26,54	R\$ 17.522,24	1,465%		R\$ -				R\$ -	R\$ 17.522,24	100,00%	1,954%
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	168,72	31,22	R\$ 5.267,44	0,440%	140,00	R\$ 4.370,80	82,98%			R\$ -	R\$ 5.267,44	100,00%	0,531%
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	3,80	356,66	R\$ 1.355,31	0,113%	3,80	R\$ 1.355,31	100,00%			R\$ -	R\$ 1.355,31	100,00%	0,113%
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	144,00	8,73	R\$ 1.257,12	0,105%	144,00	R\$ 1.257,12	100,00%			R\$ -	R\$ 1.257,12	100,00%	0,105%
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	376,01	R\$ 639,22	0,053%		R\$ -				R\$ -	R\$ 639,22	100,00%	
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	1.269,57	R\$ 4.316,54	0,361%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.316,54	100,00%	
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	267,68	R\$ 1.579,31	0,132%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.579,31	100,00%	
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	5,10	129,48	R\$ 660,35	0,055%		R\$ -				R\$ -	R\$ 660,35	100,00%	
05	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES														
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFADEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	1,00	678,72	R\$ 678,72	0,057%		R\$ -				R\$ -	R\$ 678,72	100,00%	
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFADEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	3,00	677,40	R\$ 2.032,20	0,170%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.032,20	100,00%	
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFADEADA MACIO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00	432,24	R\$ 1.728,96	0,145%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.728,96	100,00%	
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAFADEADA MACIÇA G1-C1	UN	3,00	1.734,21	R\$ 5.202,63	0,435%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.202,63	100,00%	
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFADEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD.	UN	1,00	708,42	R\$ 708,42	0,059%		R\$ -				R\$ -	R\$ 708,42	100,00%	
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFADEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD.	UN	18,00	724,49	R\$ 13.040,82	1,090%		R\$ -				R\$ -	R\$ 13.040,82	100,00%	
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	673,12	R\$ 3.500,22	0,293%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.500,22	100,00%	
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	10,70	298,80	R\$ 3.197,16	0,267%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.197,16	100,00%	
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	143,97	R\$ 1.540,48	0,129%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.540,48	100,00%	
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	633,67	R\$ 2.598,05	0,217%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.598,05	100,00%	
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	713,07	R\$ 5.918,48	0,495%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.918,48	100,00%	
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	2.206,20	R\$ 2.206,20	0,184%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.206,20	100,00%	
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	46,22	R\$ 115,55	0,010%		R\$ -				R\$ -	R\$ 115,55	100,00%	
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	2.141,72	R\$ 2.141,72	0,179%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.141,72	100,00%	
05.05.090	BA-11 BALCAO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	1.246,60	R\$ 2.493,20	0,208%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.493,20	100,00%	
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,36	368,18	R\$ 5.655,24	0,473%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.655,24	100,00%	
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-	UN	1,00	2.167,49	R\$ 2.167,49	0,181%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.167,49	100,00%	
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL VÁLVULA	UN	3,00	2.117,54	R\$ 6.352,62	0,531%		R\$ -				R\$ -	R\$ 6.352,62	100,00%	
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	1,00	3.430,84	R\$ 3.430,84	0,287%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.430,84	100,00%	
06	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS														
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00	714,00	R\$ 714,00	0,060%		R\$ -				R\$ -	R\$ 714,00	100,00%	
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	932,59	R\$ 19.584,39	1,637%		R\$ -				R\$ -	R\$ 19.584,39	100,00%	
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	1.398,68	R\$ 2.797,36	0,234%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.797,36	100,00%	
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	579,57	R\$ 23.762,37	1,986%		R\$ -				R\$ -	R\$ 23.762,37	100,00%	
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	1.061,14	R\$ 10.611,40	0,887%		R\$ -				R\$ -	R\$ 10.611,40	100,00%	
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILAÇÃO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	18,20	703,54	R\$ 12.804,43	1,070%		R\$ -				R\$ -	R\$ 12.804,43	100,00%	
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	2.083,69	R\$ 25.004,28	2,090%		R\$ -				R\$ -	R\$ 25.004,28	100,00%	
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	629,73	R\$ 5.957,25	0,498%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.957,25	100,00%	
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	573,57	R\$ 19.220,33	1,607%		R\$ -				R\$ -	R\$ 19.220,33	100,00%	
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO	M2	52,96	170,03	R\$ 9.004,79	0,753%		R\$ -				R\$ -	R\$ 9.004,79	100,00%	
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATÓRIO - GALVANIZADA	UN	2,00	1.693,87	R\$ 3.387,74	0,283%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.387,74	100,00%	
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	979,66	R\$ 33.700,30	2,817%		R\$ -				R\$ -	R\$ 33.700,30	100,00%	
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT. PERM (L=140CM)	UN	1,00	2.834,74	R\$ 2.834,74	0,237%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.834,74	100,00%	
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	3,00	2.327,54	R\$ 6.982,62	0,584%		R\$ -				R\$ -	R\$ 6.982,62	100,00%	
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00	4.036,62	R\$ 4.036,62	0,337%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.036,62	100,00%	
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE	M	33,10	102,50	R\$ 3.392,75	0,284%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.392,75	100,00%	
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	49,90	97,50	R\$ 4.865,25	0,407%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.865,25	100,00%	
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00	514,15	R\$ 1.028,30	0,086%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.028,30	100,00%	
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	519,60	R\$ 519,60	0,043%		R\$ -				R\$ -	R\$ 519,60	100,00%	
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	530,30	R\$ 4.507,55	0,377%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.507,55	100,00%	
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	1.055,12	R\$ 10.023,64	0,838%		R\$ -				R\$ -	R\$ 10.023,64	100,00%	
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL	M2	19,22	438,84	R\$ 8.434,50	0,705%		R\$ -				R\$ -	R\$ 8.434,50	100,00%	
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2"	UN	1,00	455,93	R\$ 455,93	0,038%		R\$ -				R\$ -	R\$ 455,93	100,00%	
07	COBERTURA														
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	838,46	17,73	R\$ 14.865,90	1,243%		R\$ -				R\$ -	R\$ 14.865,90	100,00%	
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44	40,29	R\$ 35.875,83	2,999%		R\$ -				R\$ -	R\$ 35.875,83	100,00%	
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS														
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00	1.086,49	R\$ 1.086,49	0,091%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.086,49	100,00%	

F.M. QUADRA
PROJ. Nº 523/2020
F.S. Nº 3

Referência	Discriminação dos Serviços	Un	Qtde.	R\$ Unitário	Valor Total	%	Qtde	Valor (R\$)	%	Anterior	Atual	Valor	Valor (R\$)	Físico (%)	CONTRATO
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	12.091,11	R\$ 12.091,11	1,011%		R\$ -				R\$ -	R\$ 12.091,11	100,00%	
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	20,43	R\$ 143,01	0,012%		R\$ -				R\$ -	R\$ 143,01	100,00%	
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	444,63	R\$ 889,26	0,074%		R\$ -				R\$ -	R\$ 889,26	100,00%	
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	4,20	94,26	R\$ 659,82	0,055%		R\$ -				R\$ -	R\$ 659,82	100,00%	
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	99,40	R\$ 417,48	0,035%		R\$ -				R\$ -	R\$ 417,48	100,00%	
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	128,00	18,67	R\$ 2.389,76	0,200%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.389,76	100,00%	
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXOES	M	81,00	25,47	R\$ 2.063,07	0,172%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.063,07	100,00%	
08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXOES	M	54,00	35,60	R\$ 1.922,40	0,161%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.922,40	100,00%	
08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXOES	M	16,50	48,72	R\$ 803,88	0,067%		R\$ -				R\$ -	R\$ 803,88	100,00%	
08.03.021	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXOES	M	44,00	64,04	R\$ 2.817,76	0,236%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.817,76	100,00%	
08.03.022	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXOES	M	16,00	74,30	R\$ 1.188,80	0,099%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.188,80	100,00%	
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	96,03	R\$ 96,03	0,008%		R\$ -				R\$ -	R\$ 96,03	100,00%	
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	81,37	R\$ 1.627,40	0,136%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.627,40	100,00%	
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	101,21	R\$ 303,63	0,025%		R\$ -				R\$ -	R\$ 303,63	100,00%	
08.04.032	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	23,00	85,50	R\$ 1.966,50	0,164%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.966,50	100,00%	
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	14,00	340,72	R\$ 4.770,08	0,399%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.770,08	100,00%	
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	1,00	335,45	R\$ 335,45	0,028%		R\$ -				R\$ -	R\$ 335,45	100,00%	
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00	109,04	R\$ 218,08	0,018%		R\$ -				R\$ -	R\$ 218,08	100,00%	
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	2,00	108,97	R\$ 217,94	0,018%		R\$ -				R\$ -	R\$ 217,94	100,00%	
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	109,04	R\$ 218,08	0,018%		R\$ -				R\$ -	R\$ 218,08	100,00%	
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL ELÁSTICA DN 40 INCL	M	29,50	35,30	R\$ 1.041,35	0,087%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.041,35	100,00%	
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	M	82,00	38,99	R\$ 3.197,18	0,267%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.197,18	100,00%	
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXOES	M	24,00	47,07	R\$ 1.129,68	0,094%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.129,68	100,00%	
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	79,00	51,85	R\$ 4.096,15	0,342%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.096,15	100,00%	
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXOES	M	60,00	100,26	R\$ 6.015,60	0,503%		R\$ -				R\$ -	R\$ 6.015,60	100,00%	
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	58,24	R\$ 698,88	0,058%		R\$ -				R\$ -	R\$ 698,88	100,00%	
08.10.049	RAIO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	57,19	R\$ 400,33	0,033%		R\$ -				R\$ -	R\$ 400,33	100,00%	
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	42,47	R\$ 3.176,76	0,266%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.176,76	100,00%	
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	57,89	R\$ 1.574,61	0,132%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.574,61	100,00%	
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	18,31	R\$ 146,48	0,012%		R\$ -				R\$ -	R\$ 146,48	100,00%	
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	78,80	R\$ 630,40	0,053%		R\$ -				R\$ -	R\$ 630,40	100,00%	
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	93,46	R\$ 2.616,88	0,219%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.616,88	100,00%	
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	105,07	R\$ 1.786,19	0,149%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.786,19	100,00%	
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	13,00	182,82	R\$ 2.376,66	0,199%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.376,66	100,00%	
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	62,03	R\$ 124,06	0,010%		R\$ -				R\$ -	R\$ 124,06	100,00%	
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	83,27	R\$ 166,54	0,014%		R\$ -				R\$ -	R\$ 166,54	100,00%	
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00	96,03	R\$ 384,12	0,032%		R\$ -				R\$ -	R\$ 384,12	100,00%	
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	376,06	R\$ 376,06	0,031%		R\$ -				R\$ -	R\$ 376,06	100,00%	
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00	110,18	R\$ 220,36	0,018%		R\$ -				R\$ -	R\$ 220,36	100,00%	
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00	119,91	R\$ 119,91	0,010%		R\$ -				R\$ -	R\$ 119,91	100,00%	
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	86,91	R\$ 173,82	0,015%		R\$ -				R\$ -	R\$ 173,82	100,00%	
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	1.033,63	R\$ 2.067,26	0,173%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.067,26	100,00%	
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	2.388,63	R\$ 4.777,26	0,399%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.777,26	100,00%	
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	820,59	R\$ 4.923,54	0,412%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.923,54	100,00%	
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	202,39	R\$ 404,78	0,034%		R\$ -				R\$ -	R\$ 404,78	100,00%	
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	338,76	R\$ 3.048,84	0,255%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.048,84	100,00%	
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM	UN	13,00	599,20	R\$ 7.789,60	0,651%		R\$ -				R\$ -	R\$ 7.789,60	100,00%	
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/COLUNA	UN	4,00	645,88	R\$ 2.583,52	0,216%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.583,52	100,00%	
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	69,49	R\$ 138,98	0,012%		R\$ -				R\$ -	R\$ 138,98	100,00%	
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	68,53	R\$ 753,83	0,063%		R\$ -				R\$ -	R\$ 753,83	100,00%	
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	46,19	R\$ 92,38	0,008%		R\$ -				R\$ -	R\$ 92,38	100,00%	
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	285,10	R\$ 570,20	0,048%		R\$ -				R\$ -	R\$ 570,20	100,00%	
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.925,64	R\$ 5.776,92	0,483%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.776,92	100,00%	
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	1.230,15	R\$ 3.690,45	0,308%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.690,45	100,00%	
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	2.214,09	R\$ 2.214,09	0,185%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.214,09	100,00%	
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	1.780,51	R\$ 1.780,51	0,149%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.780,51	100,00%	
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	7,00	133,40	R\$ 933,80	0,078%		R\$ -				R\$ -	R\$ 933,80	100,00%	
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	2.185,93	R\$ 6.557,79	0,548%		R\$ -				R\$ -	R\$ 6.557,79	100,00%	
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	429,09	R\$ 858,18	0,072%		R\$ -				R\$ -	R\$ 858,18	100,00%	
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	52,35	R\$ 52,35	0,004%		R\$ -				R\$ -	R\$ 52,35	100,00%	
09	INSTALACOES ELETRICAS														
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	4.014,76	R\$ 4.014,76	0,336%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.014,76	100,00%	
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	4.018,72	R\$ 4.018,72	0,336%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.018,72	100,00%	
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	95,61	R\$ 95,61	0,008%		R\$ -				R\$ -	R\$ 95,61	100,00%	
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	362,90	R\$ 362,90	0,030%		R\$ -				R\$ -	R\$ 362,90	100,00%	
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	375,95	R\$ 751,90	0,063%		R\$ -				R\$ -	R\$ 751,90	100,00%	
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	65,37	R\$ 1.242,03	0,104%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.242,03	100,00%	
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	143,86	R\$ 10.933,36	0,914%		R\$ -				R\$ -	R\$ 10.933,36	100,00%	
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	19,00	69,77	R\$ 1.325,63	0,111%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.325,63	100,00%	
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	14,94	R\$ 283,86	0,024%		R\$ -				R\$ -	R\$ 283,86	100,00%	
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	1.149,07	R\$ 425,16	0,036%		R\$ -				R\$ -	R\$ 425,16	100,00%	
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	451,85	R\$ 451,85	0,038%		R\$ -				R\$ -	R\$ 451,85	100,00%	
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	18,94	R\$ 22,73	0,002%		R\$ -				R\$ -	R\$ 22,73	100,00%	
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	36,15	R\$ 57,84	0,005%		R\$ -				R\$ -	R\$ 57,84	100,00%	
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	47,48	R\$ 94,96	0,008%		R\$ -				R\$ -	R\$ 94,96	100,00%	
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	82,93	R\$ 165,86	0,014%		R\$ -				R\$ -	R\$ 165,86	100,00%	
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	105,00	23,78	R\$ 2.496,90	0,209%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.496,90	100,00%	
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	33,00	29,47	R\$ 972,51	0,081%		R\$ -				R\$ -	R\$ 972,51	100,00%	
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	32,00	35,43	R\$ 1.133,76	0,095%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.133,76	100,00%	
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	39,00	48,17	R\$ 1.878,63	0,157%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.878,63		

Referência	Discriminação dos Serviços	Un	Qtde.	R\$ Unitário	Valor Total	%	Qtde	Valor (R\$)	%	Anterior	Atual	Valor	Valor (R\$)	Físico (%)	CONTRATO
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	97,09	R\$ 97,09	0,008%		R\$ -				R\$ -	R\$ 97,09	100,00%	
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X100A A 1X30A	UN	21,00	20,95	R\$ 439,95	0,037%		R\$ -				R\$ -	R\$ 439,95	100,00%	
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4	UN	2,00	1.023,55	R\$ 2.047,10	0,171%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.047,10	100,00%	
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2	UN	1,00	1.001,54	R\$ 1.001,54	0,084%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.001,54	100,00%	
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2	UN	1,00	519,85	R\$ 519,85	0,043%		R\$ -				R\$ -	R\$ 519,85	100,00%	
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	2,00	292,52	R\$ 585,04	0,049%		R\$ -				R\$ -	R\$ 585,04	100,00%	
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	17,29	R\$ 172,90	0,014%		R\$ -				R\$ -	R\$ 172,90	100,00%	
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	27,05	R\$ 405,75	0,034%		R\$ -				R\$ -	R\$ 405,75	100,00%	
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	161,04	R\$ 805,20	0,067%		R\$ -				R\$ -	R\$ 805,20	100,00%	
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	4,17	R\$ 1.313,55	0,110%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.313,55	100,00%	
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	5,27	R\$ 843,20	0,070%		R\$ -				R\$ -	R\$ 843,20	100,00%	
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	8,88	R\$ 1.154,40	0,096%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.154,40	100,00%	
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	22,78	R\$ 2.391,90	0,200%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.391,90	100,00%	
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	50,36	R\$ 528,78	0,044%		R\$ -				R\$ -	R\$ 528,78	100,00%	
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	1,00	106,18	R\$ 106,18	0,009%		R\$ -				R\$ -	R\$ 106,18	100,00%	
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC	UN	42,00	130,11	R\$ 5.464,62	0,457%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.464,62	100,00%	
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136	UN	2,00	120,24	R\$ 240,48	0,020%		R\$ -				R\$ -	R\$ 240,48	100,00%	
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC	UN	81,00	121,35	R\$ 9.829,35	0,822%		R\$ -				R\$ -	R\$ 9.829,35	100,00%	
09.08.080	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR	UN	8,00	156,17	R\$ 1.249,36	0,104%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.249,36	100,00%	
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETR DUTO DE PVC	UN	3,00	88,48	R\$ 265,44	0,022%		R\$ -				R\$ -	R\$ 265,44	100,00%	
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	15,00	88,48	R\$ 1.327,20	0,111%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.327,20	100,00%	
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	205,25	R\$ 4.310,25	0,360%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.310,25	100,00%	
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	233,03	R\$ 1.165,15	0,097%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.165,15	100,00%	
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	116,26	R\$ 232,52	0,019%		R\$ -				R\$ -	R\$ 232,52	100,00%	
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	150,57	R\$ 7.829,64	0,654%		R\$ -				R\$ -	R\$ 7.829,64	100,00%	
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	219,69	R\$ 2.416,59	0,202%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.416,59	100,00%	
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO PLAMP FLUOR. 2X16W	UN	8,00	170,11	R\$ 1.360,88	0,114%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.360,88	100,00%	
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO PLAMP FLUOR. 2X32W	UN	12,00	196,54	R\$ 2.358,48	0,197%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.358,48	100,00%	
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PLAMPADA A VAPOR METALICO	UN	4,00	293,03	R\$ 1.172,12	0,098%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.172,12	100,00%	
09.09.083	IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED	UN	9,00	53,69	R\$ 483,21	0,040%		R\$ -				R\$ -	R\$ 483,21	100,00%	
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETR DUTO DE PVC	UN	122,00	180,30	R\$ 21.996,60	1,839%		R\$ -				R\$ -	R\$ 21.996,60	100,00%	
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	285,26	R\$ 285,26	0,024%		R\$ -				R\$ -	R\$ 285,26	100,00%	
911.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO PARA	UM	4,00	512,90	R\$ 2.051,60	0,171%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.051,60	100,00%	

F.M. QUADRA
 PROJ. Nº 523/2020
 F.S. Nº 5
 6

Referência	Discriminação dos Serviços	Un	Qtde.	R\$ Unitário	Valor Total	%	Qtde	Valor (R\$)	%	Anterior	Atual	Valor	Valor (R\$)	Físico (%)	CONTRATO
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	921,09	R\$ 921,09	0,077%		R\$ -				R\$ -	R\$ 921,09	100,00%	
09.13.025	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	130,00	33,84	R\$ 4.399,20	0,368%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.399,20	100,00%	
09.13.027	TERRA SIMPLIS - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE	UN	8,00	169,95	R\$ 1.359,60	0,114%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.359,60	100,00%	
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	41,31	R\$ 413,10	0,035%		R\$ -				R\$ -	R\$ 413,10	100,00%	
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	50,93	R\$ 509,30	0,043%		R\$ -				R\$ -	R\$ 509,30	100,00%	
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	37,89	R\$ 568,35	0,048%		R\$ -				R\$ -	R\$ 568,35	100,00%	
09.13.040	CORDALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE	M	184,00	30,02	R\$ 5.523,68	0,462%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.523,68	100,00%	
11	IMPERMEABILIZACOES/JUNTAS DE DILATAÇÃO														
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	110,52	49,11	R\$ 5.427,64	0,454%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.427,64	100,00%	
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	49,72	23,68	R\$ 1.177,37	0,098%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.177,37	100,00%	
11.03.007	IMPERMEABIL. RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA	M2	64,00	18,88	R\$ 1.208,32	0,101%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.208,32	100,00%	
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	9,59	R\$ 47,95	0,004%		R\$ -				R\$ -	R\$ 47,95	100,00%	
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE														
12.01.001	CHAPISCO	M2	900,43	9,81	R\$ 8.833,22	0,738%	765,00	R\$ 7.504,65	84,96%			R\$ -	R\$ 8.833,22	100,00%	0,869%
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	900,43	33,88	R\$ 30.506,57	2,550%	765,00	R\$ 25.918,20	84,96%			R\$ -	R\$ 30.506,57	100,00%	3,002%
12.02.002	CHAPISCO	M2	473,28	5,28	R\$ 2.498,92	0,209%	473,28	R\$ 2.498,92	100,00%			R\$ -	R\$ 2.498,92	100,00%	0,209%
12.02.005	EMBOCO	M2	473,28	27,64	R\$ 13.081,46	1,093%	473,28	R\$ 13.081,46	100,00%			R\$ -	R\$ 13.081,46	100,00%	1,093%
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	17,23	R\$ 15.429,29	1,290%		R\$ -				R\$ -	R\$ 15.429,29	100,00%	
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	50,67	R\$ 21.777,46	1,820%		R\$ -				R\$ -	R\$ 21.777,46	100,00%	
12.02.043	PERFIL. SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	8,35	R\$ 50,10	0,004%		R\$ -				R\$ -	R\$ 50,10	100,00%	
12.04.004	CHAPISCO	M2	488,72	5,28	R\$ 2.580,44	0,216%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.580,44	100,00%	
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	488,72	33,88	R\$ 16.557,83	1,384%		R\$ -				R\$ -	R\$ 16.557,83	100,00%	
13	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS														
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	754,50	29,39	R\$ 22.174,76	1,854%	674,00	R\$ 19.808,86	89,33%			R\$ -	R\$ 22.174,76	100,00%	2,075%
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50	6,47	R\$ 4.881,62	0,408%	674,00	R\$ 4.360,78	89,33%			R\$ -	R\$ 4.881,62	100,00%	0,457%
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50	23,68	R\$ 17.866,56	1,493%		R\$ -				R\$ -	R\$ 17.866,56	100,00%	
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	617,38	84,11	R\$ 51.927,83	4,341%		R\$ -				R\$ -	R\$ 51.927,83	100,00%	
13.02.100	CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5	M2	137,12	52,60	R\$ 7.212,51	0,603%		R\$ -				R\$ -	R\$ 7.212,51	100,00%	
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	26,00	92,31	R\$ 2.400,06	0,201%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.400,06	100,00%	
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	14,80	105,53	R\$ 1.561,84	0,131%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.561,84	100,00%	
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70	66,69	R\$ 5.581,95	0,467%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.581,95	100,00%	
14	VIDROS														
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06	83,31	R\$ 17.333,48	1,449%		R\$ -				R\$ -	R\$ 17.333,48	100,00%	
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68	126,93	R\$ 3.386,49	0,283%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.386,49	100,00%	
15	PINTURA														
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49	22,11	R\$ 18.959,10	1,585%		R\$ -				R\$ -	R\$ 18.959,10	100,00%	
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22	22,67	R\$ 19.387,84	1,621%		R\$ -				R\$ -	R\$ 19.387,84	100,00%	
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73	41,64	R\$ 7.608,88	0,636%		R\$ -				R\$ -	R\$ 7.608,88	100,00%	
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79	24,60	R\$ 5.382,23	0,450%		R\$ -				R\$ -	R\$ 5.382,23	100,00%	
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	18,00	11,04	R\$ 198,72	0,017%		R\$ -				R\$ -	R\$ 198,72	100,00%	
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	488,72	19,91	R\$ 9.730,42	0,813%		R\$ -				R\$ -	R\$ 9.730,42	100,00%	
16	SERVICOS COMPLEMENTARES														
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75	584,02	R\$ 2.774,10	0,232%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.774,10	100,00%	
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM	M2	1,00	718,86	R\$ 718,86	0,060%		R\$ -				R\$ -	R\$ 718,86	100,00%	
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00	27,98	R\$ 9.093,50	0,760%	325,00	R\$ 9.093,50	100,00%			R\$ -	R\$ 9.093,50	100,00%	0,760%
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00	6,47	R\$ 2.102,75	0,176%	325,00	R\$ 2.102,75	100,00%			R\$ -	R\$ 2.102,75	100,00%	0,176%
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	325,00	47,31	R\$ 15.375,75	1,285%	325,00	R\$ 15.375,75	100,00%			R\$ -	R\$ 15.375,75	100,00%	1,285%
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00	114,82	R\$ 9.874,52	0,825%		R\$ -				R\$ -	R\$ 9.874,52	100,00%	
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00	67,75	R\$ 2.913,25	0,244%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.913,25	100,00%	
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES -	M	69,00	54,33	R\$ 3.748,77	0,313%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.748,77	100,00%	
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES -	M	26,60	81,70	R\$ 2.173,22	0,182%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.173,22	100,00%	
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	4.056,89	R\$ 4.056,89	0,339%		R\$ -				R\$ -	R\$ 4.056,89	100,00%	
16.06.077	MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50	2,98	R\$ 764,37	0,064%		R\$ -				R\$ -	R\$ 764,37	100,00%	
16.06.086	INSTALACAO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00	17,82	R\$ 35,64	0,003%		R\$ -				R\$ -	R\$ 35,64	100,00%	
16.06.090	INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	35,65	R\$ 178,25	0,015%		R\$ -				R\$ -	R\$ 178,25	100,00%	
16.06.091	INSTALACAO DE LOUSA (LG-02)	UN	10,00	8,91	R\$ 89,10	0,007%		R\$ -				R\$ -	R\$ 89,10	100,00%	
16.06.092	INSTALACAO DE MURAL (MR-02)	UN	1,00	18,22	R\$ 18,22	0,002%		R\$ -				R\$ -	R\$ 18,22	100,00%	
16.06.092	INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	4,00	885,28	R\$ 3.541,12	0,296%		R\$ -				R\$ -	R\$ 3.541,12	100,00%	
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00	1.138,21	R\$ 2.276,42	0,190%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.276,42	100,00%	
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	6,00	473,41	R\$ 2.840,46	0,237%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.840,46	100,00%	
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00	473,41	R\$ 2.840,46	0,237%		R\$ -				R\$ -	R\$ 2.840,46	100,00%	
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	11,11	R\$ 9.041,10	0,756%		R\$ -				R\$ -	R\$ 9.041,10	100,00%	
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	51,65	R\$ 1.342,90	0,112%		R\$ -				R\$ -	R\$ 1.342,90	100,00%	
16.18.080	SI-11 SINALIZACAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	325,11	R\$ 325,11	0,027%		R\$ -				R\$ -	R\$ 325,11	100,00%	
16.19.099	SERVICOS-HIDRAULICA	MV	472,02	90,18	R\$ 42.566,76	3,558%		R\$ -				R\$ -	R\$ 42.566,76	100,00%	
	TOTAL				R\$ 1.196.299,34	100,00%		R\$ 162.753,30				R\$ -	R\$ 1.196.299,34	100,00%	23,858%

F.M. QUADRA
PROJ. Nº 523/2020
F.S. Nº 6



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 7
6

Interessado: **AÇOVIA Indústria e Comércio de Estrutura Metálica e Pré-Moldados de Concreto Eireli.**

Referente: **TP 01/2019.**

Assunto: Medição 01

Obra: Término da Construção da Creche Escola

Foi realizada no dia 09/10/2020 vistoria referente à primeira medição conforme solicitado pela requerente, atesto para os devidos fins que os serviços foram aferidos e efetivamente realizados, perfazendo o valor de R\$ 161.500,41 (Cento e Sessenta e Hum Mil e Quinhentos reais e Quarenta e Hum Centavos).

Segue anexo:

- Planilha de Medição;
- Relatório Fotográfico.

Quadra/SP, 14 de outubro de 2020.

Sidnei Albano

Eng.º Civil e Eng.º de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5062080211
Assessor de Planejamento de Obras e
Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
F.s. Nº 8
G

Relatório Fotográfico



Foto 1 – Vista da Entrada.



Foto 2 – Vista da Lateral Esquerda.



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2000
Fis. Nº 9



Foto 3 – Vista parcial interna



Foto 4 – Vista lateral



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 10
6



Foto 5 – Vista interna



Foto 6 – Vista interna



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

F.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
F.s. Nº 11
6



Foto 7 – Vista parcial externa



Foto 8 – Vista externa



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

F.M. QUADRA
Proc. Nº 5236000
fis. Nº 12
9



Foto 9 – Vista externa

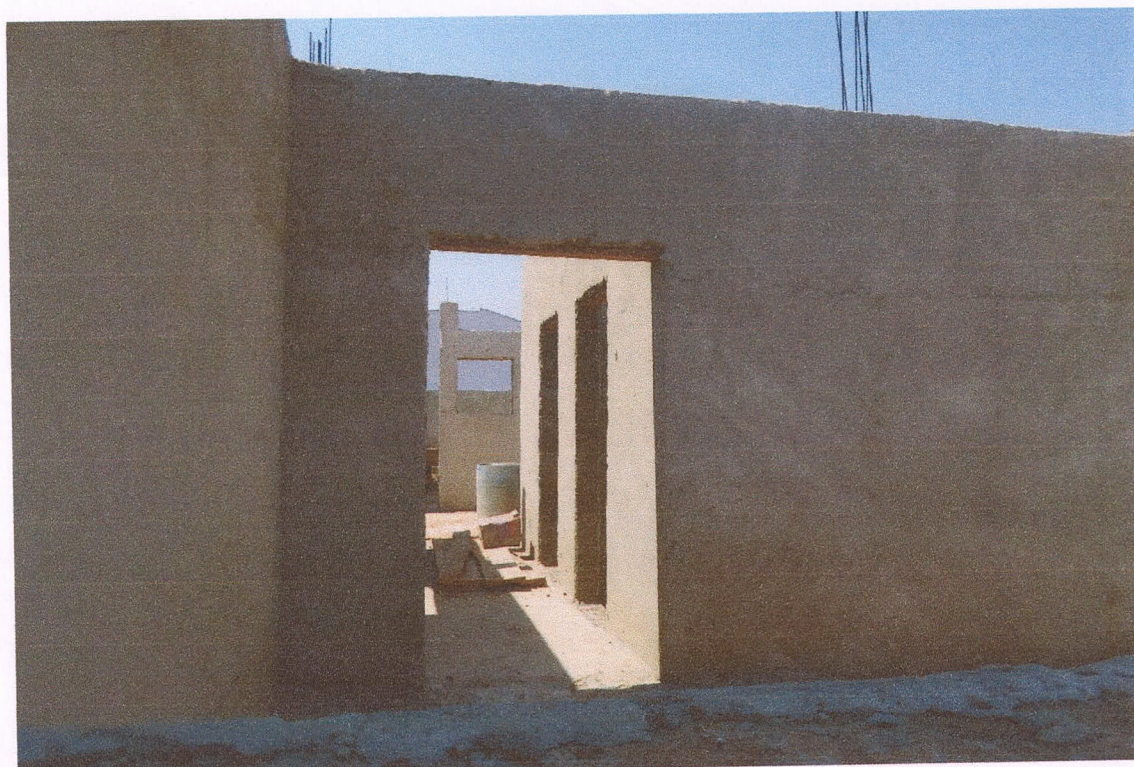


Foto 10 – Vista interna



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 13
8



Foto 11 – Vista geral

Quadra, 30 de Setembro de 2020


Sidnei Albano
Eng.º Civil e Eng.º de segurança do trabalho
CREA/SP 5062080211
Assessor de planejamento de obras e
Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

Proc. Nº 523/2020

(Página: 1 / 1)

Fis. Nº 14

Sistema CECAM

Data: 21/05/2020 10:21

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:	523	Ano:	2020	Data/Hora :	21/05/2020 10:21
Nome do Requerente:	AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS				
Endereço/Bairro:	RODOVIA MARECHAL RONDON - SP300 - KM183				
Cidade:	LARANJAL PAULISTA				
Telefone/Celular:	/				
CEP:	18510-000				
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 05.942.509/0001-77			
Documento:	Medições - 10				
Assunto:	MEDIÇÃO UNICA 1 E 2 - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019 - TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA				
Justificativa:	ANEXO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO				
Descrição:					
Data Vencimento:	21/05/2020	Valor:	0,00	Usuário:	amalia
Código Contábil:	2	REQUERENTE			

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0005232020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

EM. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 15
6

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/10/2020	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1972 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 44/2019	FICHA Nº 263
INTERESSADO 4926 - AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS M	C.N.P./C.P.F. 005.942.509/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO ROD MARECHAL RONDON - DISTRITO MARISTELA - LARANJAL PAULISTA - SP	CEP. 18510-000	TELEFONE 3287-5555		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA Prefeitura Municipal - Rua José Carlos da Silveira	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº CONCORRÊNCIA - 1/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 22/10/2020	VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365
PROGRAMA 0005		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.212.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS				ADIANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 32/2019
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.034.798,96	0,00	161.500,41	873.298,55
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 161.500,41	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	161.500,41	11	ENSINO INFANTIL	161.500,41
TOTAL		161.500,41	TOTAL		161.500,41

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	Serv	Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo, planilhas anexas no edital. - Convenio PAEM/Educação Infantil - Processo 4873/2013 - SE	161.500,4100	161.500,41
TOTAL					135.660,34	161.500,41

ISS - 8.075,02
INSS - 17.765,05

GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT
CONTADOR
1PR.056.817/Q-6 T SP

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e um mil, quinhentos reais e quarenta um centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE **22 OUT 2020** DE _____

PAGO EM BANCO

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO **BB - CREDAG**

CONTA **42.275-4**

CHEQUE Nº **102.201**

BC Nº **22 OUT 2020**

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**Materiais
Compras

Pedido de Compra 912/2020 - 1

P.M. QUADRA

Proc. Nº 523/2020

Fis. Nº 1076

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 21/10/2020 10:59

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 912/2020

Nº Ordem de Pedido 1

Modalidade: 1/2019 - CP-O CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

Processo Nº: 44/2019

Vínculo: ORDINÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenho: 1972/2020 - 06/03/2020

Global/Estimativo

Fornecedor 4517 AÇOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
Nome Fantasia AÇOVIA
Endereço ROD MARECHAL RONDON
Bairro DISTRITO MARISTELA
Cidade LARANJAL PAULISTA
CEP 18510-000
C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.942.509/0001-77
Inscr. Estadual

Estado SP
Nº Telefone (015) 3287-5555
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega Prefeitura Municipal

Ficha Nº 263

Dest. Recurso 0221200 EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

Endereço Rua José Carlos da Silveira, 36
Unidade Orçamentaria 20302 ENSINO INFANTIL
Validade null
Prazo Entrega
Garantia

Prazo de Pagto

Objeto Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo, planilhas anexas no edital.

Aplicação Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo, planilhas anexas no edital.

Nº Contrato 32 / 2019

Notas 704 - 20/10/2020

Usuário compras

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

C.N.P.J. 01.612.145/0001-06

Inscrição Nº Isenta

Endereço Rua Jose Carlos da Silveira nº 36-Jardim Sto Antonio-SP CEP 18255-000

Nº Telefone: (15) (3253-1225) Nº Fax:(15) (3253-1225)

e-mail: compras@quadra.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	0,135	Serv	27.0600/Contratação de empresa para término da construção da creche escola, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra. Conforme memorial descritivo, planilhas anexas no edital.	1.196.299,3700	161.500,41

Pedido 912/2020

Total

161.500,41

Cancelados (-)

0,00

Descontos (-)

0,00

Impostos (+)

0,00

Valor

161.500,41

(CENTO E SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO)

QUADRA, 20 de Outubro de 2020

Renato Cezar Nobrega Miranda
RG: 47.565.188-01

		Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista Pref. Mun. de Laranjal Paulista NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 704 Código de Verificação de Autenticidade 7TNA6G5EY Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/10/2020 às 11:16:34 Chave de Acesso 421025591XPVZRN9KOWFPBBA6CW76N Para certificação da autenticidade acesse http://189.45.236.250/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS QUADRA-SP	Local da Prestação QUADRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/10/2020	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.942.509/0001-77		000420100	000009319	ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E	
Logradouro	Complemento		Bairro		
ESTRADA ROD MARECHAL RONDON, S/N	SP 300 KM 183		DISTRITO MARISTELA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
18510-000	Laranjal Paulista-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.145/0001-06	ISENTO		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA JOSE CARLOS VIEIRA , 36			JARDIM SANTO ANTONIO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail		
18255-000	QUADRA - SP	15 32531225	compras@quadra.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	REF 1 MEDICAO , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA , COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMPREGADO , EQUIPAMENTOS , MÃO DE OBRA , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO , PLANILHAS ANEXAS NO EDITAL - CONVENIO PAEM / EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO 4873/2013-SE			161.500,41	R\$ 161.500,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 07.02		Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		5,00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 161.500,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.500,41	R\$ 8.075,02 15	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS (161.500,41 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.765,05 5318	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 135.660,34						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
ISS DEVIDO PELO TOMADOR DA OBRA N.E ORDINARIO Nº 1971 PEDIDO Nº 911 CONTRATO 32/2019 CONCORRENCIA 01/2019 PROCESSO 44/2019 - PGTO ATRAVES DO BANCO SICOOB - 756 AGENCIA 3207 C/C 60124-1	

RECEBI(EMOS) DE ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PRE-MO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 704 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7TNA6G5EY.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



P.M. QUADRA

Proc. Nº 523/2020

F.S. Nº 19

G332221134632768010
22/10/2020 11:36:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 511-8
Conta corrente 42275-4 PREF MUNICIPAL DE QUADRA

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3207 COCREFOCAPI
Conta corrente (com DV) 601241
CNPJ 05.942.509/0001-77
Nome favorecido ACOVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTUR
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 102.201
Valor 135.660,34
Data transferência 22/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FAB46F7CF8AF7D0C

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA
JD634328 LUIZ CARLOS PEREIRA

22/10/2020 11:35:56

22/10/2020 11:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD634328 LUIZ CARLOS PEREIRA.

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa**Observações:** Nome:

Conta Debitada:

PREF MUN DE QUADRA

0359/006/00000033-9

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ACOVIA INDUSTRIA E COM DE ESTR ROD MARECHAL RONDON, SP 300 15-3253900	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2840
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	04-COMPETÊNCIA	10/2020
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	05-IDENTIFICADOR	05.942.509/0001-77
	06-VALOR DO INSS	17.765,05
	07-	
	08-	
	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	17.765,05
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22102020 0359006000000339 884996		

Identificação da Operação:	PAG EMPENHO 100408 1
Data de Débito:	22/10/2020
Data da Operação:	22/10/2020 -13:54:17
Código da Operação:	00884996
Chave de Segurança:	QQJRX62VWPZ2KMUL

CPFs Autorizadores:

026.830.888-84

424.107.358-19

Operação realizada com sucesso.DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDICÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 20
G



SERVIÇOS PRELIMINARES



SUPERESTRUTURA

VISTOS E DATA

AÇOVIA
CONSTRUTORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDICÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 21
G



SUPERESTRUTURA



SUPERESTRUTURA

VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 22
6



SUPERESTRUTURA

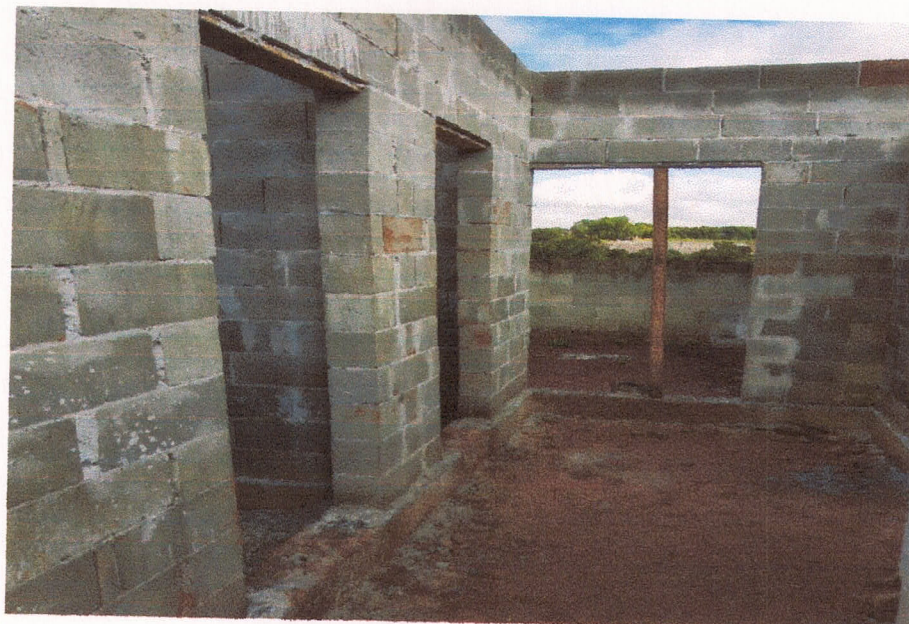

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDICÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 23
6



ALVENARIA E OUTRO ELEMENTOS



ALVENARIA E OUTRO ELEMENTOS

VISTOS E DATA

AÇOVIA
CONSTRUTORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 29
G



ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS



ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 25
G

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020



ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS



REVESTIMENTO TETO E PAREDE

VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

M. QUADRA
OC. Nº 523/2020
S. Nº 26
G



REVESTIMENTO TETO E PAREDE



REVESTIMENTO TETO E PAREDE


VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

MEDICÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

M. QUADRA
Doc. Nº 523/2020
S. Nº 27
9

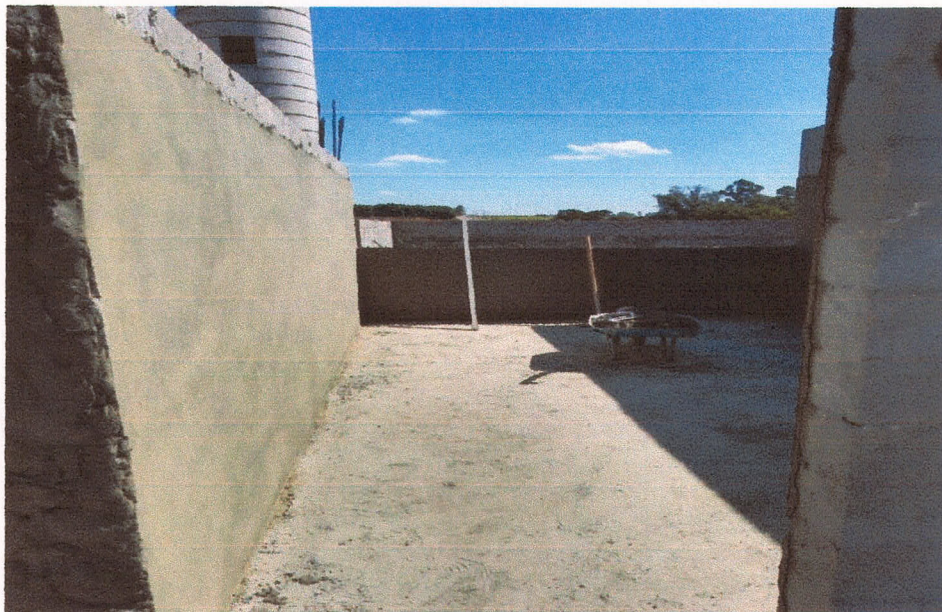

REVESTIMENTO TETO E PAREDE



REVESTIMENTO TETO E PAREDE

VISTOS E DATA


AÇOVIA
CONSTRUTORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

P.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 28
6

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020

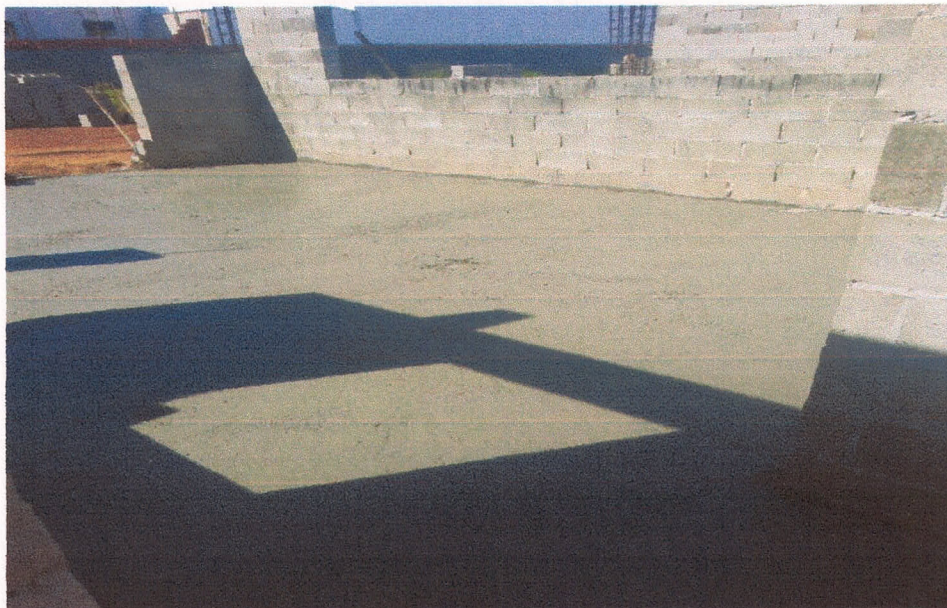

PISO INTERNO



PISO INTERNO

VISTOS E DATA

AÇOVIA
CONSTRUTORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

F.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
Fis. Nº 29
7

MEDIÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020



PISO INTERNO



PISO INTERNO

VISTOS E DATA

AÇOVIA CONSTRUTORA.		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
------------------------	--	--------------------------------


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA

F.M. QUADRA
Proc. Nº 523/2020
F.s. Nº 30
6

MEDICÇÃO -1 - PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 Á 15 DE MAIO DE 2020



PISO INTERNO

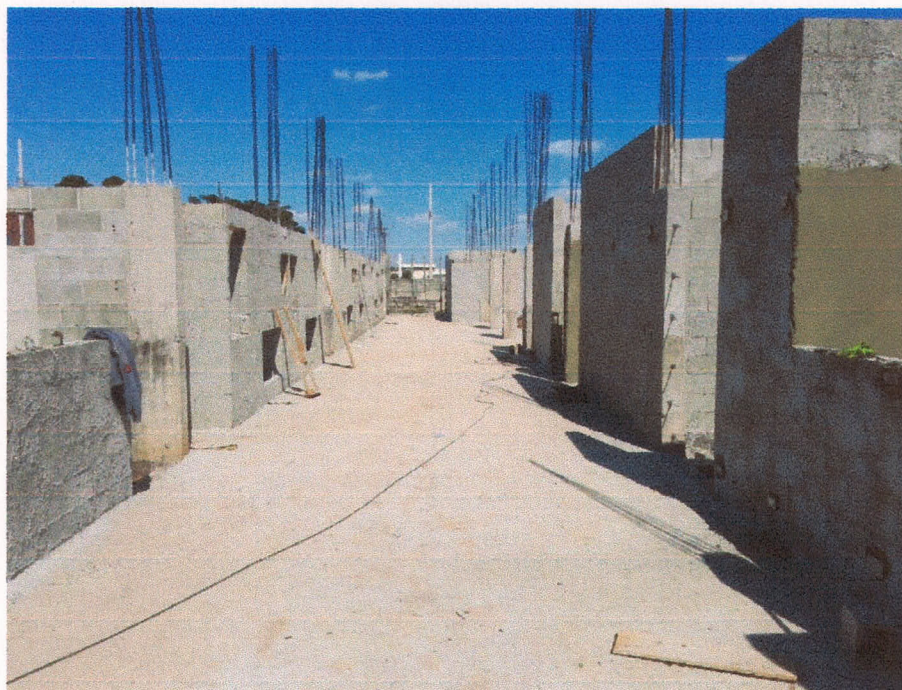

PISO INTERNO

VISTOS E DATA

AÇOVIA
CONSTRUTORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
