

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= ENGENHARIA =

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 1147 / 2022

Data: 27/07/2022 10:00:30

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

Assunto
5ª MEDIÇÃO

Observação
PLANILHA REFERENTE A OBRA DO CRAS.

COM DRAS

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162

PLANILHA DE MEDIÇÕES				ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO									
Obra: Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social				Modalidade: TP 01-2021		DATA DESTA MEDIÇÃO: 26/jul/2022			Data OS:				
Local: Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP				Valor (R\$): 313.284,57		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 19.205,81			(Dias de) Prazo: Aditivo:				
Órgão: Prefeitura Municipal de Quadra				Data Base:		Previsão Término:							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 05			ACUMULADO				
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor		
1	Preliminares			R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81		
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)	m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00		
1.2	Locação da obra	m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25		
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06		
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon	m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00		
1.5	Aterro nível da obra	m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50		
2	Fundações			R\$	53.692,23	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23		
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm	ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30		
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames	m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72		
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos	m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15		
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum	m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32		
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma													
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames	kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75		
2.6	Ferragem CA 50 para estacas	kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35		
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas	kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20		
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa	m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06		
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto	m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18		
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade	m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00		
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto	m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20		
3	Estrutura			R\$	53.601,93	0,0%	R\$	-	99,0%	R\$	53.063,92		
3.1	Pilares (40 um.)												
3.1.1	Formas madeira	m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00		
3.1.2	Desforma	m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50		
3.1.3	Ferragem CA 50	kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75		
3.1.4	Ferragem CA 60	kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50		
3.1.5	Adadensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58		
3.1.6	Concreto fck 25 mpa	m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86		
3.2	Vigas da cobertura												
3.2.1	Formas madeira	m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95		
3.2.2	Desforma	m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01				100,0%	39,43	138,01		
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm	kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79		
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm	kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43		
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm	kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77		
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm	kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23		
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00		
3.2.8	concreto fck 25 mpa	m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27		
3.3	Laje de forro												
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15	m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00		
3.3.2	Malha de aço CA 60 15 x 15 cm	kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29		
3.5	Vergas / Contra-vergas												
3.5.1	Vergas cerâmicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00		
3.5.2	Vergas cerâmicas 11 cm concreto fck 25	ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00				100,0%	25,00	400,00		
3.5.3	Contra vergas cerâmicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00		
4	Alvenaria e Painéis			R\$	19.938,88	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88		
4.1	Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24	m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72		
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14* 24	m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16		
5	Revestimento			R\$	19.573,03	72,3%	R\$	14.143,61	81,1%	R\$	15.874,17		
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56		
5.2	Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim/cal/areia 1:2:8	m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28	100,0%	332,80	8.353,28	100,0%	332,80	8.353,28		
5.3	Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72	100,0%	191,10	993,72	100,0%	191,10	993,72		
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8	m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61	100,0%	191,10	4.796,61	100,0%	191,10	4.796,61		
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante	m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36								
5.6	Regunte azulejos	m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50								
6	Pisos			R\$	25.252,00	0,0%	R\$	-					
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado	m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03								
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm	m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39								
6.3	Piso ceramico, Pl 5 c/ arg/ colante	m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98								
6.4	Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante	ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70								
6.5	Rejunte piso ceramico c/ argamassa industrializada	m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75								
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada	ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40								
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada	m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00								
6.8	Piso ladrilho hydr.de alerta / direcional assente argamassa	m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00								
6.9	Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm	ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75								
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)	ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00								
7	Forros			R\$	-	0,0%	R\$	-					
Cotado no item 3.3 (Laje de forro)				R\$	-								
8	Cobertura			R\$	23.258,02	0,0%	R\$	-					
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro	m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00								
8.3	Telhas de barro tipo romana	m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02								
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00								
8.5	Comieira de barro emboçado	ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00								
9	Pintura			R\$	9.589,08	0,0%	R\$	-					
9.1	Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demão	m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58								
9.2	Pintura em latex acrilico paredes internas e externas duas (2) demãos	m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 05			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.3	Selador acrílico laje de ferro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$	29.952,70	0,0%	RS	-			
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00						
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00						
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	un.	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40						
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$	12.083,31	19,3%	RS	2.332,20	19,3%	RS	2.332,20
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76						
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73						
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30						
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00						
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica movel e arejador latão crom.	unid	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saida	unid	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00						
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92						
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90						
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20	100,0%	30,00	1.096,20	100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30						
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00	100,0%	4,00	1.236,00	100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de desgarga acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$	29.676,00	9,2%	RS	2.730,00	17,2%	RS	5.105,00
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50						
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00						
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00						
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" x 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00						
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00						
12.9	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00						
12.10	Disjuntor termomagnético tripolar 32A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00						
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00						
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" -Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00						
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00						
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00						
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00						
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50						
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30						
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30						
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40						
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00						
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00						
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00						
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00						
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00						
12.29	Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00						
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00						
12.31	Luminaria LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00						
12.32	Luminaria LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00						
12.33	Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00						
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	100,0%	1,00	1.370,00	100,0%	1,00	1.370,00
12.35	Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa	unid	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00	100,0%	2,00	1.360,00	100,0%	2,00	1.360,00
12.36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 05			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12.37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00						
12.38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lâmpada LED de 90° - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00						
12.39	Quadro telebras (telefonía) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00						
12.40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00						
13	Vidros			R\$	3.135,60	0,0%	R\$	-			
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13.2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$	24.476,98	0,0%	R\$	-	81,6%	R\$	19.964,03
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65						
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	KG	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	Kg	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	KG	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	Kg	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	Kg	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga cerâmica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga cerâmica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.12	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.14	Pintura muro - selador acrílico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
14.2.15	Pintura muro - latex acrílico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:						MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 19.205,81		SALDO A EXECUTAR:		
						Percentual:	6,13%				
						ACUMULADO MEDIDO:	R\$ 179.025,24		%	R\$	
						Percentual:	57,14%		42,86	134.259,33	

Engº NEWTON PIACENTINI
 CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
 CREA: 0601315173

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

FLS. Nº 05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 27/07/2022 10:00

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: Assunto: Nome do Requerente: Endereço/Bairro: Cidade: Telefone/Celular:	1147 Ano: 2022 Data/Hora : 27/07/2022 10:00 5ª MEDIÇÃO ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA PIRACICABA CEP: 13401-396 (19) 3436-1700 /	
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07
Documento: Assunto: Justificativa: Descrição:	Medições - 19 5ª MEDIÇÃO PLANILHA REFERENTE A OBRA DO CRAS.	
Data Vencimento: Código Contábil:	27/07/2022 2 Valor: 0,00	Usuário: erica REQUERENTE
0011472022		Autenticação Mecânica ou Recebimento



P.M. QUADRA
FLS. N° 07

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 1147/2022 – de: 27/07/2022

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

CONSTRUÇÃO

Ref.: 5ª MEDIÇÃO.

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 29 DE JULHO DE 2022.


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
FLS. N° 08

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PROC. 1147/2022

INTERESSADO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

REF.: 5ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CRAS

PARECER:

OS SERVIÇOS APRESENTADOS PARA A 5ª MEDIÇÃO FORAM REALIZADOS E IMPORTAM EM R\$ 19.205,81 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E CINCCO REAIS OITENTA E UM CENTAVOS), E DIZEM RESPEITO AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DAS ALVENARIA, TUBULAÇÃO DE ESGOTO/CAIXAS DE PASSAGEM, PADRÃO E QUADRO DE ENERGIA.

SEGUE FOTOS DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

QUADRA, 03 DE AGOSTO DE 2022

Rui Carlos Baiardi
Ass: Planej. Obras e Serv. Público
CREA: 060041913-5



P.M. QUADRA
FLS. N° 09

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br



CNPJ: 01.612.145/0001-06



Prefeitura Municipal de Quadra


"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

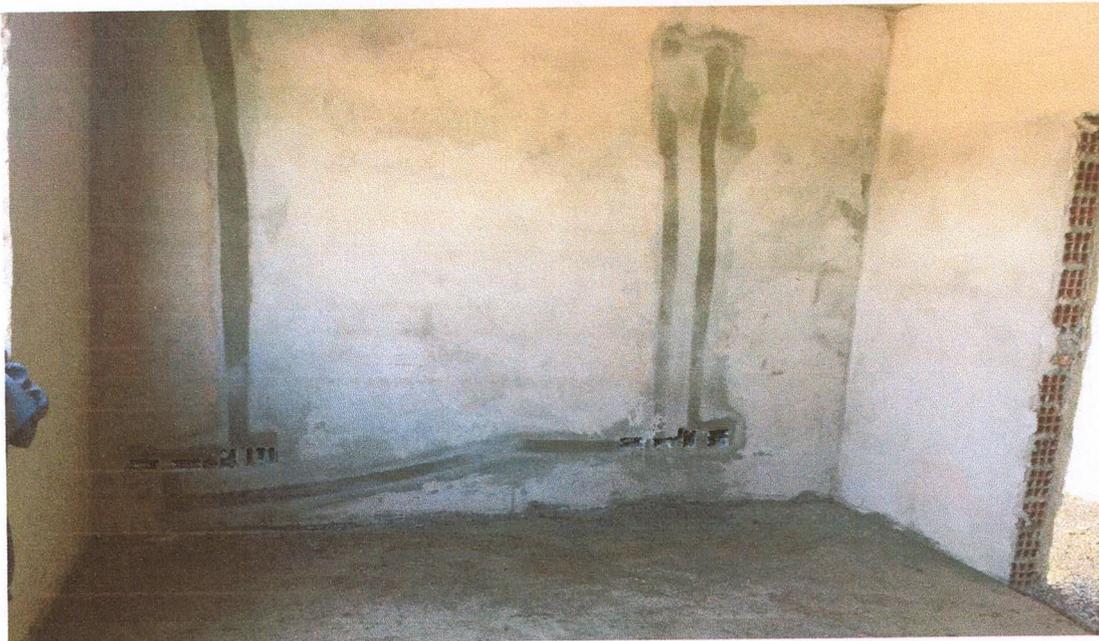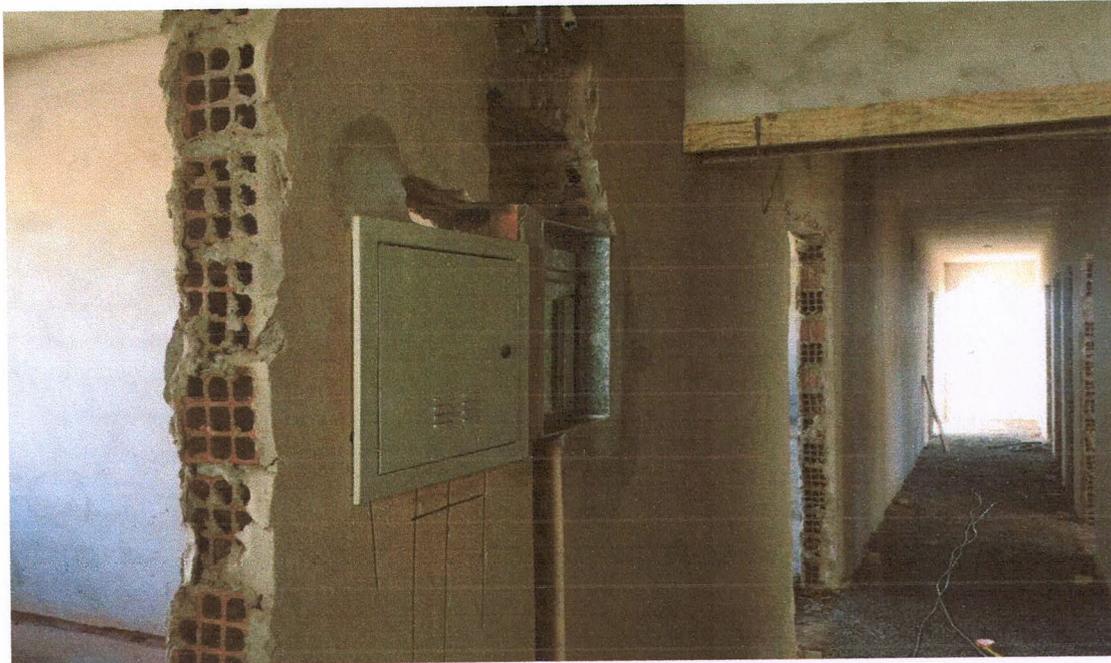




Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

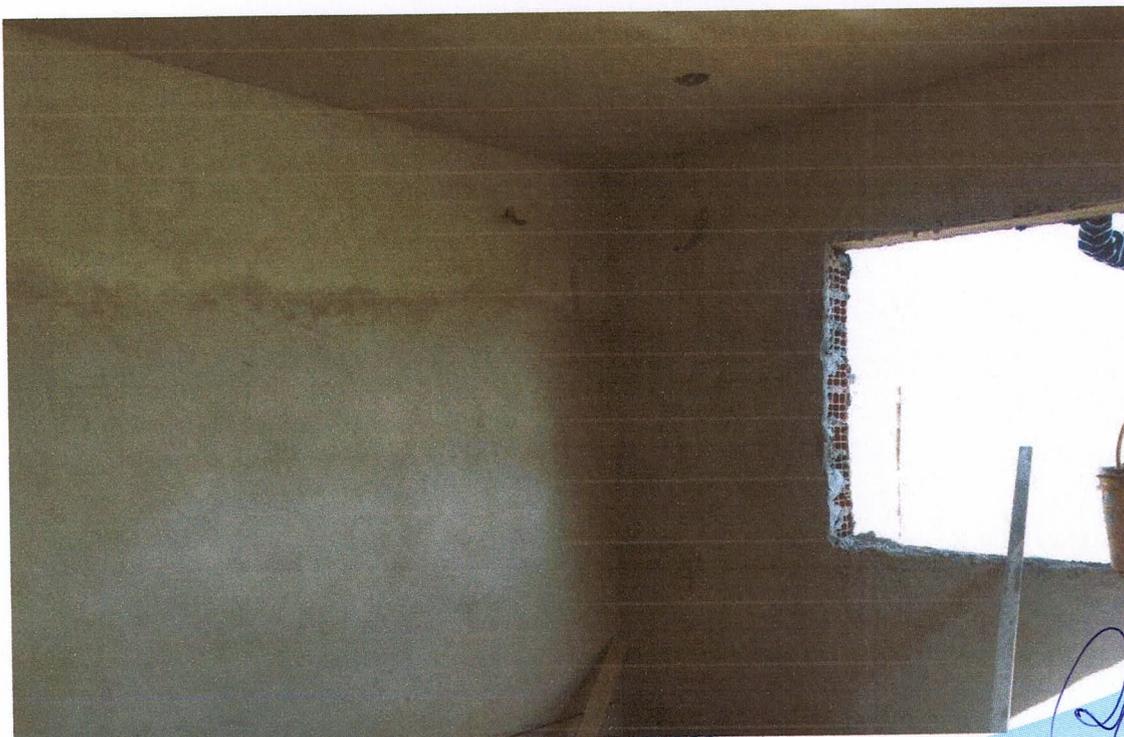



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares




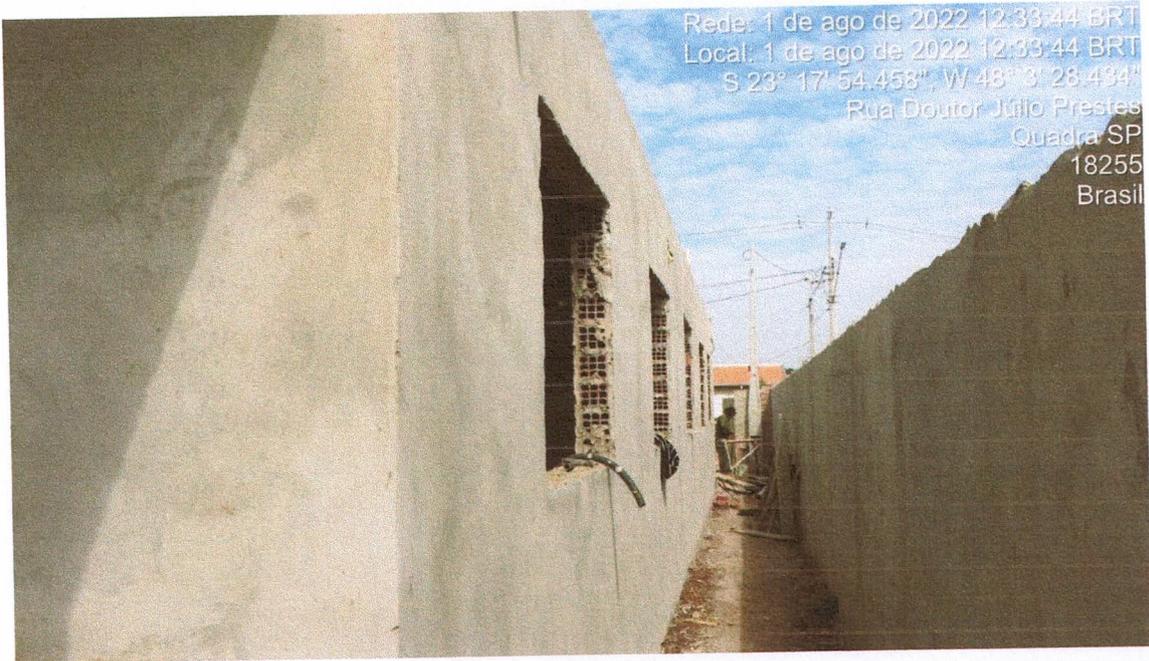


A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

P.M. QUADRA
FLS. N° 14

ES

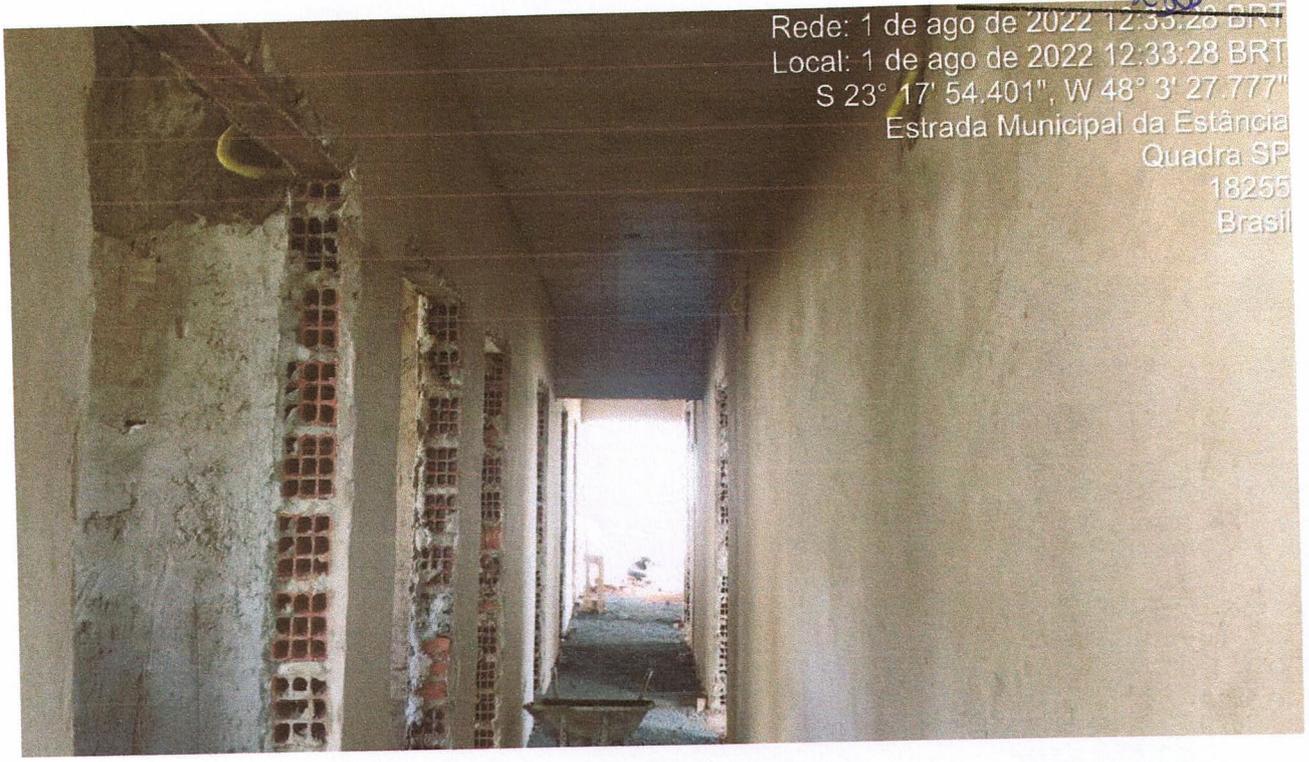

Rede: 1 de ago de 2022 12:33:26 BRT
Local: 1 de ago de 2022 12:33:28 BRT
S 23° 17' 54.401", W 48° 3' 27.777"
Estrada Municipal da Estância
Quadra SP
18255
Brasil

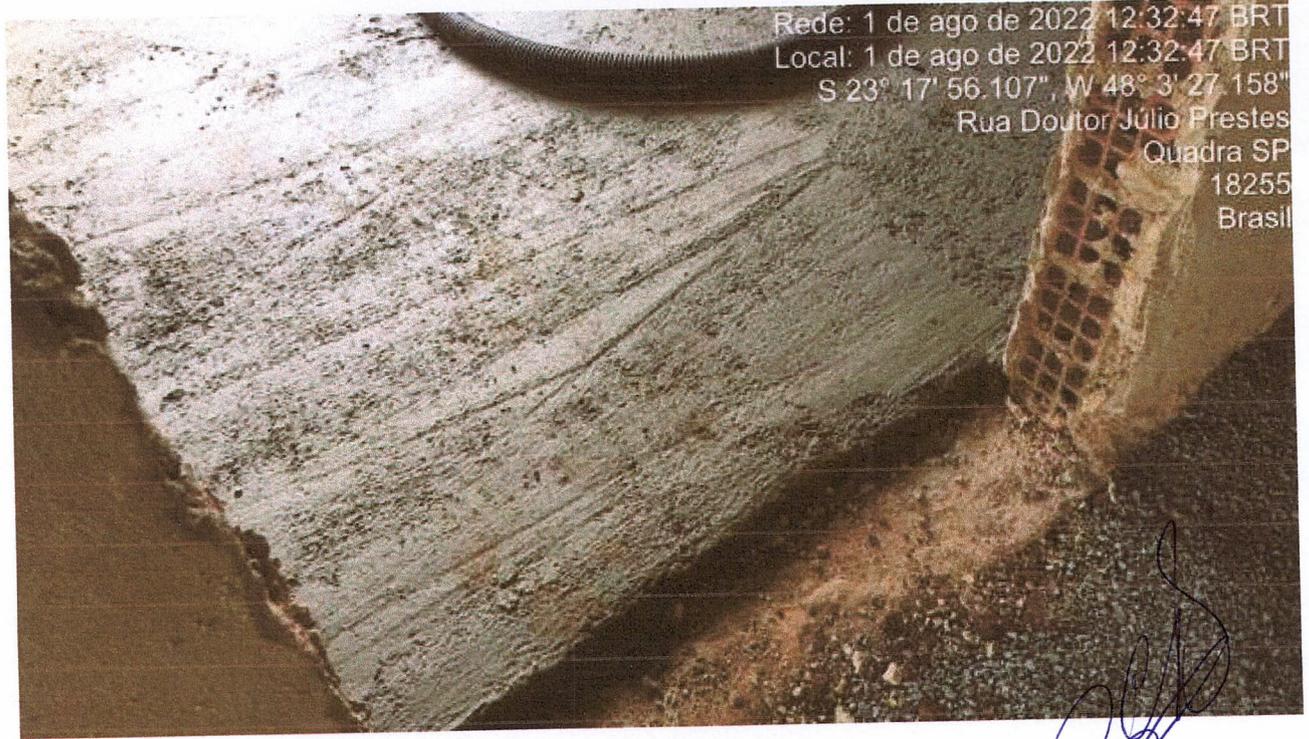

Rede: 1 de ago de 2022 12:32:47 BRT
Local: 1 de ago de 2022 12:32:47 BRT
S 23° 17' 56.107", W 48° 3' 27.158"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil

[Handwritten signature]


**Prefeitura Municipal de Quadra***"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares****Protocolo N° 1147/2022**

Interessado: Elisangela Aparecida dos Santos Silva
Construção.

Finalidade: Pagamento da 5ª Medição dos Serviços de
Construção do CRAS - Contrato 28/2021.

Diante da Liberação do Setor de Engenharia, encaminhado ao Setor de Compras para solicitar a nota fiscal e demais documentos, e posteriormente para o setor Contabilidade para que emita Ordem de Pagamento, no valor de R\$ 19.205,81 (Dezenove mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), com data de vencimento para 05/08/2022 e posteriormente encaminhe ao setor tesouraria para pagamento. A tesouraria após a quitação, junte cópia ao processo do pagamento e digitalize na totalidade o processo para publicação, posteriormente archive-se.

Quadra, 03 de agosto de 2022.


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
FLS. N° 36
10

Usuário: emili
Sistema CECAM
Data: 05/08/2022 07:25:48
(Página 1/1)

DATA 03/08/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 64/2021	FICHA Nº 6066
INTERESSADO 5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST	C.N.P./J.C.P.F. 011.002.419/0001-07	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP	CEP. 13401-396	TELEFONE 3436-1700	CONTA
EMAIL ssconstrutora2020@gmail.com	LOCAL DE ENTREGA CRAS - Pça Chico Vieira	PRAZO ENTREGA 240 Dias	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº TOMADA DE PREÇOS - 1/2021	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Por apresentação de	VENCIMENTO 05/08/2022
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			PROGRAMA 0012
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 28/2021
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
316.023,25	159.819,43	19.205,81	136.998,01
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 19.205,81
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	19.205,81	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	19.205,81
TOTAL		19.205,81	TOTAL		19.205,81

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 0,000	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CRAS	19.205,8100	19.205,81
TOTAL						19.205,81

155 - 116,31

- 19.089,50

<u>03 / 08 / 2022</u>	<u>03 / 08 / 2022</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/0-6	 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE dezenove mil, duzentos e cinco reais e oitenta um centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE 05 AGO 2022</p> <p style="text-align: center;">DEPOSITO EM CONTA</p>	<p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>DESPESA PAGA BB - ANPC CRAS</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA 429-4</p> <p>CHEQUE Nº 80501</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRO Adm</p> <p>ADNILSON FARIA</p> <p style="text-align: right;">05-AGO-2022</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Material
Compras
Pedido de Compra 1665/2022 - 5

P.M. QUADRA

(Página: 1 / 1)

FLS. Nº 17

Sistema CECAM

Data: 04/08/2022 10:14

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1665/2022**Global/Estimativo****Nº Ordem de Pedido: 5****Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES****Modalidade: 1/2021 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS****Processo Nº: 64/2021****Empenho: 100104/2022 - 01/01/2022****Vínculo: ORDINÁRIO**

Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL

Endereço R ARTUR MADEIRA 233

Bairro VILA CRISTINA

Cidade PIRACICABA

CEP 13401-396

C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.002.419/0001-07

Inscr. Estadual

e-mail ssconstrutora2020@gmail.com

Estado SP

Nº Telefone (019) 3436-1700

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega CRAS**Ficha Nº 6066****Dest. Recurso 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Endereço Pça Chico Vieira
Unidade Orçamentaria 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Validade

Prazo Entrega 240 Dias

Prazo de Pagto Por apresentação de medição

Garantia ...

Objeto CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERNECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERNECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Contrato 28 / 2021

001	0,061 Serv	27.0618/CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.023,2500	19.205,81
------------	-------------------	---	---------------------	------------------

Pedido 1665/2022	Total	19.205,81
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	19.205,81

(DEZENOVE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)**QUADRA, 03 de Agosto de 2022**

5ª Medição
Construção CRAS

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 44		
		Série: E		
		Data Emissão: 03/08/2022		
		Certificação: 86D08-46F55		
DADOS DO PRESTADOR				
	Nome/Razão Social: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME		Insc. Estadual: 535836721116	
	Nome Fantasia: SS CONSTRUÇÃO CIVIL		Nº: 241	
CNPJ/CPF: 11.002.419/0001-07		Insc. Municipal: 616261	Compl.:	
Endereço: RUA ARTHUR MADEIRA PROF		UF: SP	CEP: 13401-396	
Bairro: VILA CRISTINA		Telefone: 1934252812		
Município: PIRACICABA				
E-mail: angelocci@bol.com.br				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		Insc. Estadual:		
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06		Nº: 36		
Endereço: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA		Compl.:		
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO		UF: SP	CEP: 18255-000	
Município: QUADRA		Telefone: 1532539000		
E-mail: administração@quadra.sp.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 28/2021 (TOMADA DE PREÇOS 01/2021 PROCESSO Nº 64/2021) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO				
CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL)				
MATRÍCULA CEI 90.00947217/74 - TOMADA DE PREÇOS 01/2021				
TOTAL NF R\$ 19.205,81				
TOTAL MATERIAL R\$ 14.865,81				
TOTAL MDO R\$ 4.340,00				
NÃO SUJEITO A RETENÇÃO INSS CONFORME ARTIGO 149 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009 PARA				
EMPRESAS TRIBUTADAS NO SIMPLES PARA NF DE SERVIÇOS COM MATRICULA CEI QUANDO A CONTRATANTE				
É ENTIDADE PÚBLICA				
RETENÇÃO 2,68% ISS SOBRE SERVIÇOS R\$ 116,31(-)				
BANCO SANTANDER - AGENCIA 0041 - CONTA CORRENTE 13.010921-6				
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)	Sim	1,00	19.205,8100	19.205,81
Código da Obra (CEI): 900094721774 - Número de Processo:				
Valor Tributável: R\$ 19.205,81	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 19.205,81
Valor Total das Deduções: R\$ 14.865,81	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.340,00	Aliquota: 2,6800%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 19.089,50
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de pro				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 08/2022	Local do Recolhimento: QUADRA/SP	Dt	03/08/2022 14:01:03	
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competencia:		
CNAE: 4120400	Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 03/08/2022 às 14:01:09				
Recebi(emos) de: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 44 Certificação 86D08-46F55	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

ATESTADO
Atesto que o Serviço/Material
Contido nesta Nota Fiscal,
foi Realizado.
Quadra: 03-08-22
Nome: Osman Rodrigues
RG: 42607801-5
[Handwritten Signature]



PREFEITURA DE **QUADRA** P.M. QUADRA
FLS. N° 20

GUIA DE RECOLHIMENTO DE SERVIÇO TOMADO - NF 0000044		EXERCÍCIO 2022	
Código 9000000354	Inscrição	CNPJ/CPF 01.612.145/0001-06	
Identificação PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - 01.612.145/0001-06			
Endereço RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA SANTO ANTONIO QUADRA - SP		JARDOM 18255000 -	Endereço Correspondência RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA SANTO ANTONIO QUADRA - SP
JARDOM 18255000 -			
Observações da Guia			
REFERÊNCIA : 07/2022			
REF.NOTA FISCAL N° : 000011			
DATA EMISSÃO : 05/07/2022			
COD.SERVICO : 7-02			
ATIVIDADE : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAG TIPO DOCUMENTO : AUTORIZAÇÃO P/ IMPRESSÃO DE DOCS. FISCAIS - AIDF			
VALOR DO SERVIÇO R\$: 19.205,81			
BASE DE CÁLCULO R\$: 4.340,00			
ALÍQUOTA : 2,68%			
VALOR DO IMPOSTO R\$: 116,31			
NºPJ/CPF PRESTADOR : 11.002.419/0001-07			
PRESTADOR : ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO			
CNPJ/CPF TOMADOR : 01.612.145/0001-06			
OBS.NOTA : 5ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DO CRAS - TP 01/2021 - PROCESSO 64/2021.20828/2021 - EMPENHO 100.104 TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - 01612145000106			
RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA nº 36 JD SANTO ANTONIO - QUADRA/SP - 18255000			
Agência/Código Beneficiário 0284-4/0094134-4		Nosso Número 09/00000233046-9	Número Documento 9000000354/2022/EXER.
Vencimento 15/08/2022	Parcela 7/2022	Valor do Documento 116,31	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

237-2 23790.28406 90000.023300 46009.413405 5 90780000011631

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		Parcela 7/2022	Vencimento 15/08/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - 01612145000106 RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA nº 36 JD SANTO ANTONIO - QUADRA/SP - 18255000		Agência/Código Beneficiário 0284-4/0094134-4	
Data Documento 08/08/2022	Número Documento 9000000354/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Aceite N
Uso Banco Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 08/08/2022
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) DEVIDO A COBRANÇA COM REGISTRO O BOLETO SÓ SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO NO DIA SEGUINTE DA DATA DE EMISSÃO. APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS. NAO RECEBER APÓS 31/12/2022		Nosso Número/Cód. Documento 09/00000233046-9	
		(+) Valor do Documento 116,31	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - 01.612.145/0001-06		Insc. Cadastral:	
Endereço: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA - JARDOM SANTO ANTONIO - 18255000 - QUADRA - SP			
Pagador/Avalista PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - 01.612.145/0001-06			Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3320511498113871
05/08/2022 11:55:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
8251108251 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ANPC CONSTRUCAO DO CRAS
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 429-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220805145209390008367
CNPJ DO PAGADOR: 1.612.145/0001-06
VALOR: 19.089,50
TARIFA: 10,00
DATA: 05/08/2022 - 11:53:58
DESCRICAO: PAG EMP 100104 /5 NF 44 - PREF QUADRA-----
PAGO PARA: Ss Construcao Civil
CNPJ: 11.002.419/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0041 - CONTA: 0000000000130109216
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Notificacao enviada em: 05/08/2022 - 11:53:59

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C5.FB8.C9D.947.824
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.P.M. QUADRA
FLS. N° 23
210

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO:

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 1177 / 2022

Data: 03/08/2022 13:50:51

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

Assunto
5ª MEDIÇÃO

Observação
REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
CRAS.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

ENG



ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 11.002.419/0001-07 – Inscrição Estadual: 535.836.721.116

Rua Artur Madeira, 233 – Vila Cristina – Piracicaba – SP.

CEP: 13.401-396 e-mail: ssconstrutora2020@gmail.com – Fone (19) 3436 1700

P.M. QUADRA

FLS. N° 02

218

PROTOCOLO

Nome da Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

CNPJ: **01.612.145/0001-06**

End.: (Rua/Av.) **RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA,36**

Bairro: **JD. STO ANTONIO** CEP: **18.255-000**

Cidade: **QUADRA - SP**

Vem mui respeitosamente requerer de vossa excelência: **PROTOCOLAR E ENVIAR AO SETOR RESPONSÁVEL A DOCUMENTAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS.**

Nestes termos
P. deferimento,

Piracicaba, 03 de agosto de 2022.

PLANILHA DE MEDIÇÕES				ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO							
Obra:	Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social			Modalidade:		DATA DESTA MEDIÇÃO:			Data OS:		
Local:	Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP			TP 01-2021		26/jul/2022			(Dias de) Prazo: Aditivo:		
Órgão:	Prefeitura Municipal de Quadra			Valor (R\$):		VALOR DA MEDIÇÃO:			Previsão Término:		
				313.284,57		R\$ 19.205,81					
				Data Base:							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO OS			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
1	Preliminares			R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)	m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00
1.2	Locação da obra	m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25
1.3	Limpesa mecanizada do terreno	m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon	m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00
1.5	Aterro nível da obra	m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50
2	Fundações			R\$	53.692,23	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm	ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames	m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos	m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum	m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma											
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames	kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75
2.6	Ferragem CA 50 para estacas	kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas	kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa	m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto	m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade	m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto	m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20
3	Estrutura			R\$	53.601,93	0,0%	R\$	-	99,0%	R\$	53.063,92
3.1	Pilares (40 um.)										
3.1.1	Formas madeira	m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00
3.1.2	Desforma	m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50
3.1.3	Ferragem CA 50	Kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75
3.1.4	Ferragem CA 60	Kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50
3.1.5	Adadensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58
3.1.6	Concreto fck 25 mpa	m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86
3.2	Vigas da cobertura										
3.2.1	Formas madeira	m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95
3.2.2	Desforma	m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01						
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm	Kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm	Kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm	Kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm	Kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento	m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00
3.2.8	concreto fck 25 mpa	m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27
3.3	Laje de forro										
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15	m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00
3.3.2	Malha de aço CA 60 15 x 15 cm	Kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29
3.5	Vergas / Contra-vergas										
3.5.1	Vergas ceramicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00
3.5.2	Vergas ceramicas 11 cm concreto fck 25	ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00						
3.5.3	Contra vergas ceramicas 14 concreto fck 25	ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00
4	Alvenaria e Painéis			R\$	19.938,88	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88
4.1	Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24	m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14 * 24	m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16
5	Revestimento			R\$	19.573,03	72,3%	R\$	14.143,61	81,1%	R\$	15.874,17
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56
5.2	Revestimento alv. int./ext., massa unica, cim./cal/areia 1:2:8	m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28	100,0%	332,80	8.353,28	100,0%	332,80	8.353,28
5.3	Chapisco forro de laje, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm	m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72	100,0%	191,10	993,72	100,0%	191,10	993,72
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8	m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61	100,0%	191,10	4.796,61	100,0%	191,10	4.796,61
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante	m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36						
5.6	Regunte azulejos	m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50						
6	Pisos			R\$	25.252,00	0,0%	R\$	-			
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado	m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03						
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm	m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39						
6.3	Piso ceramico, P1 5 c/ arg/ colante	m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98						
6.4	Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante	ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70						
6.5	Rejunte piso ceramico c/ argamassa industrializada	m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75						
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada	ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40						
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada	m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00						
6.8	Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa	m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00						
6.9	Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm	ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75						
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)	ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00						
7	Forros			R\$	-	0,0%	R\$	-			
Cotado no item 3.3 (Laje de forro)					R\$	-					
8	Cobertura			R\$	23.258,02	0,0%	R\$	-			
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro	m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00						
8.3	Telhas de barro tipo romana	m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02						
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00						
8.5	Comieira de barro emboçado	ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00						
9	Pintura			R\$	9.589,08	0,0%	R\$	-			
9.1	Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demão	m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58						
9.2	Pinrtura em latex acrilico paredes internas e externas duas (2) demãos	m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 05			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.3	Selador acrílico laje de ferro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$	29.952,70	0,0%	R\$	-			
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00						
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00						
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	unid.	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40						
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$	12.083,31	19,3%	R\$	2.332,20	19,3%	R\$	2.332,20
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76						
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73						
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30						
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid.	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00						
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid.	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica movel e arejador latão crom.	unid.	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid.	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saída	unid.	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00						
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92						
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90						
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20	100,0%	30,00	1.096,20	100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30						
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00	100,0%	4,00	1.236,00	100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$	29.676,00	9,2%	R\$	2.730,00	17,2%	R\$	5.105,00
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50						
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00						
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00						
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00						
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00						
12.9	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00						
12.10	Disjuntor termomagnético tripolar 32A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00						
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00						
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" -Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" -Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00						
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00						
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00						
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid.	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00						
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50						
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30						
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30						
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40						
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00						
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00						
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00						
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00						
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00						
12.29	Interruptor 1 tecla simples = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00						
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00						
12.31	Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00						
12.32	Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00						
12.33	Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid.	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00						
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid.	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	100,0%	1,00	1.370,00	100,0%	1,00	1.370,00
12.35	Quadro de dist. Energia, c/ barramento 24 dij. - embutido chapa	unid.	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00	100,0%	2,00	1.360,00	100,0%	2,00	1.360,00
12.36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid.	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 05			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12,37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00						
12,38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00						
12,39	Quadro telebras (telefonia) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00						
12,40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00						
13	Vidros			R\$	3.135,60	0,0%	R\$	-			
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13.2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$	24.476,98	0,0%	R\$	-	81,6%	R\$	19.964,03
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65						
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	KG	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	Kg	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	KG	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	Kg	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	Kg	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.12	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.14	Pintura muro - selador acrílico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
14.2.15	Pintura muro - latex acrílico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:						MEDIÇÃO ATUAL:	R\$ 19.205,81		SALDO A EXECUTAR:		
						Percentual:	6,13%				
						ACUMULADO MEDIDO:	R\$	179.025,24	%	R\$	
						Percentual:	57,14%		42,86	134.259,33	

Engº NEWTON PIACENTINI
 CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
 CREA: 0601315173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Certidão n°: 23716711/2022

Expedição: 26/07/2022, às 16:09:50

Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.002.419/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

P.M. QUADRA

FLS. Nº 01

10

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070444688-82
Data e hora da emissão 25/07/2022 08:48:35
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.002.419

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 37928058

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/07/2022 16:02:00

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.002.419/0001-07

Razão Social: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO

Endereço: R PROFESSOR ARTHUR MADEIRA 233 / VILA CRISTINA / PIRACICABA / SP
/ 13401-396

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2022 a 16/08/2022

Certificação Número: 2022071801231664928306

Informação obtida em 27/07/2022 17:08:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

NÚMERO: 16748/2022

CHAVE: 733e733e



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
CONSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07

CEP: 13401-396

LOGRADOURO: RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 233

BAIRRO: VILA CRISTINA

COMPLEMENTO:

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:

616261 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **16369/2022**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas para o(a) contribuinte acima especificado, consta(m) débito(s) com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, porém encontram-se parcelado(s) e em dia com os pagamentos até a presente data, conforme demonstrativo abaixo, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a).

REF	NATUREZA	ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
11382450	MOBIL	24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2020	31/07/2020	254,08	79,10	174,98	90,55	265,53 PARCELADO
1903064500	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/01/2020	49,90	15,54	34,36	23,30	57,66 PARCELADO
1902787761	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/04/2019	49,90	15,54	34,36	28,47	62,83 PARCELADO
1902816305	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/05/2019	49,90	15,54	34,36	27,57	61,93 PARCELADO
1902844199	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	28/06/2019	49,90	15,54	34,36	26,78	61,14 PARCELADO
1902873547	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/07/2019	49,90	15,54	34,36	26,26	60,62 PARCELADO
1902906315	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/08/2019	49,90	15,54	34,36	25,84	60,20 PARCELADO
1902942762	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/09/2019	49,90	15,54	34,36	25,36	59,72 PARCELADO
1902976984	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	31/10/2019	49,90	15,54	34,36	24,87	59,23 PARCELADO
1903003437	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	29/11/2019	49,90	15,54	34,36	24,47	58,83 PARCELADO
1903033361	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	30/12/2019	49,90	15,54	34,36	24,03	58,39 PARCELADO
1903094559	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	28/02/2020	51,95	16,10	35,85	23,15	59,00 PARCELADO
1902727011	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2019	28/02/2019	49,90	15,54	34,36	29,90	64,26 PARCELADO
1903125588	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	31/03/2020	52,25	16,24	36,01	22,71	58,72 PARCELADO
1903155111	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2020	30/04/2020	52,25	16,24	36,01	22,18	58,19 PARCELADO
1903340942	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2016	31/05/2016	44,00	13,72	30,28	45,35	75,63 PARCELADO
1903340944	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2016	30/06/2016	44,00	13,72	30,28	44,45	74,73 PARCELADO
1903340945	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2016	31/07/2016	44,00	13,72	30,28	43,32	73,60 PARCELADO
1903340947	MOBIL	21 - ISSQN	616261	2016	31/08/2016	44,00	13,72	30,28	42,57	72,85 PARCELADO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

P.M. QUADRA
FLS. Nº 83
28

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
1903340948	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/09/2016	44,00	13,72	30,28	41,70	71,98 PARCELADO
1903340950	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/10/2016	44,00	13,72	30,28	41,07	71,35 PARCELADO
1903340952	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/11/2016	44,00	13,72	30,28	40,61	70,89 PARCELADO
1903340953	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2016	44,00	13,72	30,28	40,09	70,37 PARCELADO
1902758356	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	29/03/2019	49,90	15,54	34,36	29,24	63,60 PARCELADO
1902701923	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/01/2019	47,70	14,84	32,86	29,10	61,96 PARCELADO
11495342	MOBIL 218 - PARCELAMENTO MOBILIARIO	616261	2020	27/10/2020	5.473,75	1.724,15	3.749,60	1.087,38	4.836,98 PARCELADO
1902332980	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/12/2017	46,85	14,56	32,29	36,35	68,64 PARCELADO
1902073091	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	24/02/2017	46,85	14,56	32,29	42,17	74,46 PARCELADO
1902101850	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/03/2017	46,85	14,56	32,29	41,00	73,29 PARCELADO
1902123524	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	28/04/2017	46,85	14,56	32,29	40,40	72,69 PARCELADO
1902152156	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/05/2017	46,85	14,56	32,29	39,75	72,04 PARCELADO
1902173781	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/06/2017	46,85	14,56	32,29	39,27	71,56 PARCELADO
1902201977	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/07/2017	46,85	14,56	32,29	38,59	70,88 PARCELADO
1902230112	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/08/2017	46,85	14,56	32,29	38,38	70,67 PARCELADO
1902255954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/09/2017	46,85	14,56	32,29	37,84	70,13 PARCELADO
1902281935	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/10/2017	46,85	14,56	32,29	37,43	69,72 PARCELADO
1902307820	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/11/2017	46,85	14,56	32,29	37,03	69,32 PARCELADO
1902361354	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/01/2018	46,85	14,56	32,29	35,80	68,09 PARCELADO
1902672583	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/12/2018	47,70	14,84	32,86	29,36	62,22 PARCELADO
1902385821	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/02/2018	47,70	14,84	32,86	35,83	68,69 PARCELADO
1902411383	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/03/2018	47,70	14,84	32,86	35,24	68,10 PARCELADO
1902437750	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/04/2018	47,70	14,84	32,86	34,70	67,56 PARCELADO
1902469410	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/05/2018	47,70	14,84	32,86	34,23	67,09 PARCELADO
1902494314	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/06/2018	47,70	14,84	32,86	33,66	66,52 PARCELADO
1902524541	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/07/2018	47,70	14,84	32,86	32,95	65,81 PARCELADO
1902553363	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/08/2018	47,70	14,84	32,86	31,61	64,47 PARCELADO
1902585587	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/09/2018	47,70	14,84	32,86	31,04	63,90 PARCELADO
1902616258	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/10/2018	47,70	14,84	32,86	30,62	63,48 PARCELADO
1902645290	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/11/2018	47,70	14,84	32,86	30,02	62,88 PARCELADO
1903340954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2017	44,00	13,72	30,28	34,09	64,37 PARCELADO
					8.013,68	2.514,59	5.499,09	2.787,68	8.286,77

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

VALIDADE:Esta certidão é válida até **24/08/2022**.

PIRACICABA - SP, 26 DE MAIO DE 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:04:32 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **0C8B.F3AA.2B7F.CDEC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/07/2022 - 13:49:56

P.M. QUADRA
FLS. Nº 33

ESD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO				02-DDD/TELEFONE (0019)34252812
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.284,40	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.002.419/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 902,75	14-ENCARGOS 50,28	15-TOTAL A RECOLHER 953,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/07/2022

85810000099 530301802207 720666204810 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/07/2022 - 13:49:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO				02-DDD/TELEFONE (0019)34252812
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.284,40	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.002.419/0001-07	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 902,75	14-ENCARGOS 50,28	15-TOTAL A RECOLHER 953,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/07/2022

85810000099 530301802207 720666204810 100241900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 19/07/2022 - 21h19

Nº de controle: 544.032.786.450.606.480 | Autenticação bancária: 076.684.086

P.M. QUADRA

FLS. Nº 34

Conta de débito: **Agência: 912 | Conta: 250053-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO | CNPJ: 11.002.419/0001-07**Código de barras: **85810000009-9 53030180220-7 72066620481-0 10024190001-4**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA : **811002419**CNPJ/CEI: **11.002.419/0001-07**Cod. convênio: **0180**Competência: **06/2022**Data de validade: **20/07/2022**Data de débito: **19/07/2022**Valor do pagamento: **R\$ 953,03**A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO , junto à Agência 912, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

QjFSNtSE zoM344Wx MirOgNfG 8Fcct*q4 NHkFffIK mtJnpSen 9K2hOkLe gh9H2MyT
4MGZnzjT RRbh54w5 OLYjy5RM GIiyM5CD 2xqyH2oo 9fuX2Ctr ihPQjTzm #qj*zC9u
k#Sv4KyA i*hcGuhh yMyFzMke Y?Lz#ayr 3Q#nO3b3 KmQWYvrK 00501922 00930053

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9090Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IPJ: 11.002.419/0001-07
Folha Mensal
Competência: 06/2022

Emissão: 01/07/2022
Horas: 13:34:41

P.M. QUADRA
FLS. Nº 35
26

EXTRATO MENSAL

Serviço: 5 - Prefeitura Municipal de Quadra - CNO: 900094721774 - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36, JARDIM SANTO ANTONIO, QUADRA/SP, CEP 18.255-800

Empregado: 6 AILTON SEBASTIÃO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 021.108.084-54 Adm: 20/09/2021
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 MESTRE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1 HORAS NORMAIS	36,67	666,67 P	998	I.N.S.S.	9,90	66,03 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	30,96 D			
0 Proventos:	666,99	Descontos:	96,99	Informativa:	53,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	570,00
0 Base INSS:	666,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	666,67	Valor FGTS:	53,33	Base IRRF:	600,64

Data de pagamento: 05/10/2022

Assinatura

Empregado: 13 FABIANO FERREIRA DE ATAYDE Situação: Trabalhando CPF: 373.260.368-70 Adm: 14/03/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.669,80

1 HORAS NORMAIS	36,67	278,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	22,02 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,05 P							
0 Proventos:	278,35	Descontos:	22,02	Informativa:	22,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	256,33
0 Base INSS:	278,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	278,30	Valor FGTS:	22,26	Base IRRF:	256,28

Data de pagamento: 05/10/2022

Assinatura

Empregado: 11 GERALDO JOSE DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 154.736.488-27 Adm: 10/02/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS	36,67	338,55 P	998	I.N.S.S.	8,10	27,44 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P							
0 Proventos:	338,77	Descontos:	27,44	Informativa:	27,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	311,33
0 Base INSS:	338,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	338,55	Valor FGTS:	27,08	Base IRRF:	311,11

Data de pagamento: 05/10/2022

Assinatura

Empregado: 12 JOSE RONALDO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 191.733.308-09 Adm: 10/02/2022
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS	36,67	338,55 P	998	I.N.S.S.	8,10	27,44 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P							
0 Proventos:	338,77	Descontos:	27,44	Informativa:	27,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	311,33
0 Base INSS:	338,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	338,55	Valor FGTS:	27,08	Base IRRF:	311,11

Data de pagamento: 05/10/2022

Assinatura

P.M. QUADRA
FLS. N° 86

EXTRATO MENSAL

Empregador: 9 MIGUEL CARLOS Situação: Trabalhando CPF: 184.283.538-67 Adm: 25/01/2022
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00
 Função: 4 SERVENTE DE OBRAS C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.552,00

1 HORAS NORMAIS 36,67 258,67 P 998 I.N.S.S. 7,83 20,25 D
 992 TROCO DO MES 0,00 0,25 P

0 Proventos: 258,92 Descontos: 20,25 Informativa: 20,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 238,67
 0 Base INSS: 258,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 258,67 Valor FGTS: 20,69 Base IRRF: 238,42

Data de pagamento: 05/07/22

Miguel Carlos
Assinatura

Empregador: 1 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 309.879.878-52 Adm: 01/01/2020
 Cargo: Diretor CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 1.212,00
 Função: 1 TITULAR C.B.O: 141305 Filial: 1 Salário: 1.212,00

100 PRO-LABORE 117,33 646,40 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 71,10 D
 862 TROCO DO MES EMPREGADOR 0,00 0,70 P

0 Proventos: 647,10 Descontos: 71,10 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 576,00
 0 Base INSS: 646,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 575,30

Data de pagamento: 05/07/22

Elisângela Silva
Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS 183,35 1.880,74 P 843 INSS EMPREGADOR 11,00 71,10 D
 100 PRO-LABORE 117,33 646,40 P 998 I.N.S.S. 41,84 163,18 D
 862 TROCO DO MES EMPREGADOR 0,00 0,70 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 30,96 D
 992 TROCO DO MES 0,00 1,06 P

Líquido Serviço: 2.263,66

Situações

Numero de empregados: 5 Salário contribuição empregados: 1.880,74 Base IRRF Mensal: 2.292,86
 Numero de estagiários: 0 Salário contribuição contribuintes: 646,40 Valor IRRF Mensal: 30,96
 Trabalho: 5 Excedente: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 Afastamento direitos integrais: 0 Base total: 2.527,14 Valor IRRF Férias: 0,00
 Afastamento acidente de trabalho: 0 Segurados: 234,28 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Afastamento serviço militar: 0 Empresa (20,0%): 376,14 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 Salário maternidade: 0 RAT (3,0000%): 56,43 Base IRRF Exterior: 0,00
 Salário maternidade INSS: 0 Contribuintes (20,0%): 129,28 Valor IRRF Exterior: 0,00
 Pensão: 0 Sub-Total: 796,13 Base IRRF 13º Salário: 0,00
 Pensão Profissional: 0 Retenções: 0,00 Valor IRRF 13º Salário: 0,00
 Pensão sem vencimento: 0 (-) Salário família/maternidade: 0,00 Valor Total do IRRF: 30,96
 Pensão concedido: 0 Compensações: 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00
 Pensão transferido: 0 Valores pagos a Cooperativas: 0,00 IRRF contribuintes: 0,00
 Pensão férias: 0 Outras Compensações: 0,00 Base do FGTS: 1.880,74
 Pensão mandato sindical: 0 Total: 796,13 Valor do FGTS: 150,44
 Pensão aposentadoria: 0 Terceiros (0%): 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Pensão partic. curso/programa de qualificação: 0 Total INSS: 796,13 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
 Pensão ausência justificada: 0 Base FGTS - GRRF: 0,00
 Pensão outros motivos de afastamento: 0 FGTS - GRRF: 0,00
 Pensão demissões: 0 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 Pensão numero de contribuintes: 1 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

Líquido Serviço: 2.263,66

petência:

P.M. QUADRA

FLS. Nº 17

EXD

EXTRATO MENSAL

P.M. QUADRA
FLS. N° 18


210

SANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO M
J: 11.002.419/0001-07 CC: ELISANGELA APARECIDA Mensalista
Folha Mensal
Junho de 2022

cargo Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
6 AILTON SEBASTIÃO DA SILVA 710205 2 1
MESTRE OBRAS Admissão: 20/09/2021

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00		
92	TROCO DO MES	0,00	1,94		
98	I.N.S.S.	9,90		396,17	
00	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.001,94	581,94	
			Valor Líquido →	3.420,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO M
 J: 11.002.419/0001-07 CC: ELISANGELA APARECIDA Mensalista
 Folha Mensal
 Junho de 2022

Nome do Funcionário: FABIANO FERREIRA DE ATAYDE
 CBO: 717020 Departamento: 5 Filial: 1
 Admissão: 14/03/2022

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.669,80		
12	TROCO DO MES	0,00	0,30		
18	I.N.S.S.	7,91		132,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,10	132,10	
			Valor Líquido →	1.538,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.669,80	1.669,80	1.669,80	133,58	1.537,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Fabiano Ferreira de Atayde

ES

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO M
CNPJ: 11.002.419/0001-07 CC: ELISANGELA APARECIDA
Mensalista Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
11	GERALDO JOSE DE CARVALHO PEDREIRO	715210	5	1
		Admissão:	10/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.031,30		
992	TROCO DO MES	0,00	1,33		
998	I.N.S.S.	8,10		164,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.032,63	164,63	
			Valor Líquido →	1.868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.031,30	2.031,30	2.031,30	162,50	1.866,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Gerardo Jose de Carvalho
 Data
 31/06

P.M. QUADRA
 FLS. N° 23
588

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO M
 CNPJ: 11.002.419/0001-07
 CC: ELISANGELA APARECIDA Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2022

Código 12 Nome do Funcionário JOSE RONALDO SILVA PEDREIRO
 CBO 715210 Departamento 5 Físcal 1
 Admissão: 10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.031,30			
992	TROCO DO MES	0,00	1,33			
998	I.N.S.S.	8,10		164,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.032,63	164,63		
			Valor Líquido ⇒	1.868,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.031,30		2.031,30	2.031,30	162,50	1.866,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

5/7/22

Data



DIÁRIO DE OBRA

DADOS	
CLIENTE	PREF. QUADRA
OBRA	CRAS
LOCAL	R. JULIO PRESTE, 590
DATA	23/06 a 26/06/2022

TEMPOS EQUIPE

PERÍODO				EQUIPES			
MANHÃ		TARDE					
	CHUVA		CHUVA		ENCARREGADO		
X	SOL	X	SOL		CARPINTEIRO	03	PEDREIRO
					FERREIRO	01	SERVENTE
					ELETRICISTA		ENCANADOR
					MESTRE	01	ENGS

REGISTROS

	Serviços
01	Chapisco PAREDES EXTERNA E INTERNA.
02	Desengrosso desumprido Externo e Interno
03	Abertura para caixa Esgoto
04	FABRICAÇÃO caixa Esgoto (60x60cm)

HORÁRIO DE TRABALHO E TOTAL DE HORAS TRABALHADAS

HORÁRIO DE TRABALHO				HORAS TRABALHADAS			
JAS	7:00	ÀS	11:00hs	ENCARREGADO			PEDREIRO
DAS	12:00	ÀS	17:00hs	CARPINTEIRO			SERVENTE
				FERREIRO			ENCANADOR
				ELETRICISTA			
				MESTRE			

FOTOS DO DIA E OBSERVAÇÕES

P.M. QUADRA
FLS. N° _____

PREENCHIDO POR

NOME	ENGO: NEWTON PIACENTINI	DATA	27/06/2022
------	-------------------------	------	------------

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109 ,

Seu arquivo KXZZmto3VoD00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2022 às 13:53:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBBD182005A6ACC7..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109
Inscrição Transmissor: 12.020.953/0001-09

Responsável: ESCRITORIO SANTA TERESINHA
Inscrição Responsável: 12.020.953/0001-09
Competência: 06/2022
NRA: KXZZmto3VoD00006
Base de Processamento: CP - Piracicaba
Código de Recolhimento: 155
Contato: IVAN ANGELOCCI
Telefone: 001934252812

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000097 027501802209 707666200817 100241900014

EMPRESA: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO
 COMP: 06/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA Nº DE CONTROLE: Nbpufjklawy0000-4
 INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900094721774
 LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233 BAIRRO: VILA CRISTINA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: PIRACICABA UF: SP CEP: 13401-396 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	1.880,74	0,00	1.880,74	0,00
11	1	646,40	0,00	646,40	0,00
TOTAIS:	6	2.527,14	0,00	2.527,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

FLS. Nº 26EST

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 03/08/2022 13:50

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: Assunto: Nome do Requerente: Endereço/Bairro: Cidade: Telefone/Celular:	1177 Ano: 2022 5ª MEDIÇÃO ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA PIRACICABA (19) 3436-1700 /	Data/Hora : 03/08/2022 13:50 CEP: 13401-396
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07
Documento: Assunto: Justificativa: Descrição:	Medições - 21 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
Data Vencimento: Código Contábil:	03/08/2022 2	Valor: 0,00 Usuário: luciana REQUERENTE
0011772022		Autenticação Mecânica ou Recebimento



Prefeitura Municipal de Quadra
P.M. QUADRA "Capital do Milho Branco"
FLS. N° 2
FO **Paço Municipal José Darci Soares**

Processo nº.: 1177/2022 – de: 03/08/2022

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONTRUÇÃO

Ref.: 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DO CRAS

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 03 DE AGOSTO DE 2022.

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
FLS. N° 23 *50* "Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PROC. 1177/2022

INTERESSADO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

REF: 5ª MEDILÇÃO

A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ EXPEDIU PARECER FAVORÁVEL A 5ª MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA ELISANJELA AP.Ç DOS S. CONSTRUÇÃO, PARECER ESTE ENCARTADO NO PROC. 1147/2022 ENCAMINHADO A DIRETORIA FINANCEIRA EM 03/08/2022.

ASSIM, ENCAMINHAR O PRESENTE PARA A DIRETORIA FINANCEIRA.

QUADRA, 05/08/2022

Rui Carlos Baiardi
Ass: Planej. Obras e Serv. Público
CREA: 060041913-5

*Fazer Anexos
ao Protocolo
1147/2022*
