

  			Relatório nº	1	
			Data do relatório	01/08/2023 - 01/09/2023	
			Dia da semana	Terça-Feira até Sexta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	188/2023	
Obra	Melhorias Viárias e Construção de Acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com Prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki		Prazo contratual	92 dias	
Local	Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki		Prazo decorrido	32 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Eng ^a Ana Patrícia A. de Castro (Fiscalização) e Eng. José Luiz Gazotti (Execução)	Prazo a vencer	60 dias

Ocorrências (1)

A obra "Melhorias Viárias e Construção de Acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com Prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki" teve a ordem de serviço entregue em cerimônia no dia 08/08/2023.

Na semana do dia 21/08/23, iniciou-se a limpeza da área do canteiro centro da via Luís Varga e instalação das tubulações de drenagem nesse ponto.

Na semana do dia 28/08/23 foi executada a rede de drenagem do canteiro central, composta pela tubulação e poço de visita (PV). Já foi realizada abertura de vala para execução de boca de lobo (BL).

No dia 01/09/23 está sendo executada a boca de lobo localizada no canteiro central na via Luiz Varga. Container e banheiro químico já em obra.

Ana Patrícia Aranha de Castro
Fiscal da Obra
CREA SP 5069209518

Parecer técnico

Comentários (1)

Jaqueline 22/08/2023 11:55
Valor total da obra: R\$ 2.361.957,70

Objeto da Obra:

Melhorias viárias e construção de acesso à Rua General Rondon com Manoel de Queirós, com prolongamento da Rua José Francisco Roland - Vila Labaki.

Estudos Técnicos:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070

Finalidade da Obra:

Melhorias nas condições e facilidade de acesso ao bairro, reduzindo situações de congestionamento e risco de acidentes, garantindo melhores condições de tráfego e segurança aos usuários das vias locais e do anel viário.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários das vias locais e anel viário.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Tomada de Preço nº 07/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 188/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

Romaréllo Terraplenagem e Construções Ltda - CNPJ: 08.743.495/0001-50.

Fotos (24)



24 de maio de 2023 14:41

Vista original do acesso à rua Manoel Queirós.



24 de maio de 2023 14:42

Vista original do acesso à rua General Rondon.



24 de maio de 2023 14:42

Vista original do acesso à rua General Rondon, com destaque para passagem com aduela por baixo da via.



24 de maio de 2023 14:42

Vista original do acesso da Via Luís Varga com rua General Rondon.



24 de maio de 2023 14:48

Vista original do acesso da Via Luís Varga com rua General Rondon.



24 de maio de 2023 14:51

Vista original do acesso à Via Luís Varga a partir da rua General Rondon.



Início da limpeza da área do canteiro central.



Escavação no canteiro central para instalação da rede de drenagem.



Escavação no canteiro central para instalação da rede de drenagem.



Escavação no canteiro central para instalação da rede de drenagem.



Instalação da rede de drenagem.



Instalação da rede de drenagem.



Execução de poço de visita (PV).



Execução de poço de visita (PV).



Execução de poço de visita (PV).



Abertura de vala para execução de boca de lobo (BL).



Execução de poço de visita (PV).




Execução de poço de visita (PV).



Abertura de vala para execução de boca de lobo (BL).



Locação da alça de retorno no canteiro central.

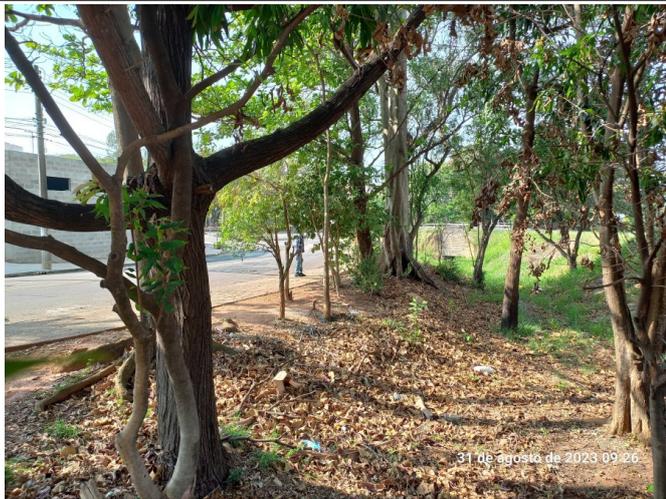

Área de interferência na execução da rede de drenagem com aduela.



Finalização de PV.



Finalização de PV.



Execução de Boca de Lobo (BL).
