

				Relatório nº	4
				Data do relatório	14/11/2023 - 27/12/2023
				Dia da semana	Terça-Feira até Quarta-Feira
Relatório de Obra				Contrato	72/2023
Obra	Reforma do Ambulatório de Saúde Mental Visando a Implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III			Prazo contratual	213 dias
Local	Av. Ana Carolina de Barros Levi, 650 - Centro			Prazo decorrido	213 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engª Ana Patrícia Aranha de Castro (Fiscalização) e Sr. Danilo Rodrigues Maluf (Execução)	Prazo a vencer	-42 dias

Ocorrências (1)

No dia 17/11/2023 foi dado início à pintura da fachada frontal.
 Na semana do dia 20/11/2023 está sendo executada a instalação hidráulica de água fria e de esgotamento sanitário.
 Na semana do dia 27/11/2023 será executado o granilite da área da farmácia e continua sendo realizada a instalação da rede hidráulica e a pintura da fachada.
 Na semana do dia 18/12/2023 está sendo executada a instalação hidráulica dos sanitários, a pintura da fachada e das esquadrias metálicas, o granilite das áreas que ainda não haviam sido feitas e a concretagem da área no fundo.
 No dia 19/12/2023 foi executado o granilite na área da farmácia.
 No dia 21/12/2023 está sendo realizada a recuperação da estrutura de aço danificada com posterior pintura.
 Na semana do dia 25/12/2023 está sendo executado o pergolado, a pintura da fachada e a instalação hidráulica dos sanitários.

Ana Patrícia Aranha de Castro
 Engenheira Civil
 CREA/SP: 5069209518

Parecer técnico

Comentários (1)

Ana Patrícia Aranha de Castro 26/09/2023 15:10
 Valor total da obra: R\$ 1.070.000,00

Objeto da Obra:
 Reforma do ambulatório de saúde mental, visando a implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III.

Estudos Técnicos:
 Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
 Secretaria Municipal de Saúde - Dotação nº 14.03.00 - 4.4.90.39.00 - 10 302 1001 1090.

Finalidade da Obra:
 Necessidade de reforma no atual prédio do Ambulatório de Saúde Mental, visando a implantação de novo serviço de Saúde Mental - Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - em composição à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) destinado à municípios com população acima de 200.000 habitantes.

Agentes Participantes:
 Prefeitura Municipal de Limeira.

Público Alvo:
 Usuários do serviço de saúde e CAPS.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
 Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
 Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
 Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
 Contrato nº 72/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
 Bramer Construtora e Paisagismo Ltda - CNPJ: 23.610.910/001-91.

Fotos (36)



Polimento do granilite no pavimento superior.



Demolição do contrapiso para execução da instalação hidráulica de esgoto predial.



Execução da instalação hidráulica de esgoto predial.



Execução da instalação hidráulica de esgoto predial.



Execução da instalação hidráulica de esgoto predial.



Execução do revestimento cerâmico.



Execução do revestimento cerâmico.



Execução do revestimento cerâmico.




Início da pintura da fachada frontal.



Início da pintura da fachada frontal.



Início da pintura da fachada frontal.

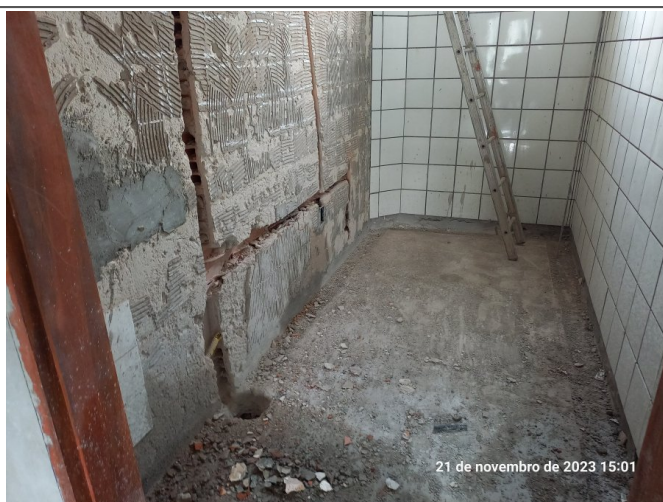

Execução da instalação hidráulica de água fria e de esgoto.



Execução da instalação hidráulica de água fria e de esgoto.



Execução da pintura da fachada.



Execução da pintura da fachada.



Furos na laje para execução da instalação hidráulica de esgotamento sanitário.



Furos na laje para execução da instalação hidráulica de esgotamento sanitário.



Execução de rugosidade para lançamento do granilite.



Execução da pintura da fachada.



Execução da pintura da fachada.



Marcação da junta de dilatação do granilite da área da farmácia.



Marcação da junta de dilatação do granilite da área da farmácia.



Marcação da área de concretagem ao fundo.



Execução da pintura da fachada.



Execução da pintura da fachada.



Execução da massa corrida nas paredes construídas.



Execução da massa corrida nas paredes construídas.



Execução da massa corrida nas paredes construídas.



Início da pintura das esquadrias.



Pintura das esquadrias e fachada.



Execução do granilite na área da farmácia.



Execução do granilite na área da farmácia.



Pintura da fachada de fundo.



Pintura da fachada de fundo.



Execução do pergolado aos fundos.



Pintura da fachada de fundo.

Aprovado 27/12/2023 10:44

Ana Patrícia Aranha de Castro
ana.castro@limeira.sp.gov.br
Engenheira Civil
