

  		Relatório n°	1		
		Data do relatório	19/06/2023 - 25/11/2024		
		Dia da semana	Segunda-Feira até Segunda-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	133/2023		
Obra	Duplicação e recapeamento de trecho da Avenida Araras		Prazo contratual	183 dias	
Local	Entre Rua Teixeira Marques e Via Francisco D'Andréa, Jardim Bela Vista - Limeira/SP		Prazo decorrido	183 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual), Téc. Júlio César Epifânio e Eng. Élio Virgílio Rossit Júnior (Fiscalização) e Eng. Silver Morales Strobl (Execução)	Prazo a vencer	-343 dias

Ocorrências (4)

Na data de 19/06/2023 foi emitida a ordem de serviço a empresa contratada TotalPav Construção e Locação Ltda.

Parecer técnico

Na data de 31/10/2023, em virtude da complexidade do projeto elétrico de remoção e redistribuição dos postes localizados próximo a rede da subestação da concessionária Elektro, a Prefeitura de Limeira através da Secretaria de Obras suspendeu a obra por 90 (Noventa) dias a obra de Duplicação e Recapeamento de trecho na Av. Araras a partir de 01 de Novembro de 2023 conforme ofício nº 2442/2023 referente a suspensão da obra.

Em 27/02/2024 foi autorizado pela Secretaria de Obras a solicitação da empresa contratada TotalPav a prorrogação de prazo de 06 (seis) meses conforme processo administrativo nº 2442/2023.

Obra concluída em 16/11/2024.

Comentários (1)

Jaqueline 24/08/2023 17:05

Valor total da obra: R\$ 1.220.279,50

Objeto da Obra:

Duplicação e recapeamento de trecho da Avenida Araras, entre Rua Teixeira Marques e Via Francisco D'Andréa, Jardim Bela Vista - Limeira/SP.

Estudos Técnicos:

Tomada de Preço nº 03/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação SOSP nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 451 5003 1070.

Finalidade da Obra:

Conclusão do único trecho não duplicado da Avenida Araras, garantindo a eliminação e afunilamento no trânsito, melhorando as condições de escoamento superficial e de tráfego, reduzindo situações de lentidão e possibilidades de acidentes.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

Usuários da via com acesso ao Anel Viário.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preço nº 03/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preço nº 03/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Tomada de Preço nº 03/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 133/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/


Empresa Responsável:

Total Pav Construção e Locação Ltda - CNPJ: 15.019.222/0001-23

Fotos (106)



Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.

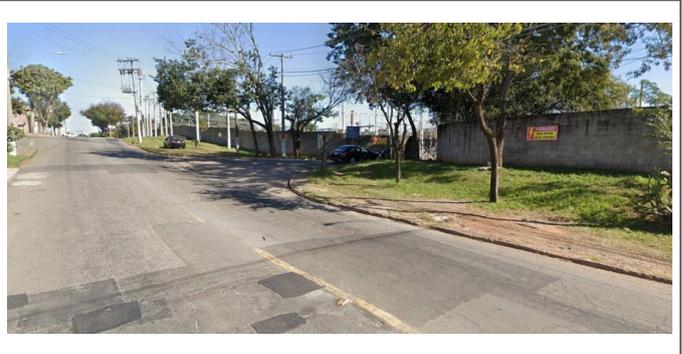

Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Limeira
13 de jun. de 2023 15:10:16



Placa de obra.




Limeira
13 de jun. de 2023 15:13:09

Situação original da Av. Araras antes da obra de duplicação no trecho.



Execução de remoção de árvore.

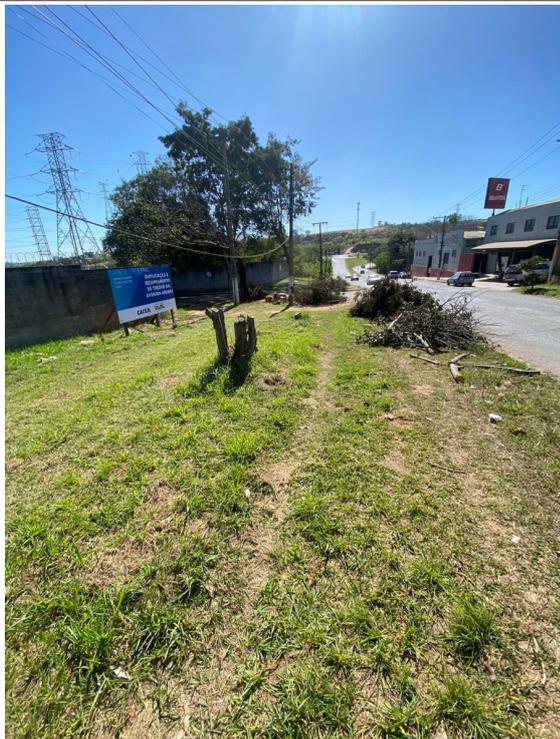

Execução de remoção de árvore.



Escavação de talude.



Escavação de talude.



Escavação de talude.



Locação do muro de arrimo e da calçada.



Armadura de estacas e pilares.



Armadura de estacas e pilares do muro de arrimo



Execução do muro de arrimo.




Execução de Calçada.




Execução de calçada.



Execução de Calçada.

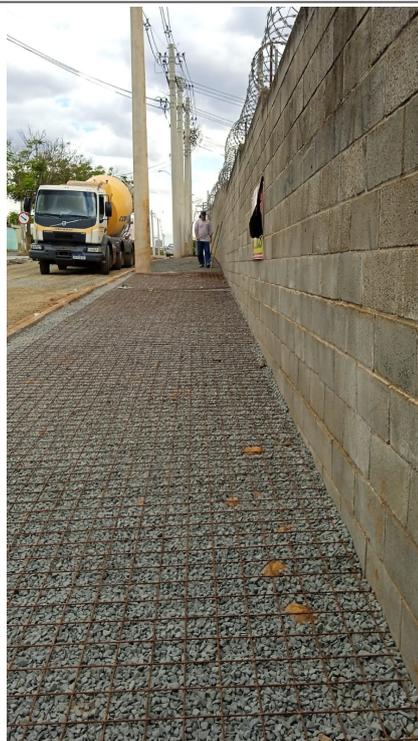

Execução de Calçada. Brita nº 01 e Tela de Aço antes da Concretagem

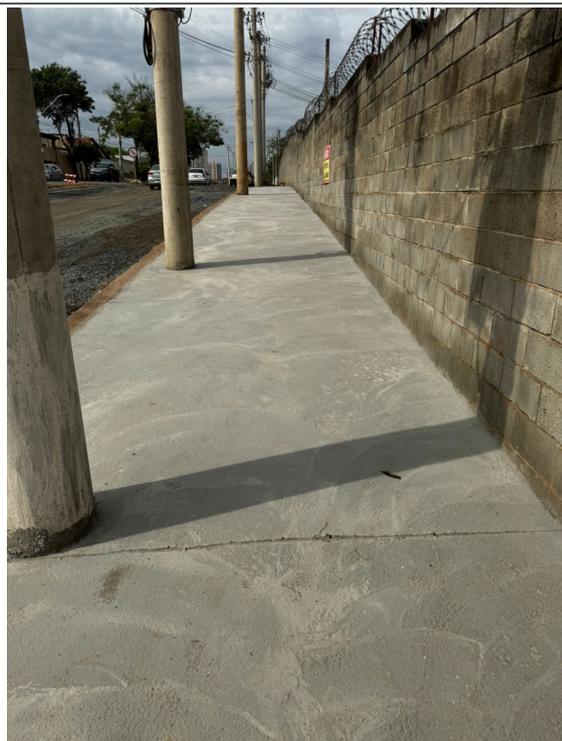

Calçada após concretagem.



Calçada após concretagem.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.




Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.

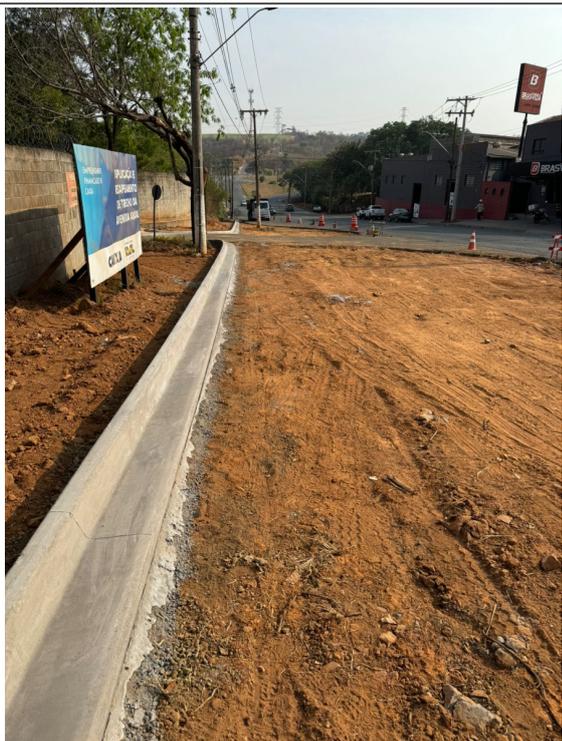

Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.



Execução de guia e sarjeta.



Remanejamento dos Postes.



Remanejamento dos postes.



Remanejamento dos postes.



Remanejamento dos postes.



Remanejamento dos postes.



Remanejamento dos postes.



Remanejamento dos postes.



Erosão em trecho do muro ala existente antes da obra.



Erosão em trecho do muro ala existente antes da obra.



Reconstrução de muro ala.



Reconstrução de muro ala e da calçada.



Execução de boca de leão e boca de lobo.



Execução de boca de leão e boca de lobo.




Execução de boca de leão e boca de lobo.



Execução de boca de leão e boca de lobo.



Execução de boca de leão e boca de lobo.

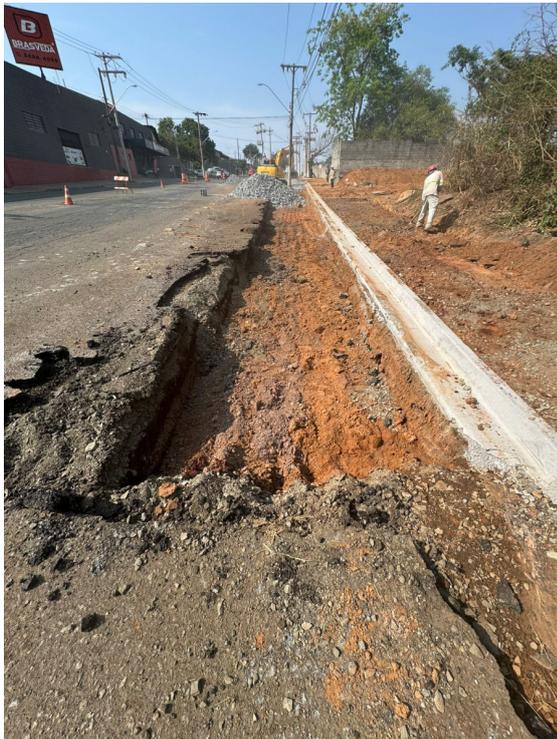

Abertura de caixa para execução de pavimento no trecho.



Abertura de caixa para execução de pavimento no trecho.



Aplicação de camada de macadame no pavimento.




Aplicação de camada de macadame no pavimento.



Aplicação de camada de macadame no pavimento.



Fresagem do asfalto para recapeamento.

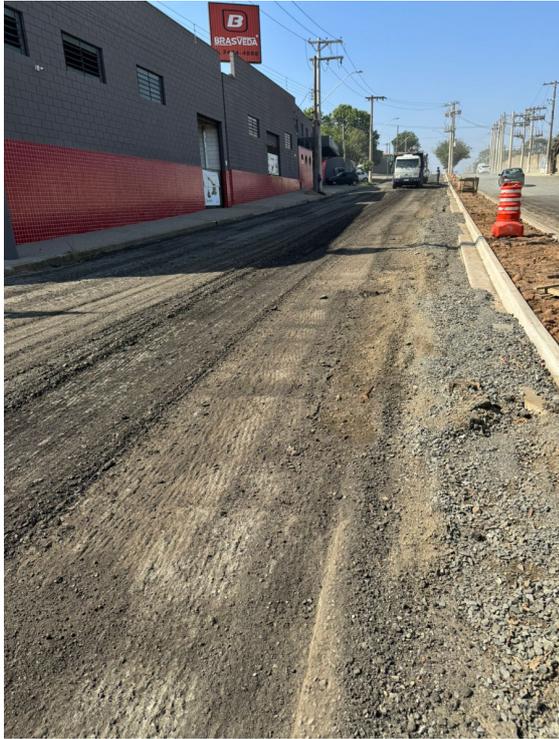

Fresagem do asfalto para recapeamento.



Fresagem do asfalto para recapeamento.



Fresagem do asfalto para recapeamento.



Fresagem do asfalto para recapeamento.



Fresagem do asfalto para recapeamento.



Execução de camada de BGS (Brita Graduada Simples)



Execução de camada de BGS (Brita Graduada Simples)



Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 11:45:08
22,5459S 47,4052W
224° SW
37 Rua José Alves da Vinha
Residencial Chacaras Sao Jose
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 11:49:08
22,5460S 47,4052W
332° NW
37 Rua José Alves da Vinha
Residencial Chacaras Sao Jose
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 12:03:39
22,5466S 47,4055W
132° SE
1255 Avenida Araras
Jardim Santo Andre
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 12:05:28
22,5462S 47,4053W
95° E
1200 Avenida Araras
Chácara São José
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 12:07:18
22,5459S 47,4052W
214° SW
37 Rua José Alves da Vinha
Residencial Chacaras Sao Jose
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



13 de nov. de 2024 12:10:52
22,5466S 47,4053W
259° W
1180 Avenida Araras
Vila da Gloria
Limeira
São Paulo

Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.




Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.




Execução de camada asfáltica.

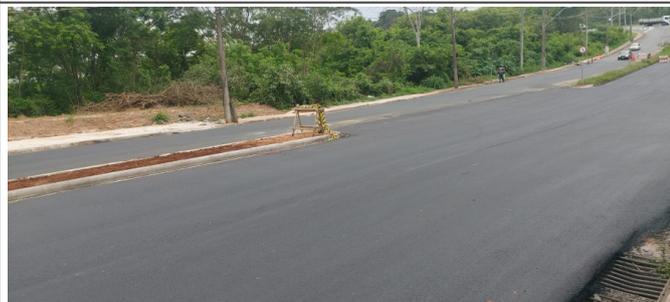

Execução de camada asfáltica.



Execução de camada asfáltica.

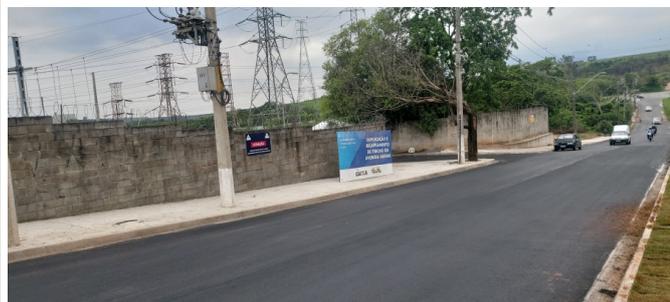

Execução de camada asfáltica.



Plantio de grama em canteiro central.



Plantio de grama em canteiro central.



Plantio de grama em canteiro central.



Plantio de grama em canteiro central.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Execução de sinalização vertical de trânsito.



Execução de sinalização vertical de trânsito.



Execução de sinalização horizontal de trânsito.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.



Obra concluída.

Aprovado 10/12/2024 07:54

Júlio César Epifânio
julio.epifanio@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações

Aprovado 10/12/2024 07:55

Elio Rossit Junior
elio.junior@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil
