


			<b>Relatório n°</b>	<b>6</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>05/06/2023 - 04/07/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Segunda-Feira até Terça-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	05/2023	
<b>Obra</b>	<b>Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local</b>		<b>Prazo contratual</b>	456 dias	
<b>Local</b>	Via Antonio Cruaães Filho		<b>Prazo decorrido</b>	181 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	<b>Prazo a vencer</b>	275 dias

Fotos (9)



Escoramento de vigas no canteiro de obras

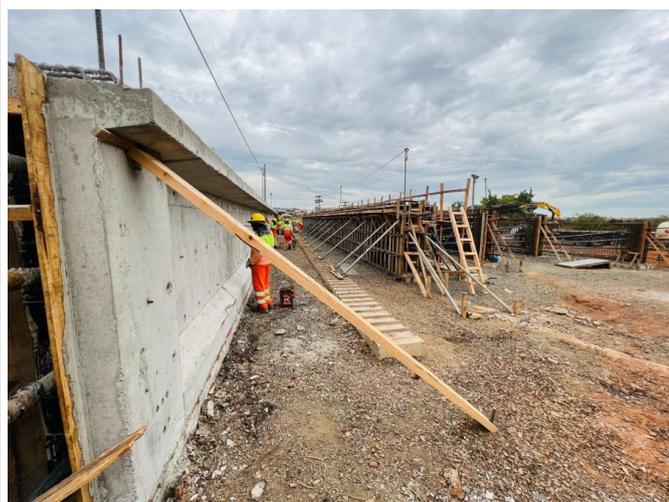

Execução de concreto projetado com chumbadores para proteger execução de noda fundação do novo viaduto



Execução de ramais de drenagem



Dreno para proteger a pavimentação



Estacas raiz



execução de muro gabião



Bombeamento de concreto em vigas longarinas de concreto.



Base para muro 8



Execução do muro 6

Aprovado 15/10/2024 11:35

Nicola Manis  
nicola.manis@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil
