

		Relatório n°	3
		Data do relatório	05/08/2023 - 04/09/2023
		Dia da semana	Sábado até Segunda-Feira
Relatório de Obra		Contrato	111/2023
Obra	Reforma da EMEI Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos	Prazo contratual	122 dias
Local	R. Prof. Fariz Elías, 140 - Jardim Olga Veroni, Limeira/SP	Prazo decorrido	92 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Márcio Liessi (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)
		Prazo a vencer	30 dias

Ocorrências (1)

Serviços executados no período:

- Instalações hidrossanitárias, incluindo colocação de louça, metais e acessórios;
- Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB;
- Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção;
- Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição, passagem de fiação, colocação de luminárias, ventiladores e acabamento;
- Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro; - Regularização de piso de concreto;
- Assentamento de revestimento em paredes e piso, incluindo rodapé;
- Assentamento de pedra ardosia, incluindo rodape, peitoris e soleiras;
- Colocação de guarda corpo e corrimão;
- Execução de pintura geral;
- Execução de teste de estanqueidade em rede de gás.

Engº Civil Marcio Alexandre Liessi

Fotos (38)

Instalações hidrossanitárias, incluindo colocação de louça, metais e acessórios



Instalações hidrossanitárias, incluindo colocação de louça, metais e acessórios



Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB




Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB



Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB




Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB

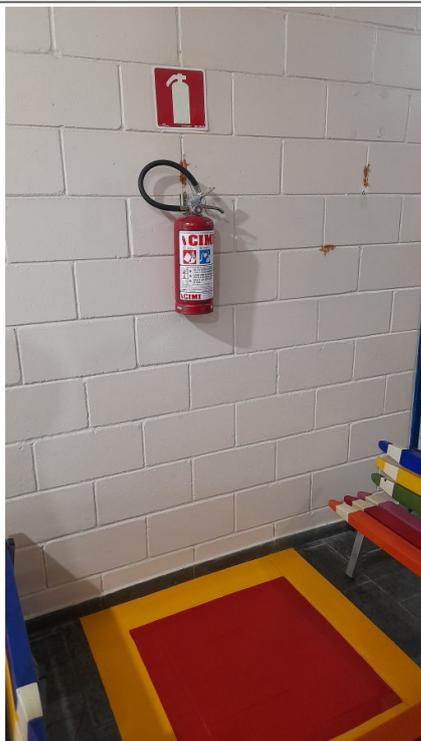

Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB



Execução de sinalização vertical e horizontal para AVCB

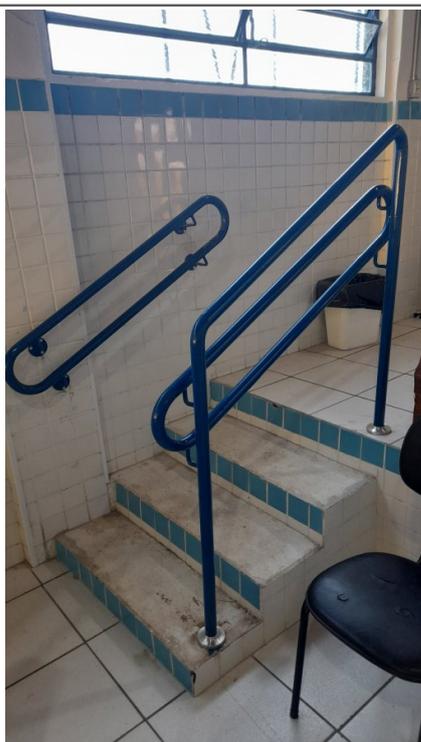

Colocação de guarda corpo e corrimão



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Execução de pintura geral



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Execução de pintura geral



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalações elétricas: montagem de quadros elétricos de distribuição e fiação



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Instalação de esquadrias de madeira e de ferro, incluindo grades de proteção



Execução de pintura geral




Execução de pintura geral



Execução de pintura geral



Assentamento de revestimento em paredes e piso, incluindo rodapé

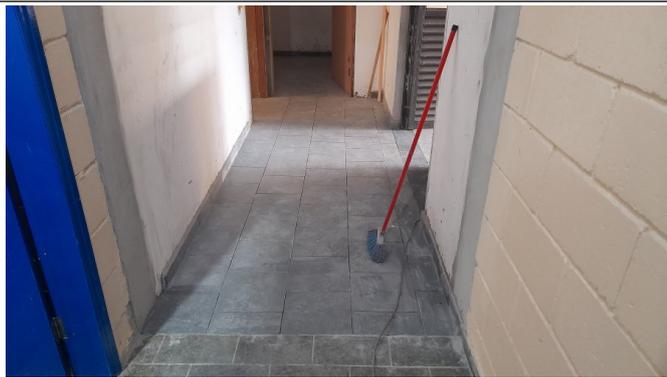

Assentamento de pedra ardosa, incluindo rodape, peitoris e soleiras



Assentamento de revestimento em paredes e piso, incluindo rodapé



Assentamento de pedra ardosa, incluindo rodape, peitoris e soleiras



Assentamento de pedra ardosa, incluindo rodape, peitoris e soleiras
