

11º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

Período 01/11 a 30/11/2023



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO Nº 21.2.0288.1-BNDES.


- **Contrato de Modernização de:** 34.188 luminárias
- **Valor Global do Contrato:** 26.876.761,83
- **Início:** 27/09/2022
- **Término do Contrato:** 26/03/2024

11º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

11º Mês. Período
01/11 a 30/11/2023



AVANÇO CONTRATUAL

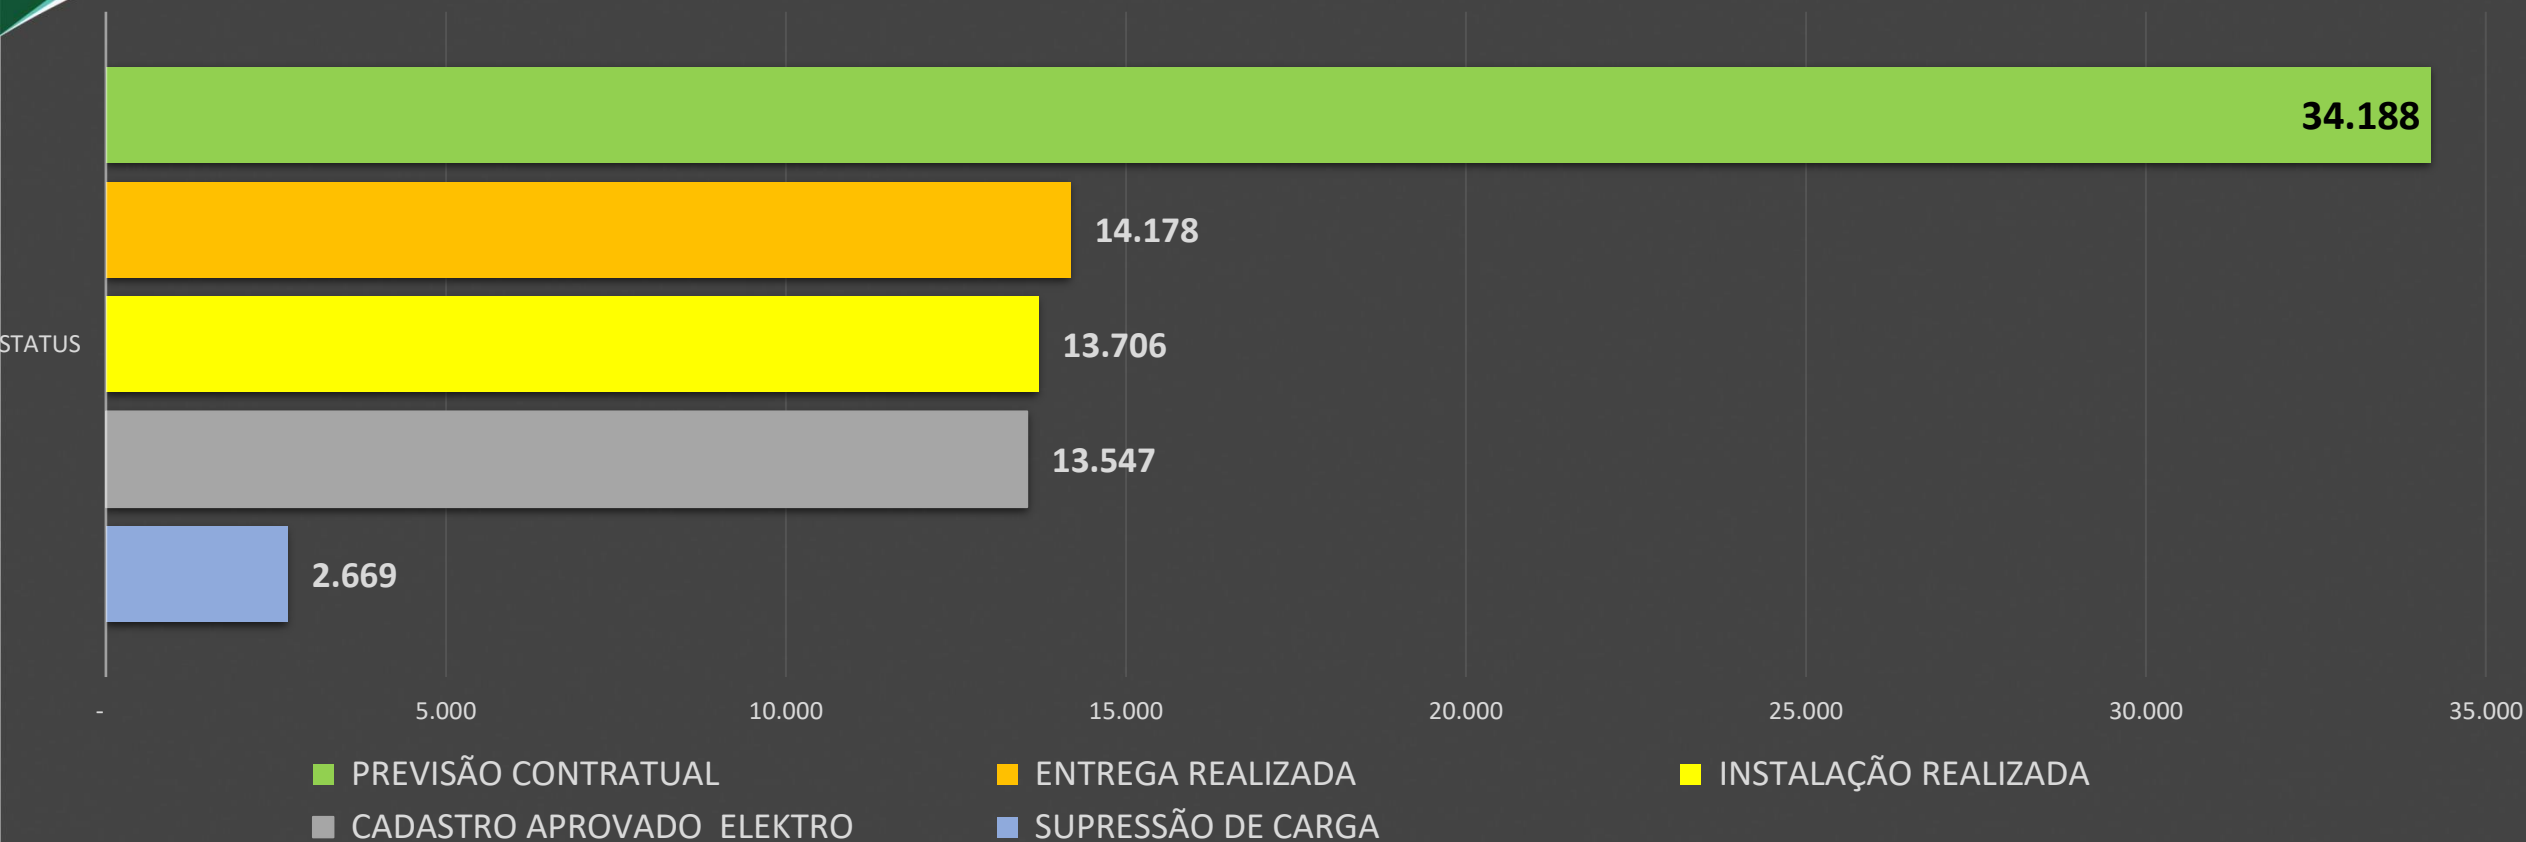


11º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

11º Mês. Período
01/11 a 30/11/2023



ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

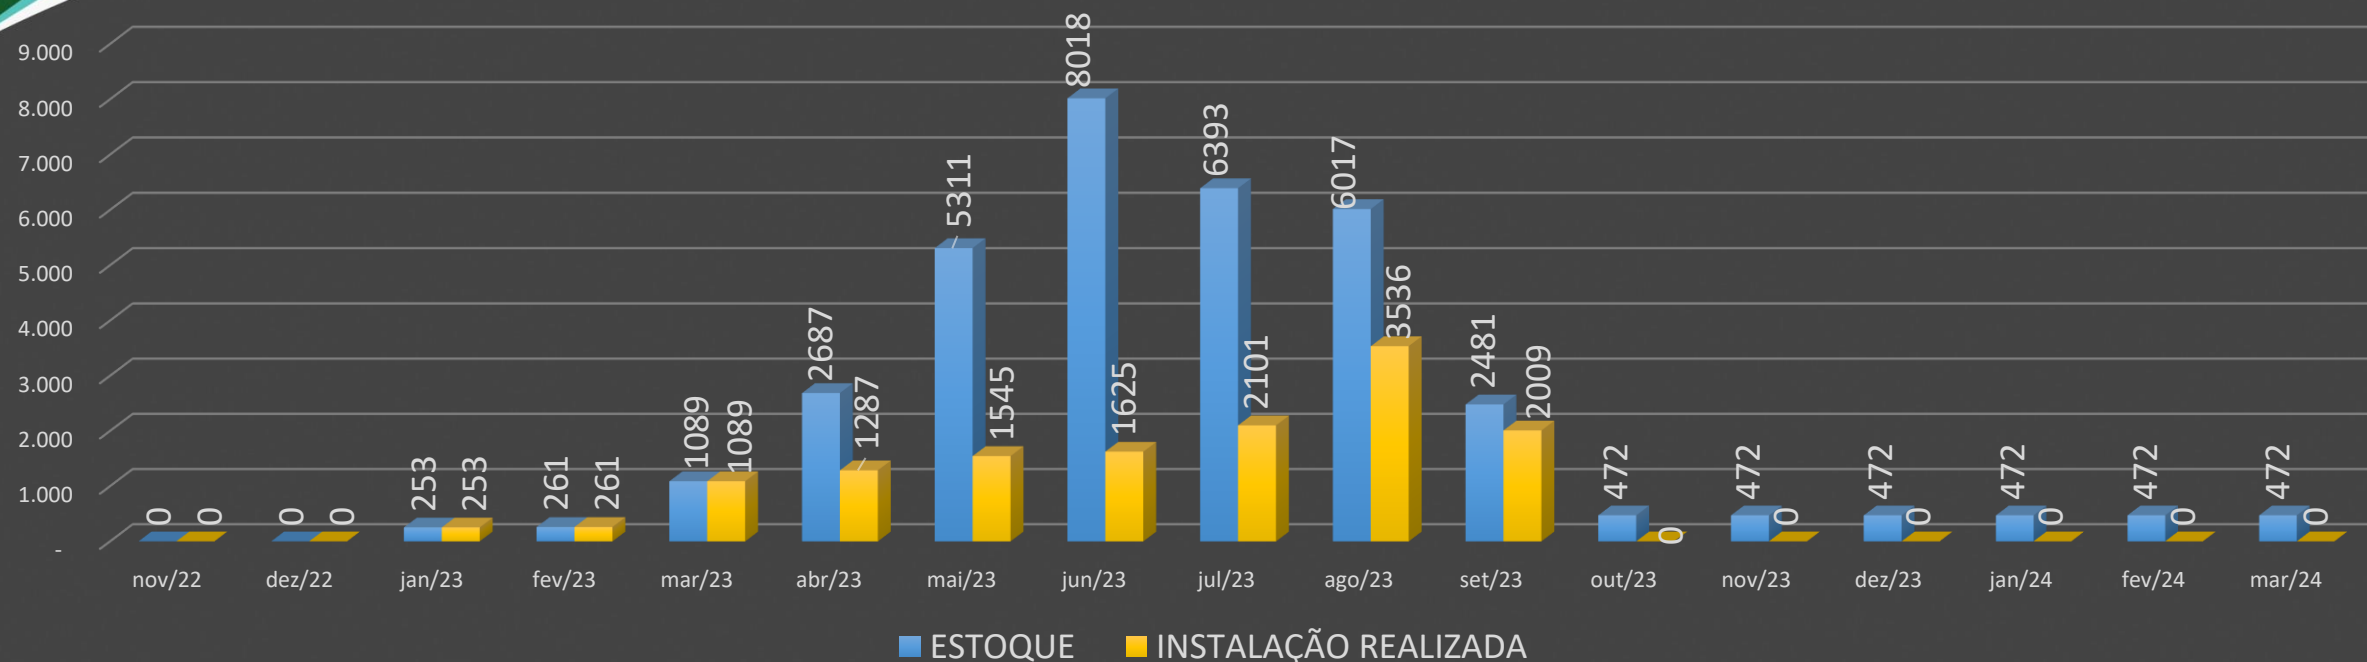

Ponto Positivo:


- Avanço de remoções de cargas dos condomínios fechados.

Pontos Negativos:

- Falta de materiais, paralisação das modernizações.
- Manutenções devido a braços, cabos, conectores deteriorados.

11º BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

11º Mês. Período
01/11 a 30/11/2023



CRÉDITO VERDE LIMEIRA BRASIL BNDES

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos

1 - Total de economia de energia propiciada no mês:	694.753 kWh/ano
---	-----------------

2 - Tempo do projeto:	1 ano
-----------------------	-------

3 - Total de economia Acumulado até o mês:	5.284.957 kWh/ano
--	-------------------

1 - Volume total de carbono capturado no mês:	57,10 tCO2e/ano
---	-----------------

2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o mês:	434,5 tCO2e/ano
--	-----------------

PONTOS RELEVANTES

Problemas no suprimento de insumos impactaram o andamento das modernizações.

Avanço na entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro:

- Recebimento de cartas de aceite da concessionária referente a 685 pontos e carta de ajuste que resultou em 46 pontos -

Obrigado!



Conexão, eficiência e energia.

www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
