



Conexão, eficiência e energia

*Boletim Informativo Mensal – 4ª Mês, Período do
dia 01/04/2023 a 30/04/2023.*



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.


- Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias
- Valor Global do Contrato: 26.876.761,83
- Início:27/09/2022
- Término do Contrato: 26/03/2024






Avanço Contratual.

STATUS CONTRATUAL

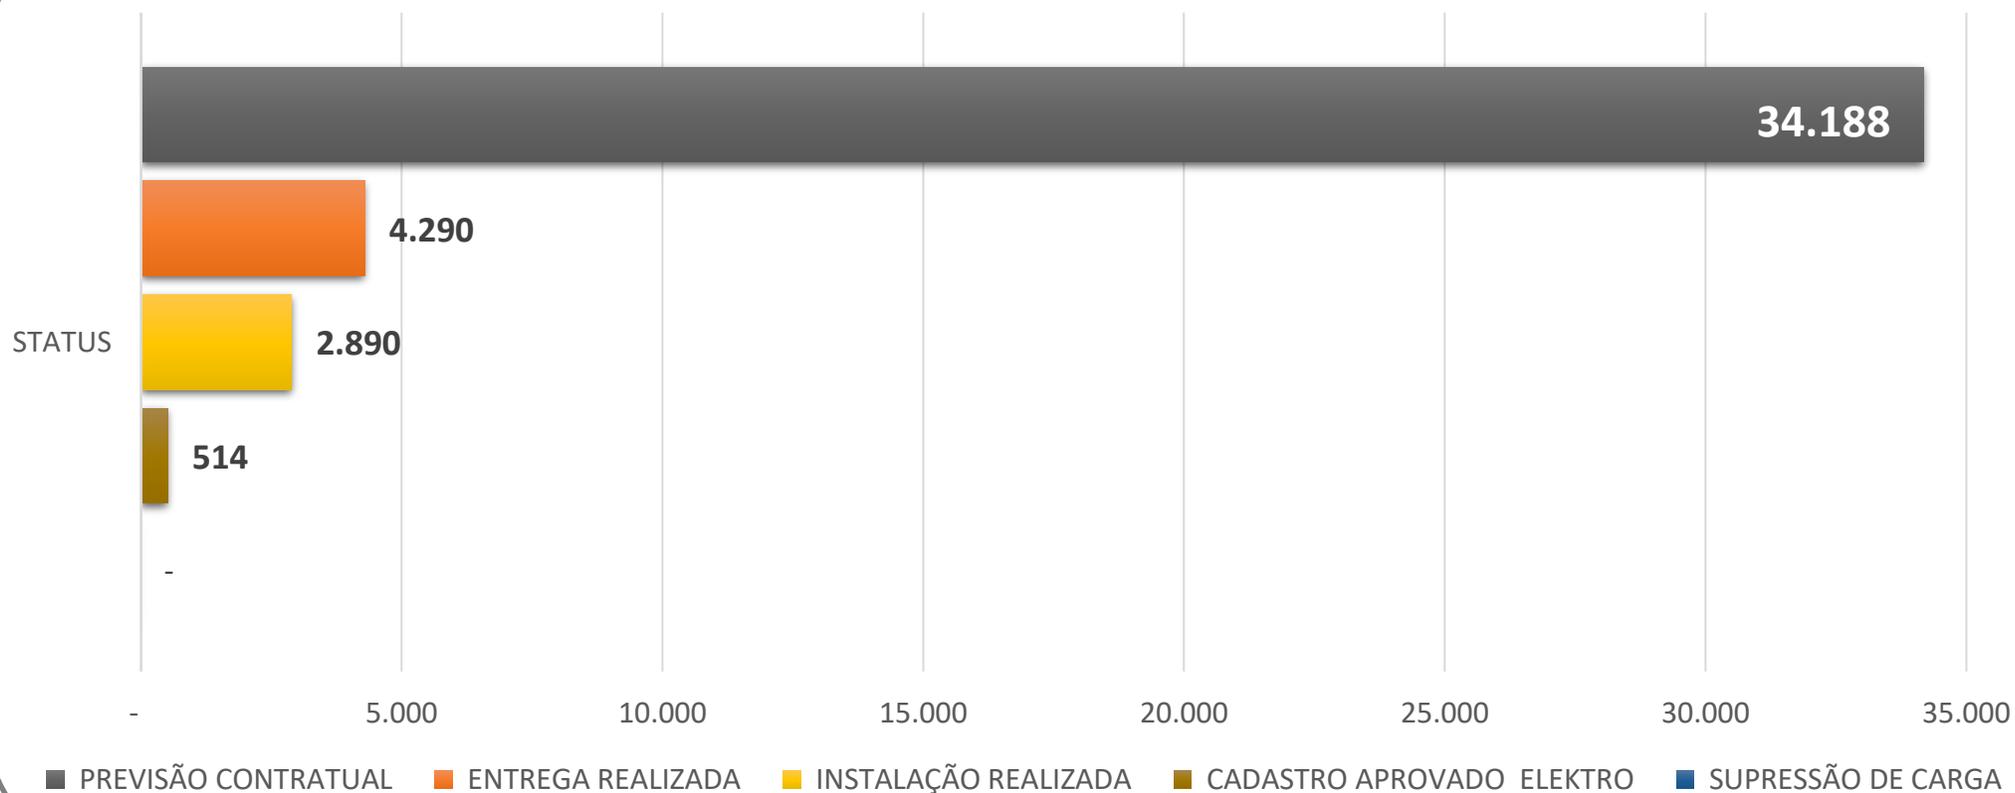



Estoque VS Instalação

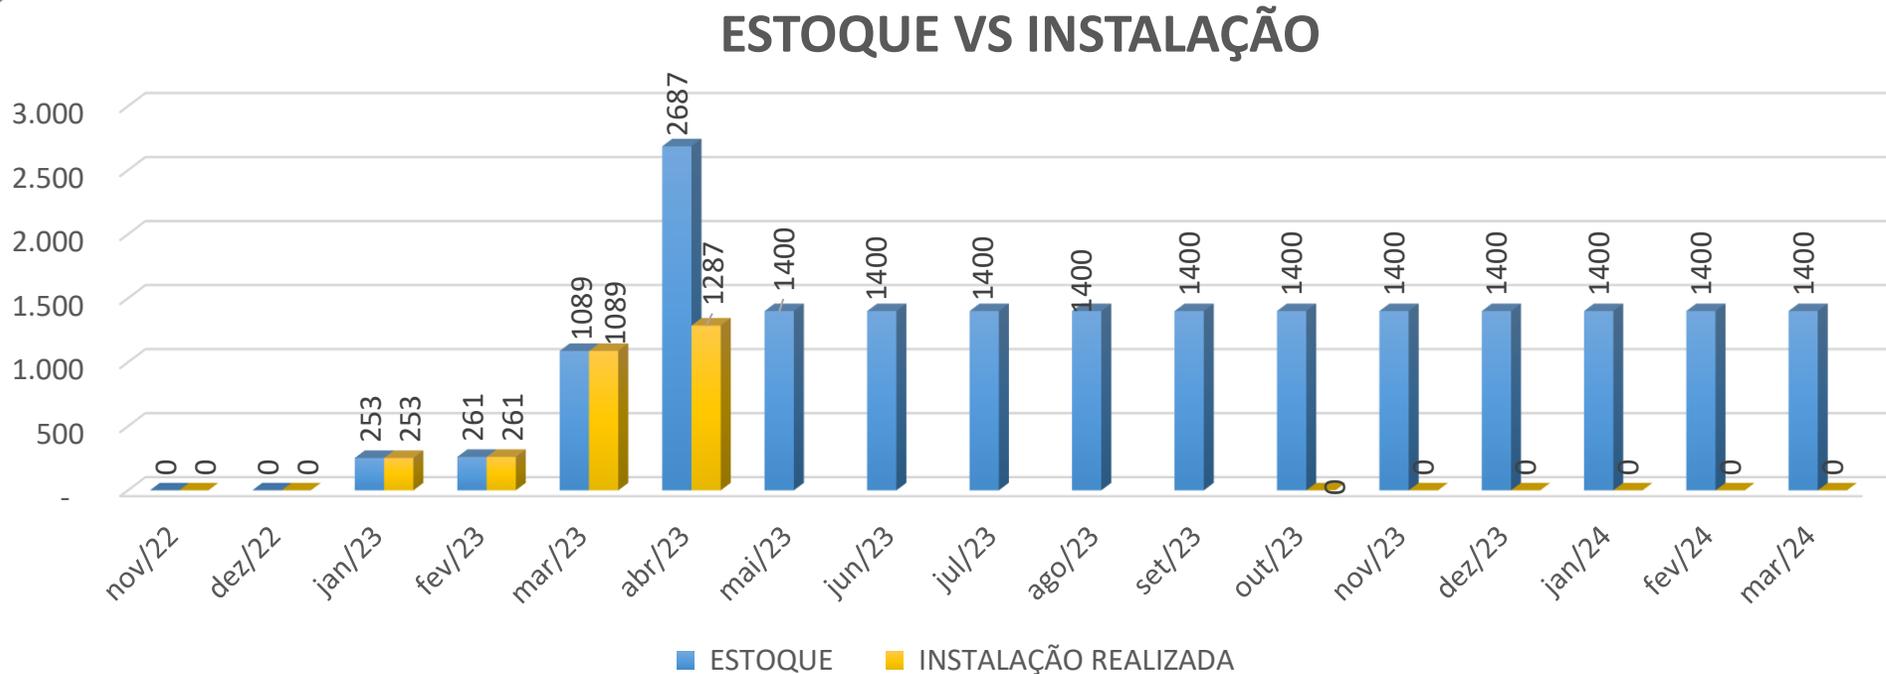

Ponto Positivo:


- Instalação de 1.287 luminárias de Led nos bairros da cidade de Limeira.
- Entrega de 2687 luminárias.

Ponto Negativo:

- Retrabalho de 1.233 luminárias para a empresa Unicoba. Ajuste dos parafusos de fixação.



Crédito Verde Limeira – Brasil BNDES



Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos

1- Total de economia de energia propiciada pelo projeto:	384.841 kWh/ano
2 - Tempo do projeto:	1 anos

Resultados

1 - Volume total de carbono capturado pelo projeto:	31,6 tCO2e
---	------------



Pontos Relevantes

- Condições climáticas instáveis ao longo do mês de abril;
- Cumprimento nas ações do cronograma operacional com o aumento de três equipes operacionais;
- Aguardando a Carta de aceite dos projetos enviados para a concessionária Elektro e previsão de envio de mais 1.287 pontos.
- Pendências de poda em vários locais espalhados pela cidade, comprometendo a logística das equipes operacionais;

Obrigado!



www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
