			Relatório n°	4	
			Data do relatório	05/09/2023 - 04/10/2023	
			Dia da semana	Terça-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	111/2023	
Obra	Reforma da EMEI Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos		Prazo contratual	122 dias	
Local	R. Prof. Fariz Elías, 140 - Jardim Olga Veroni, Limeira/SP		Prazo decorrido	122 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Márcio Liessi (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	0 dias

Ocorrências (1)

Serviços executados no período (medição final):
 - Instalação de bancada em MDF laminado;
 - Limpeza final da obra.

Obs.: Obra finalizada.
 Engº Civil Marcio Alexandre Liessi

Comentários (1)

Márcio Liessi 18/10/2023 08:45

Jaqueline

07/08/2023 12:02

Valor total da obra: R\$ 341.681,82

Objeto da Obra:
 Reforma da EMEI "Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos".

Estudos Técnicos:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Secretaria de Educação - dotação nº 15.02.00 - 4.4.90.51.99 - 12 365 2001 1130.

Finalidade da Obra:

Adequar o prédio para que possa oferecer condições de segurança e sanitárias aos alunos e comunidade escolar, além da expectativa de que após as melhorias, o local possa expandir sua capacidade de atendimento.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira.

Público Alvo:

Alunos e funcionários da unidade de ensino.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preço nº 01/2023- Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 111/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05


Fotos (6)



Instalação de bancada em MDF laminado




Instalação de bancada em MDF laminado

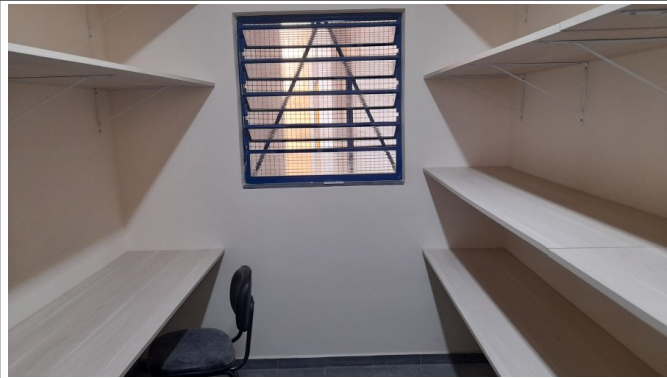

Instalação de bancada em MDF laminado



Limpeza final da obra

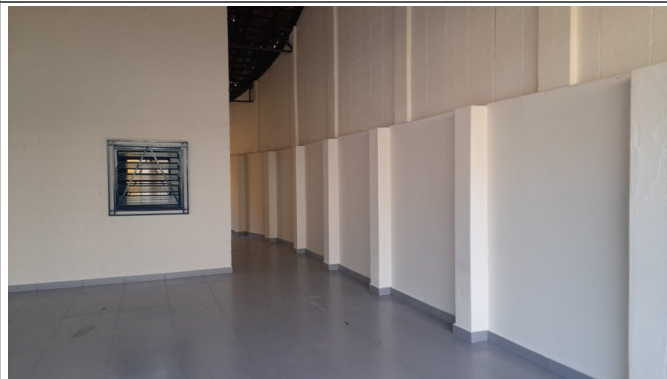

Limpeza final da obra



Limpeza final da obra
