

# RELATÓRIO MENSAL

CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES  
CONTRATO Nº 149/2024 MUNICÍPIO DE  
LIMEIRA



BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

-JANEIRO 2025-



# BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL




JANEIRO 2025

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E ROTATÓRIAS COM MEDIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (CONTRATO 149/2024) – CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES

- Contrato de Modernização das 350 Praças com instalação de postes de Iluminação Pública nas tipologias 4 metros (1080 postes), 6 metros (710 postes) e 8 metros (340 postes), totalizando 2130 postes.
- Valor Global do Contrato: R\$ 10.817.649,91
- Início: 01/10/2024
- Término do Contrato: 30/06/2025

# ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

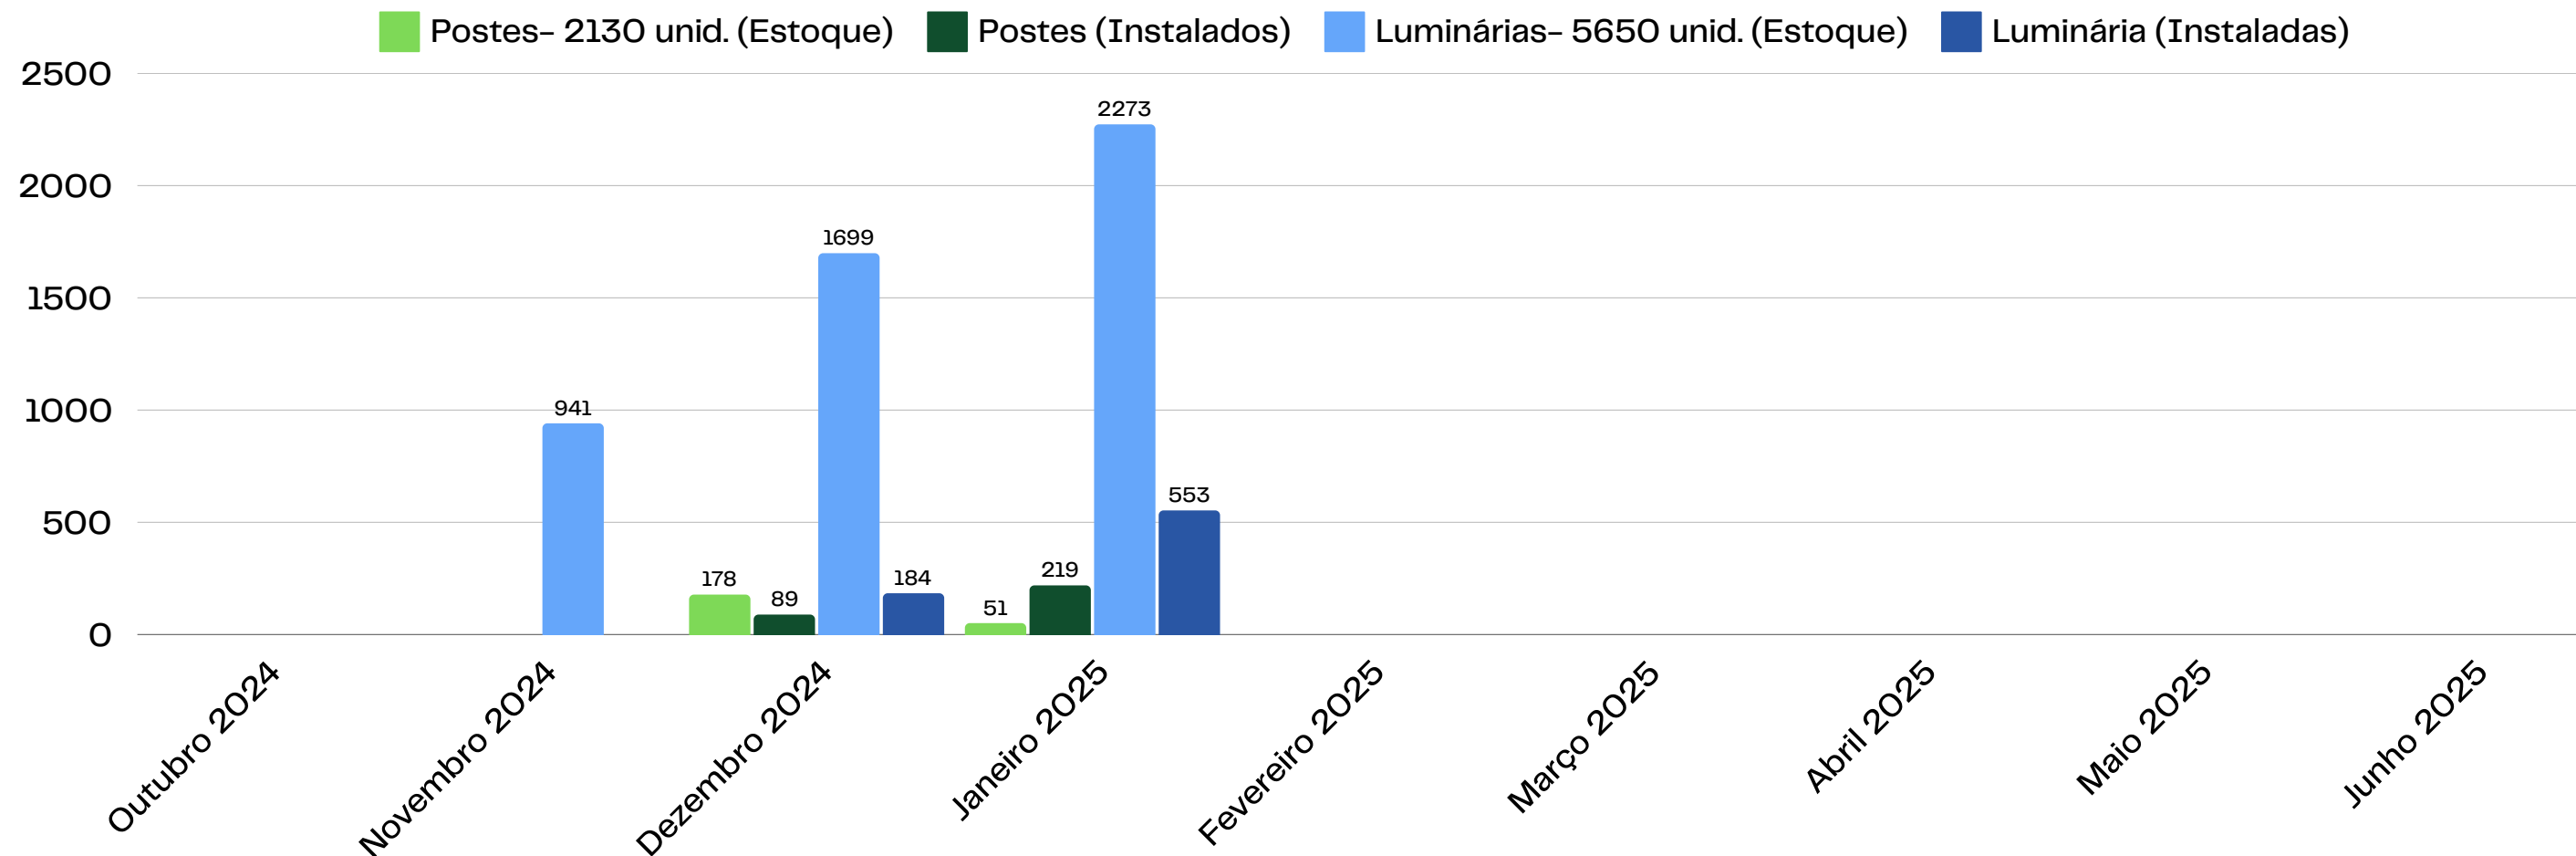



## **PONTOS POSITIVOS:**

*Avanço significativo de instalações de postes, suportes e luminárias com entrega de praças já iluminadas, conforme definição da prioridade pela Prefeitura, com a modernização de luminárias LED.*

## **PONTOS NEGATIVOS:**

*Circuito de distribuição apresentaram defeito após a modernização, gerando deslocamento e retrabalho.*

# AVANÇO CONTRATUAL

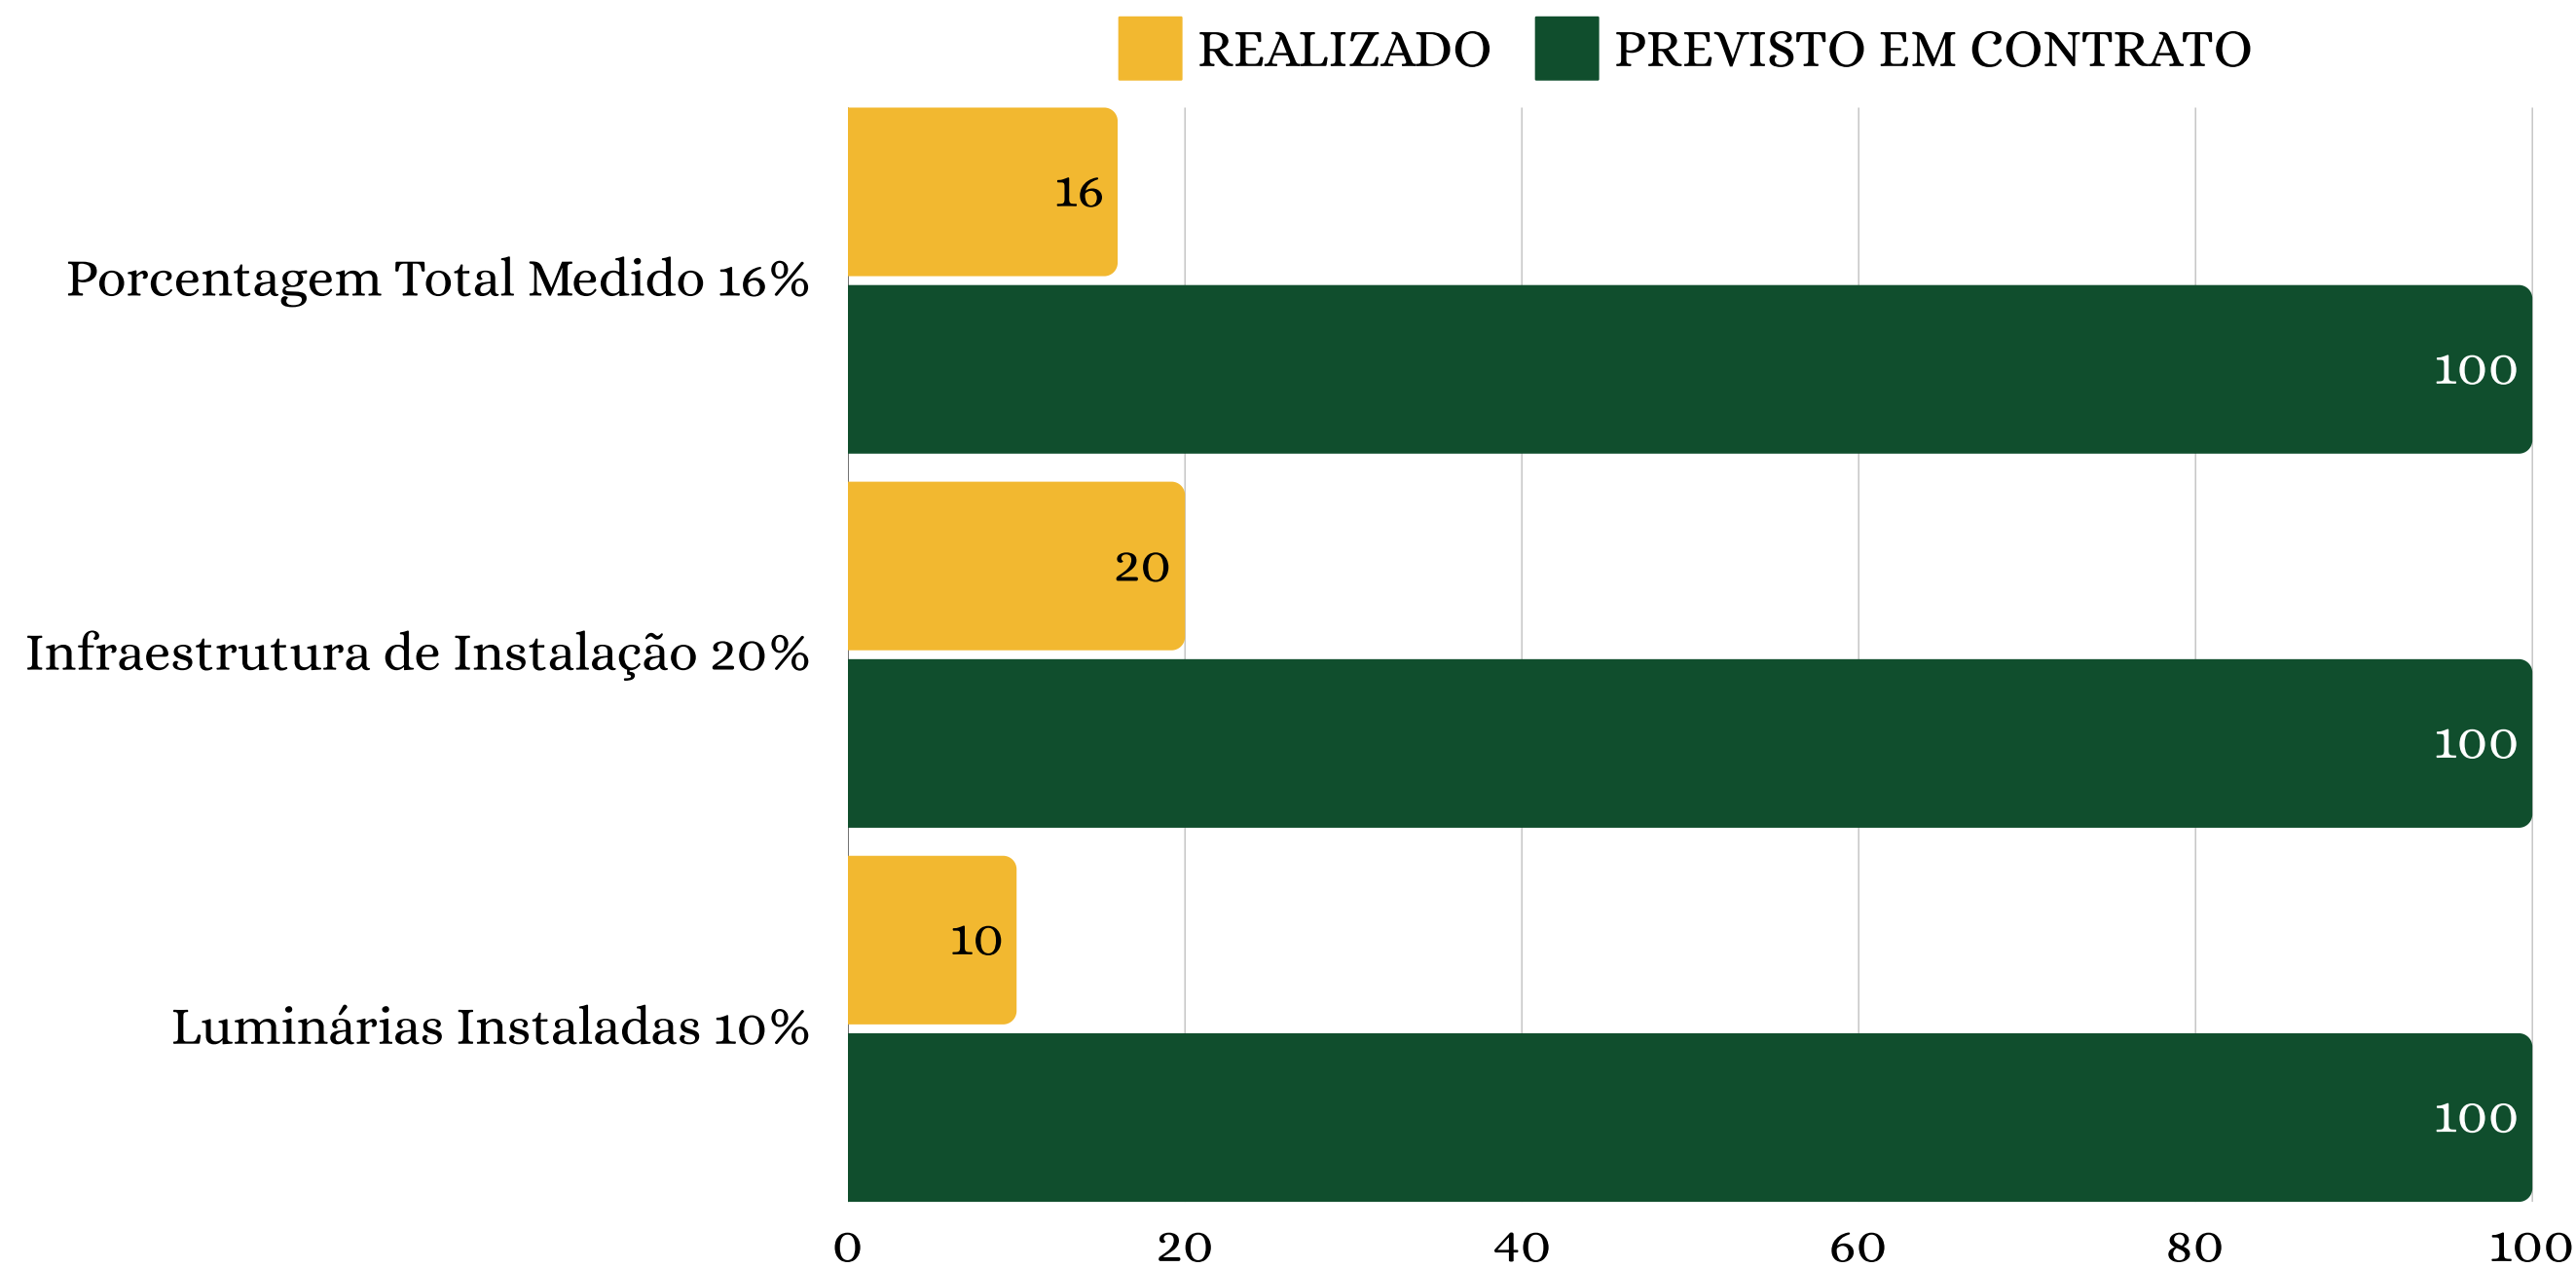



# CRÉDITO VERDE LIMEIRA – BRASIL BNDES

## Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos



1

Total de economia de energia propiciada pelo projeto: **1438kwh**

2

Tempo do projeto: **1 ano**

3

Volume total de carbono capturado pelo projeto: **0,1 tCO<sub>2</sub>e**





# PONTOS RELEVANTES

MÊS DE JANEIRO 2025



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



- **Vistoria Técnica:** Foram realizadas vistorias técnicas nas praças selecionadas para conhecer as condições atuais e identificar as áreas que serão modernizadas.
- **Análise de Localizações:** O projetista iniciou a análise das localizações dos postes existentes, a fim de elaborar os croquis que darão suporte aos estudos técnicos de luminotécnica.
- **Sinalização e Redefinição:** Foram realizadas as sinalizações das novas posições dos postes e a redefinição dos pontos de iluminação para a melhoria da distribuição luminotécnica das praças.
- **Preparação de Documentos:** O engenheiro responsável técnico da obra está organizando as medições realizando as ordens de compras prioritárias, elaborado os relatórios diários, bem como os relatórios semanais no padrão BNDES.
- **Início das Obras Civas:** Foram realizados serviços nas praças :
  - Praças piloto (04 praças)
  - Praças prioritárias ( 10 praças)
- **Serviços:** Escavação ( bases e passagem de infraestrutura dos eletrodutos), instalação de eletrodutos, reaterro das valas, confeccção de formas de madeira, instalação dos chumbadores e concretagem das bases nas seguintes praças:

- UC 220132 - ( PCA ADAO JOSE DUARTE DO PATEO, 0 - SEMA-IP - PRACA ADAO DUARTE DO PATE

- UC 1308661 - ( R ARGENTINA, 0 - SEMA-IP - PRACA - JD SANTANA )

- UC 33062951 - (R IZABEL PACHECO, 36 - SEMA-IP - PRACA - JD BRASIL)

- UC 41785606 - (R. ÂNGELO PETTO, 75-SEMA-IP- PRAÇA VER. PAULO MESQUITA)

- UC 31040225- (Rua DR. VELOZO, 381- SEMA-IP-PARQUE CIDADE)

- UC 218685- (PÇA. JOSÉ BONIFÁCIO-SEMA-IP - PRAÇA LARGO JOSÉ BONIFÁCIO)

-UC 218642 (PÇA. RICARDO RODRIGUES -SEMA-IP - PRAÇA RICARDO RODRIGUES

-UC 39729842 (R. DR. BELMIRO FANELLI, 390 (LADO LIMEIRÃO) -SOSP-IP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- UC 39729940 ( R. DR. BELMIRO FANELLI, 150 (LADO LIMEIRÃO) -SOSP-IP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- UC 40267776 ( R. DR. BELMIRO FANELLI, 195 (LADO LIMEIRÃO)- SOSP-IP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- UC 5284600 ( PÇA. NAÇÕES UNIDAS - SEMA-IP- PRAÇA NAÇÕES UNIDAS (Rosa R. Granzotto)



# PONTOS RELEVANTES

*MÊS DE JANEIRO 2025*



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



- UC 218.626 - ( PÇA. GAL. SALGADO - SEMA-IP - PRAÇA GENERAL SALGADO)
- UC 220.280 - ( R. JAIME CAMARGO-SEMA-IP-PRAÇA CALVÁRIO)
- UC 1.309.218 - ( R. CAP. FLAMÍNIO FERREIRA PÇ, 587-SEMA-IP- PRAÇA: IGREJA SANTA. TEREZINHA)
- UC 4.258.100 - (R. JOÃO FELÍCIO S/N - SEMA -IP- PRAÇA JOSÉ ALIBERTI)
- UC 4.258.134 - (PÇA. JD. STA LUCIA S/N - SEMA-IP-PRAÇA PEDRO DRAGONE)
- UC 4.258.193 - ( PÇA. MEDINA LIDIA LEVY- SEMA-IP- PRAÇA MEDINA LEVY)
- UC 5.284.589 - ( LARGO STA CRUZ - SEMA-IP- PRAÇA LARGO SANTA CRUZ)
- UC 5.284.597 - ( R. DR. HUMBERTO AMBRUSTER, 220 - SEMA- IP- FONTE DA PÇA SÃO SEBASTIÃO)
- UC 5.284.627 - (R. CARLOS CUNHA - SEMA- IP- PRAÇA SERGIO OTONI)
- UC 5.284.783 - (PÇA. CAPITÃO COSTA- SEMA- IP- PRAÇA CAPITÃO COSTA)
- UC 5.284.791 - (PÇA. EPIFANIO PRADO S/N - SEMA- IP- PRAÇA EPIFANIO PRADO)
- UC 218.537 - ( AV. SARGENTO PESSOTO- SOSP- IP- ILUMINAÇÃO)
- UC 4.258.185 - ( R. PROF. MARIA AP. SOARES. DE LUCA, 72- SOSP- IP- ILUMINAÇÃO)
- UC 5.284.678 - ( AV. AMBRÓSIO FUMAGALLI - ROTAT.- SOSP- IP- ROTATÓRIA)
- UC 39.789.802- ( R. LEOPOLDINA RIBEIRO MOREIRA CÉSAR, 390- SOSP- IP- ILUMINAÇÃO)
- UC 41.846.354 - ( R. EMÍLIO KUNTZ BUSCH, 340 - SOSP-IP- PASSAGEM DE PEDESTRE (ANAVEC))
- UC 4257960 - ( RUA HÉLIO BORTOLAN S/N, RUA JOSÉ NAVARRO 225)
- UC 4258088 - ( PRAÇA CALVARIO, RUA VEREADOR SAMUEL BERTO)
- UC 4258061 - ( PRAÇA JOSÉ ALIBERTI, RUA ODILON MARQUÊS DE ARAUJO)
- UC 4258061 - ( PRAÇA SÃO LUIZ, RUA ANGELO ALEGRE,77 )
- UC 218685- (PÇA. JOSÉ BONIFÁCIO-SEMA-IP - PRAÇA LARGO JOSÉ BONIFÁCIO)
- UC 52844783 - (PRAÇA CAPITÃO COSTA)
- UC 4257936 ( PRAÇA MANOEL BLASCO )

**FORTNORT**





ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



***OBRIGADO!***
