

RELATÓRIO MENSAL

CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES
CONTRATO Nº 149/2024 MUNICÍPIO DE
LIMEIRA



BOLETIM INFORMATIVO MENSAL

- NOVEMBRO 2024 -

BOLETIM INFORMATIVO MENSAL



NOVEMBRO 2024


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E ROTATÓRIAS COM MEDIÇÃO DE ENERGIA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA (CONTRATO 149/2024) – CONTRATO Nº 21.2.0288.1 BNDES

- Contrato de Modernização das 350 Praças com instalação de postes de Iluminação Pública nas tipologias 4 metros (1080 postes), 6 metros (710 postes) e 8 metros (340 postes), totalizando 2130 postes.
- Valor Global do Contrato: R\$ 10.817.649,91
- Início: 01/10/2024
- Término do Contrato: 30/06/2025



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

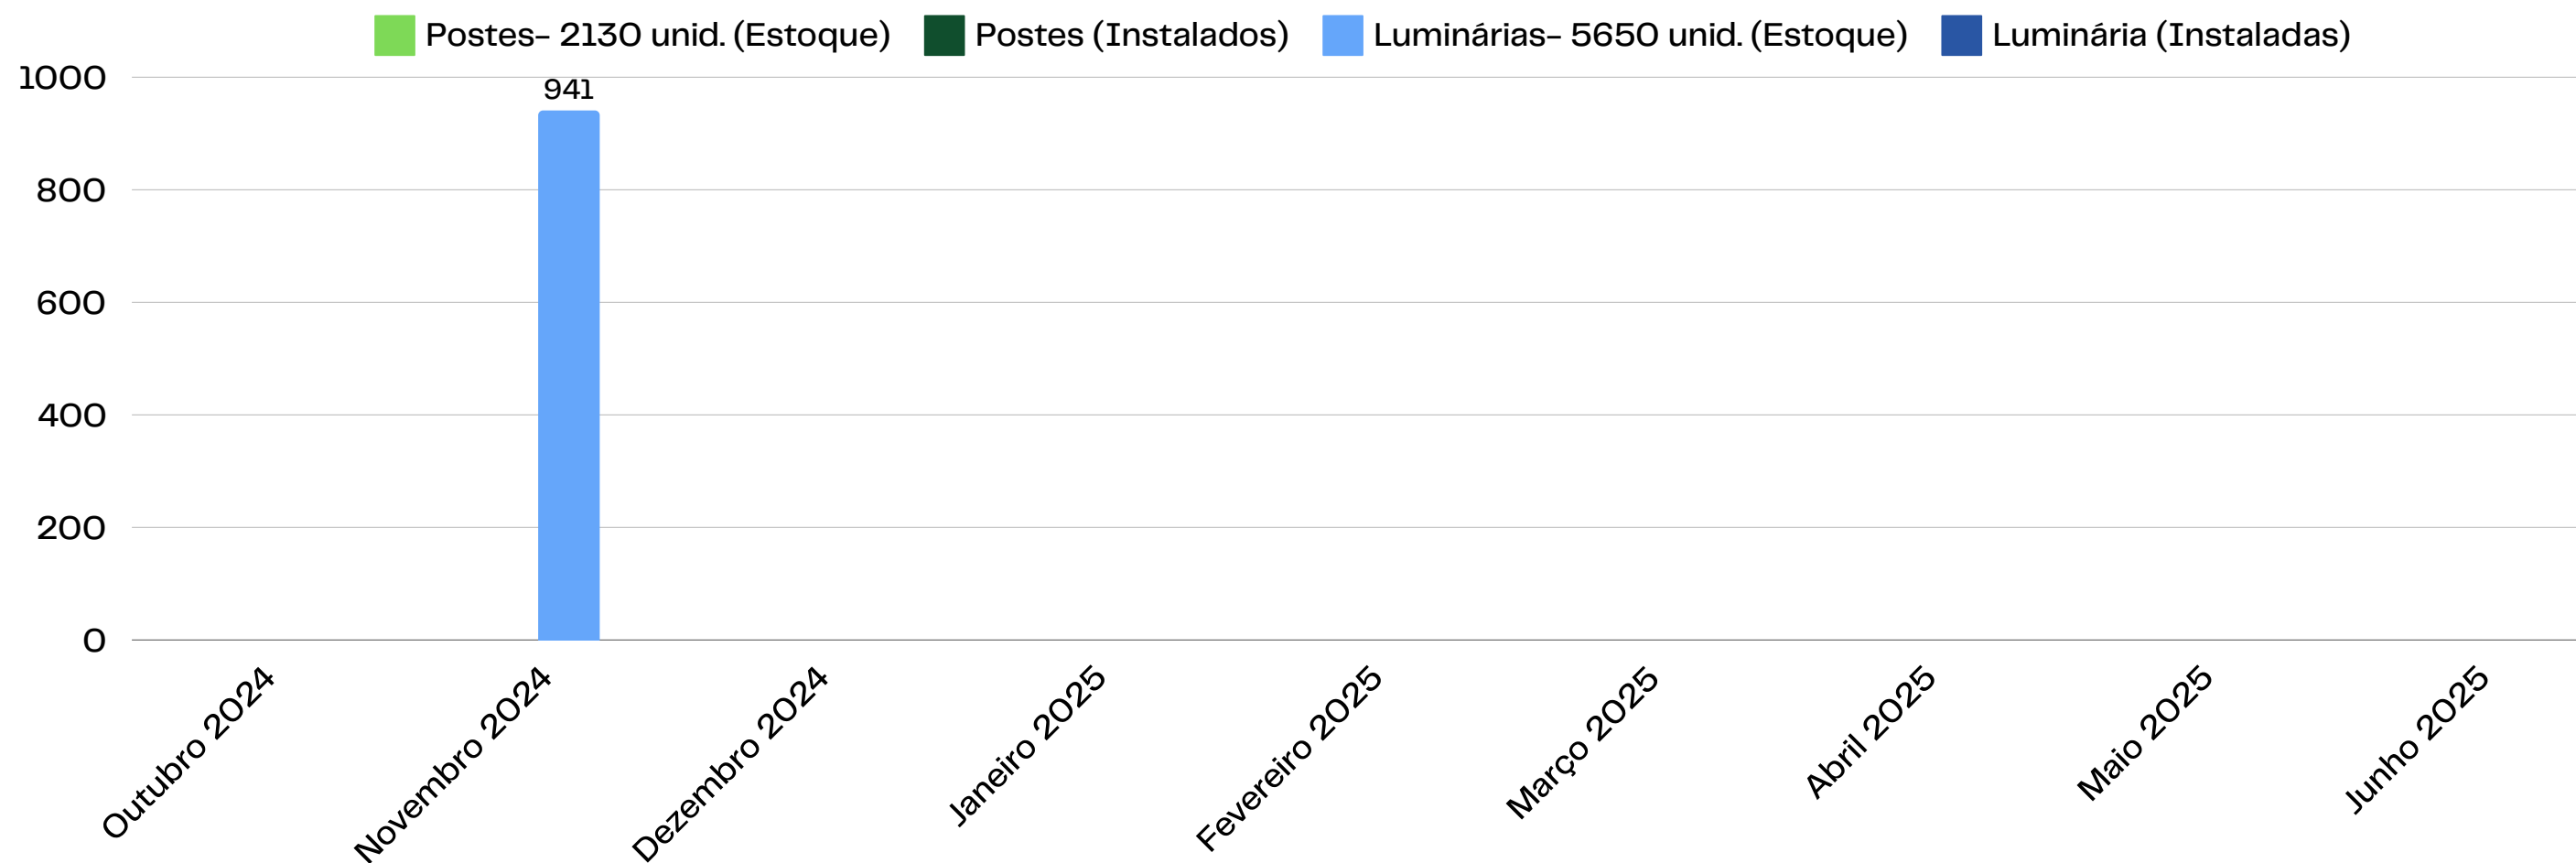


PONTOS POSITIVOS:

Foram realizadas as compras dos postes, luminárias, braços e chumbadores com previsão de entrega por lotes a partir do mês de dezembro.


PONTOS NEGATIVOS:

Não foram observados pontos negativos.

AVANÇO CONTRATUAL



REALIZADO PREVISTO EM CONTRATO

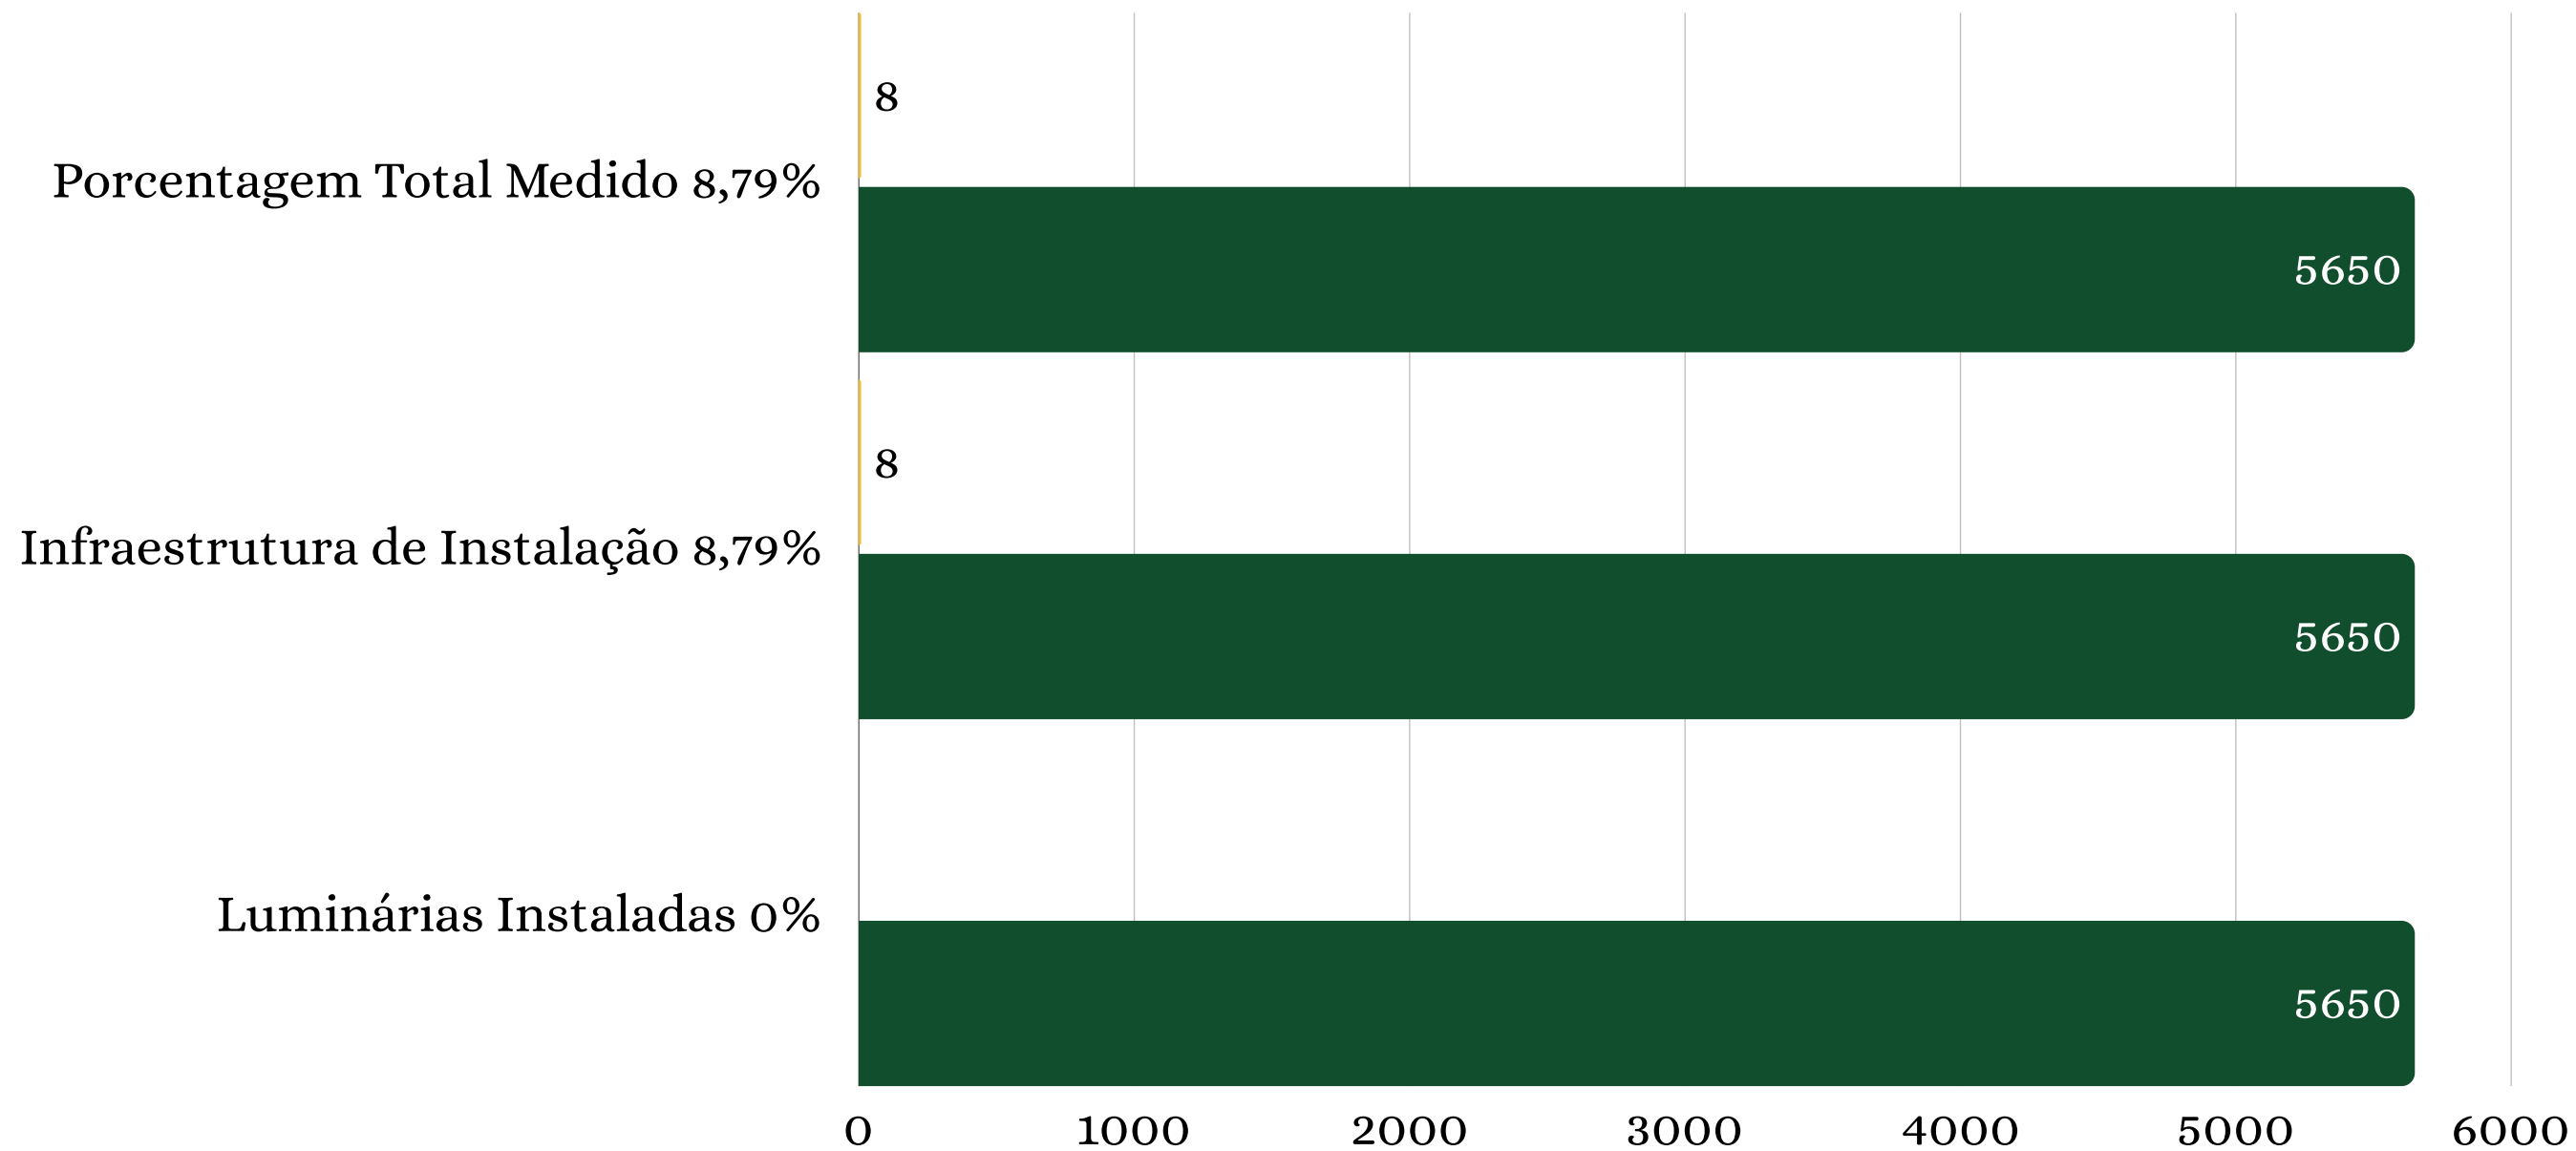

CRÉDITO VERDE LIMEIRA – BRASIL BNDES



Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos



1

Total de economia de energia propiciada pelo projeto: 0

2

Tempo do projeto: 0

3

Volume total de carbono capturado pelo projeto: 0 tCO₂e



OBSERVAÇÃO: Este item só poderá ser apresentado com a evolução do projeto

PONTOS RELEVANTES

MÊS DE NOVEMBRO 2024



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



- **Vistoria Técnica:** Foram realizadas vistorias técnicas nas praças selecionadas para conhecer as condições atuais e identificar as áreas que serão modernizadas.
- **Análise de Localizações:** O projetista iniciou a análise das localizações dos postes existentes, a fim de elaborar os croquis que darão suporte aos estudos técnicos de luminotécnica.
- **Sinalização e Redefinição:** Foram realizadas as sinalizações das novas posições dos postes e a redefinição dos pontos de iluminação para a melhoria da distribuição luminotécnica das praças.
- **Preparação de Documentos:** O engenheiro responsável técnico da obra está organizando as medições realizando as ordens de compras prioritárias, elaborado os relatórios diários, bem como os relatórios semanais no padrão BNDES.
- **Início das Obras Civas:** Foram realizados serviços nas praças :
 - Praças piloto (04 praças)
 - Praças prioritárias (10 praças)
- **Serviços:** Escavação (bases e passagem de infraestrutura dos eletrodutos), instalação de eletrodutos, reaterro das valas, confeccão de formas de madeira, instalação dos chumbadores e concretagem das bases nas seguintes praças:
 - UC 220132 - (PCA ADAO JOSE DUARTE DO PATEO, 0 - SEMA-IP - PRACA ADAO DUARTE DO PATEO)
 - UC 1308661 - (R ARGENTINA, 0 - SEMA-IP - PRACA - JD SANTANA)
 - UC 33062951 - (R IZABEL PACHECO, 36 - SEMA-IP - PRACA - JD BRASIL)
 - UC 41785606 - (R. ÂNGELO PETTO, 75-SEMA-IP- PRAÇA VER. PAULO MESQUITA)
 - UC 31040225- (Rua DR. VELOZO, 381- SEMA-IP-PARQUE CIDADE)
 - UC 218685- (PÇA. JOSÉ BONIFÁCIO-SEMA-IP - PRAÇA LARGO JOSÉ BONIFÁCIO)
 - UC 218642 (PÇA. RICARDO RODRIGUES -SEMA-IP - PRAÇA RICARDO RODRIGUES
 - UC 39729842 (R. DR. BELMIRO FANELLI, 390 (LADO LIMEIRÃO) -SOSP-IP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - UC 39729940 (R. DR. BELMIRO FANELLI, 150 (LADO LIMEIRÃO) -SOSP-IP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - UC 40267776 (R. DR. BELMIRO FANELLI, 195 (LADO LIMEIRÃO)- SOSP-IP- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - UC 5284600 (PÇA. NAÇÕES UNIDAS - SEMA-IP- PRAÇA NAÇÕES UNIDAS (Rosa R. Granzotto)

FORTNORT



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL



OBRIGADO!
