		<b>Relatório n°</b>	<b>1</b>		
		<b>Data do relatório</b>	<b>05/06/2023 - 04/07/2023</b>		
		<b>Dia da semana</b>	Segunda-Feira até Terça-Feira		
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	111/2023		
<b>Obra</b>	<b>Reforma da EMEI Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos</b>		<b>Prazo contratual</b>	122 dias	
<b>Local</b>	R. Prof. Fariz Elías, 140 - Jardim Olga Veroni, Limeira/SP		<b>Prazo decorrido</b>	30 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Márcio Liessi (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	92 dias

**Ocorrências (1)**

Serviços executados no período:

- Colocação da placa da obra;
- Demolições e retiradas;
- Execução da fundação da ampliação de salas;
- Impermeabilização da fundação;
- Alvenaria estrutural de bloco de concreto da ampliação de salas;
- Execução de laje pré moldada;
- Fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido em canaletas de águas pluviais;
- Instalações elétricas: Rasgos e colocação de eletrodutos;

Engº Civil Marcio Alexandre Liessi

Parecer técnico

**Comentários (1)**

Jaqueline 07/08/2023 12:02

Valor total da obra: R\$ 341.681,82

Objeto da Obra:

Reforma da EMEI "Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos".

Estudos Técnicos:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Secretaria de Educação - dotação nº 15.02.00 - 4.4.90.51.99 - 12 365 2001 1130.

Finalidade da Obra:

Adequar o prédio para que possa oferecer condições de segurança e sanitárias aos alunos e comunidade escolar, além da expectativa de que após as melhorias, o local possa expandir sua capacidade de atendimento.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira.

Público Alvo:

Alunos e funcionários da unidade de ensino.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preço nº 01/2023- Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Editais de licitação:

Tomada de Preço nº 01/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)


Contrato firmado:

Contrato nº 111/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05

**Fotos (15)**

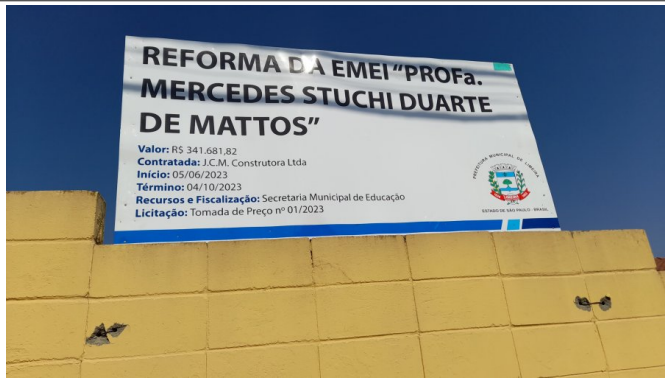

Fornecimento e colocação da placa da obra



Demolições e retiradas de pisos de concreto e cerâmicos



Demolições e retiradas de pisos de concreto e cerâmicos



Execução da fundação da ampliação das salas



Alvenaria estrutural de bloco de concreto da ampliação das salas



Alvenaria estrutural de bloco de concreto da ampliação das salas



Execução de laje pre moldada da ampliação das salas



Execução de laje pre moldada da ampliação das salas





Execução de laje pre moldada da ampliação das salas



Fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido em canaletas de águas pluviais



Fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido em canaletas de águas pluviais



Fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido em canaletas de águas pluviais



Fornecimento e colocação de grelha de ferro fundido em canaletas de águas pluviais



Instalações Elétricas: rasgos em alvenaria e passagem de eletrodutos corrugados



Instalações Elétricas: rasgos em alvenaria e passagem de eletrodutos corrugados
