Boletim Informativo Mensal – 1ª Mês, Período do dia 09/01/2023 a 31/01/2023.

31/01/2023

Boletim Informativo Mensal, 1ª Mês.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.

- Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias
- Valor Global do Contrato: 26.876.761,83
- Início:27/09/2022
- Término do Contrato: 26/03/2024

Avanço Contratual.

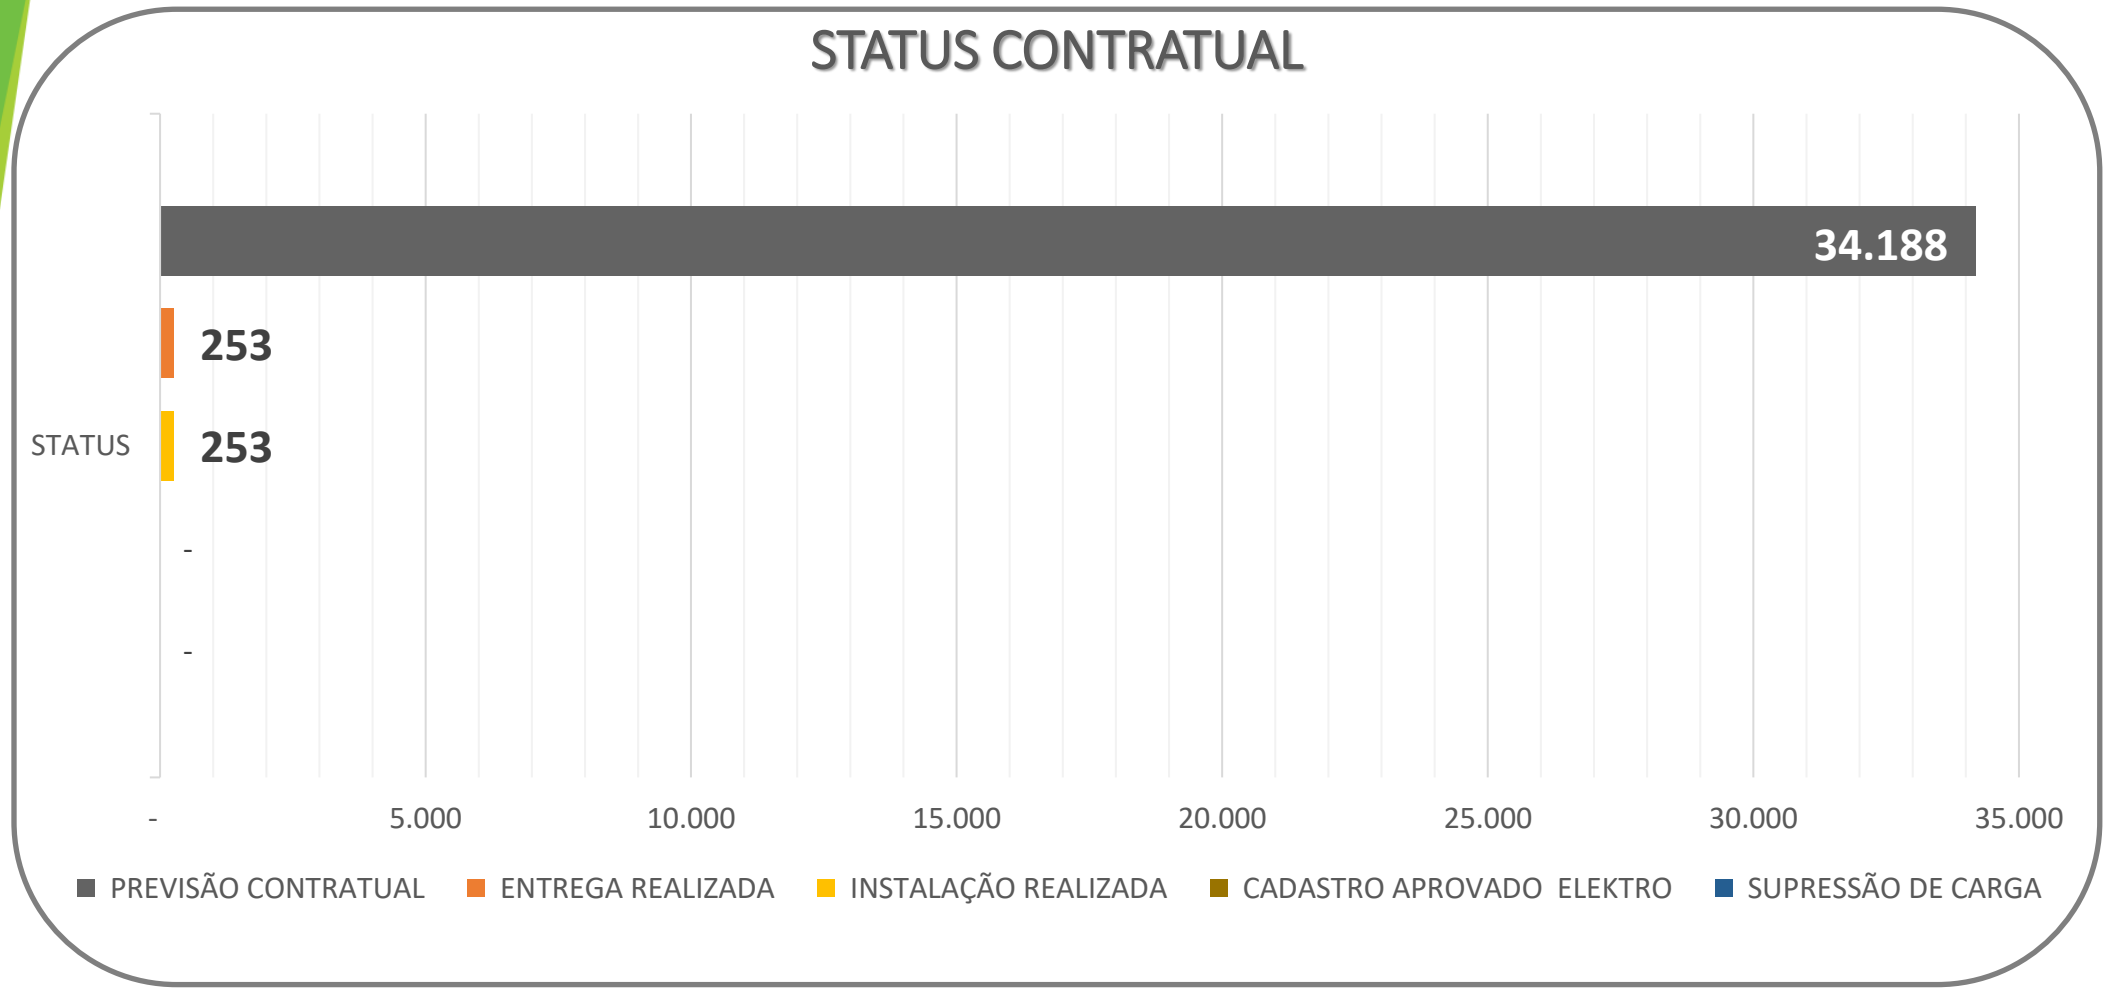

Estoque VS Instalação

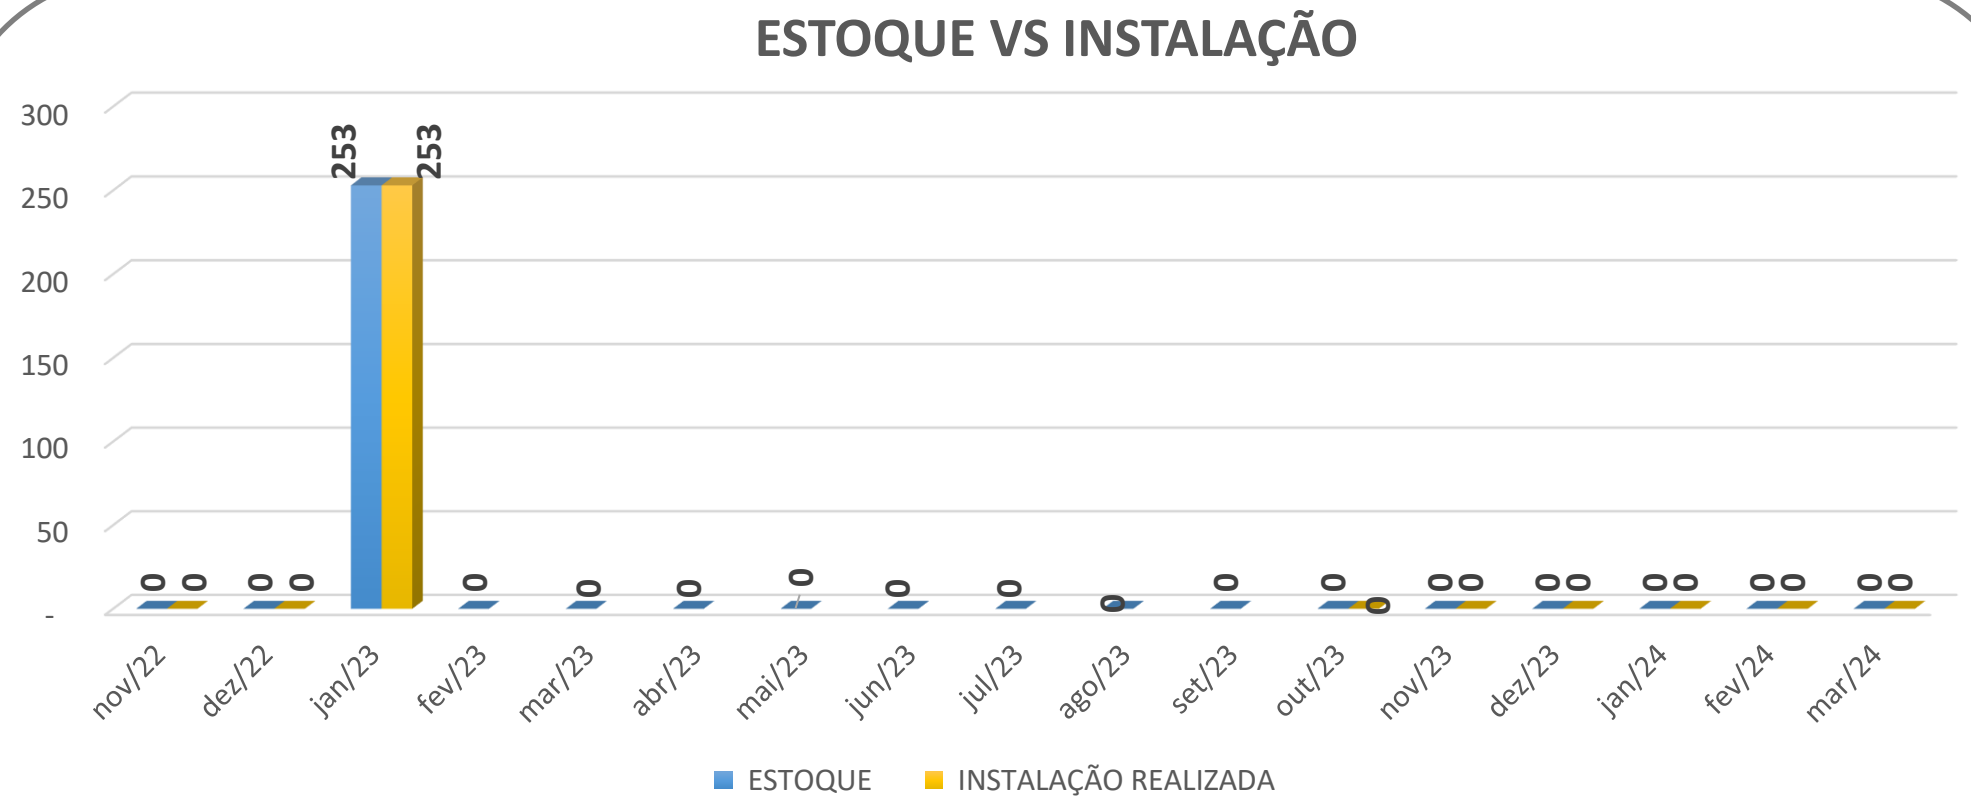

Ponto Positivo:

- Instalação de 253 luminárias de Led nas principais Avenidas da cidade de Limeira.

Ponto Negativo:

- Inconformidade na entrega das luminárias de 46W pelo fabricante, sendo devolvidas para ajuste de acordo com a especificação do contrato de Limeira.

Crédito Verde Limeira – Brasil BNDES

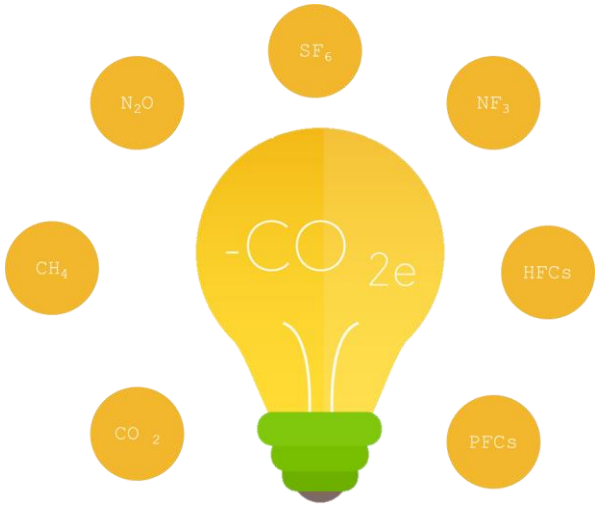

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos	
1- Total de economia de energia propiciada pelo projeto:	156.306 kWh/ano
2 - Tempo do projeto:	1 anos

Resultados	
1 - Volume total de carbono capturado pelo projeto:	**12,9 tCO2e**

Pontos Relevantes

- Condições climáticas instáveis no mês trazendo impacto na produtividade das equipes operacionais;
- Contratação de 2 Eletricistas para compor o quadro Operacional de Limeira;
- Conclusão de 100% da modernização das Avenidas: (i) Carlos Zaccarias, (ii) Carlos Gomes, (iii) e Avenida Araras.
- Primeiro lote da modernização do contrato 256/22 de Limeira a ser enviado para a concessionária Neonegia no dia 06/02/2023.

Obrigado!

alques

Conexão, eficiência e energia.

www.alques.com.br

Instagram:

Facebook:
