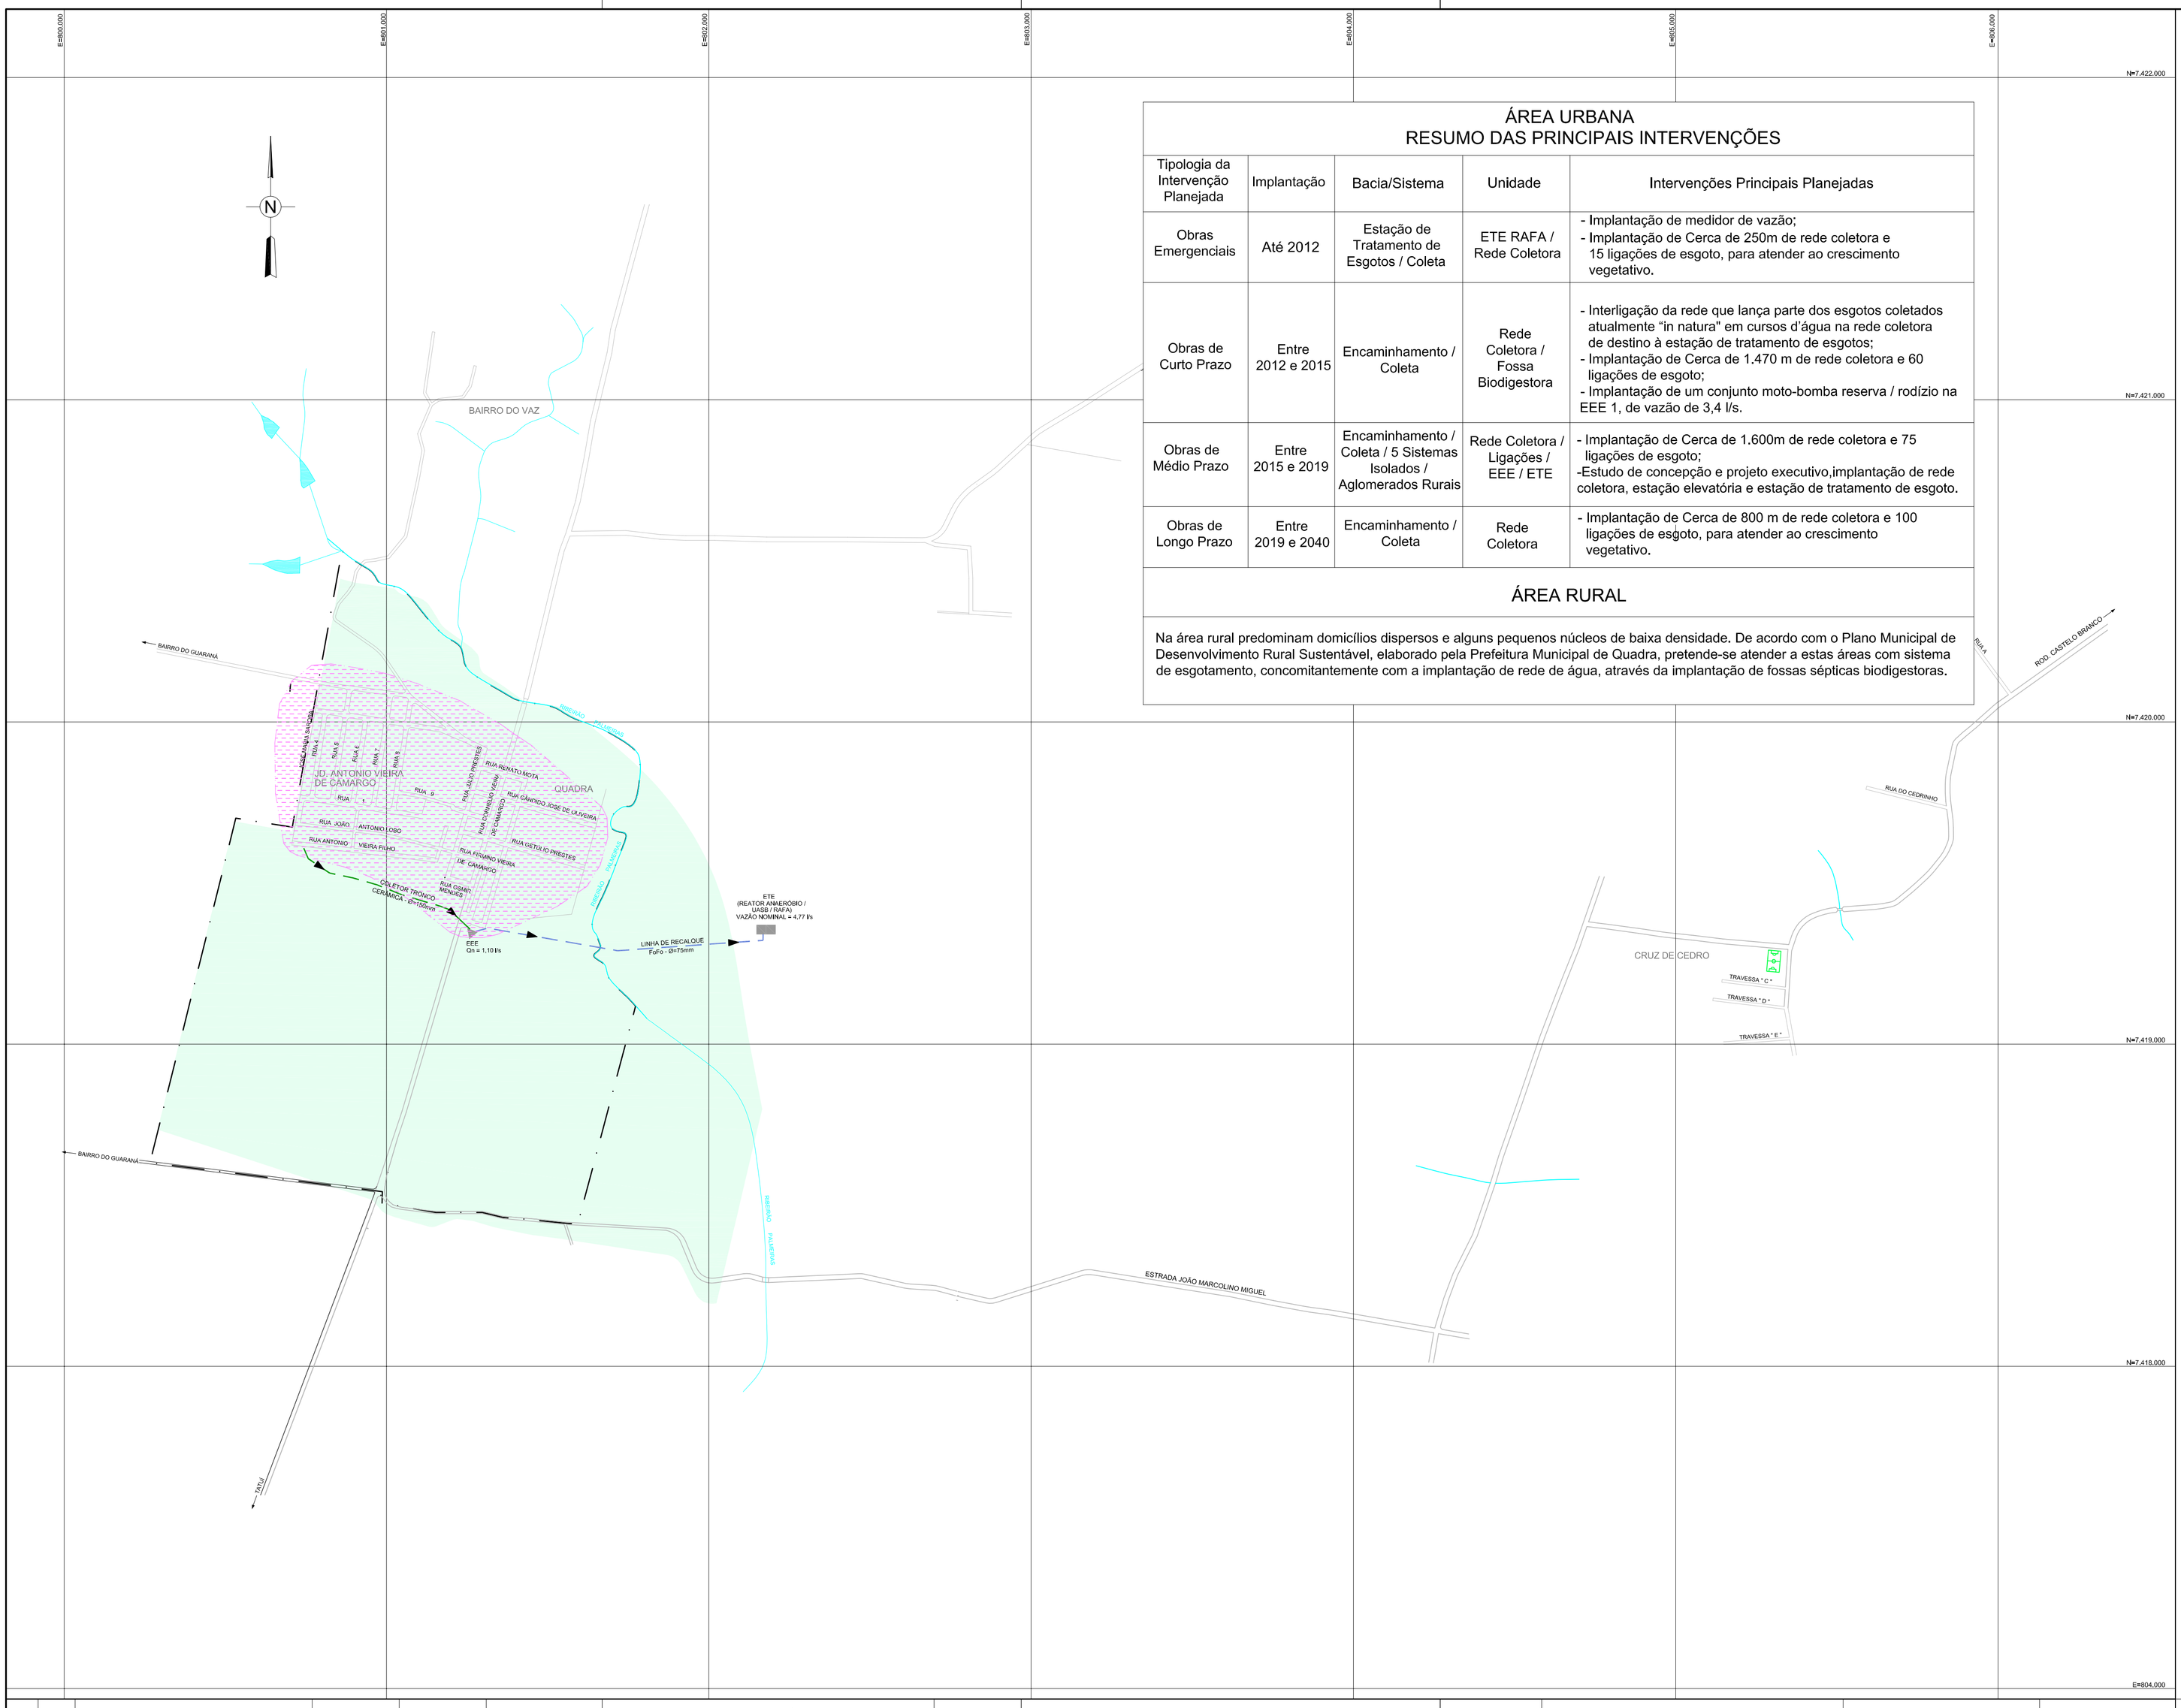

ÁREA URBANA
RESUMO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES

Tipologia da Intervenção Planejada	Implantação	Bacia/Sistema	Unidade	Intervenções Principais Planejadas
Obras Emergenciais	Até 2012	Estação de Tratamento de Esgotos / Coleta	ETE RAFA / Rede Coletora	- Implantação de medidor de vazão; - Implantação de Cerca de 250m de rede coletora e 15 ligações de esgoto, para atender ao crescimento vegetativo.
Obras de Curto Prazo	Entre 2012 e 2015	Encaminhamento / Coleta	Rede Coletora / Fossa Biodigestora	- Interligação da rede que lança parte dos esgotos coletados atualmente "in natura" em cursos d'água na rede coletora de destino à estação de tratamento de esgotos; - Implantação de Cerca de 1.470 m de rede coletora e 60 ligações de esgoto; - Implantação de um conjunto moto-bomba reserva / rodízio na EEE 1, de vazão de 3,4 l/s.
Obras de Médio Prazo	Entre 2015 e 2019	Encaminhamento / Coleta / 5 Sistemas Isolados / Aglomerados Rurais	Rede Coletora / Ligações / EEE / ETE	- Implantação de Cerca de 1.600m de rede coletora e 75 ligações de esgoto; -Estudo de concepção e projeto executivo,implantação de rede coletora, estação elevatória e estação de tratamento de esgoto.
Obras de Longo Prazo	Entre 2019 e 2040	Encaminhamento / Coleta	Rede Coletora	- Implantação de Cerca de 800 m de rede coletora e 100 ligações de esgoto, para atender ao crescimento vegetativo.

ÁREA RURAL

Na área rural predominam domicílios dispersos e alguns pequenos núcleos de baixa densidade. De acordo com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, elaborado pela Prefeitura Municipal de Quadra, pretende-se atender a estas áreas com sistema de esgotamento, concomitantemente com a implantação de rede de água, através da implantação de fossas sépticas biodigestoras.

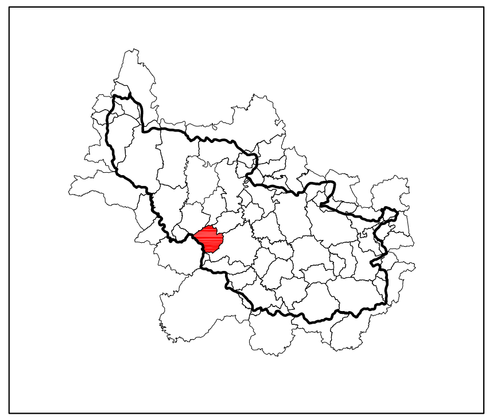

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ÁREA DE ESTUDO

LEGENDA

- HIDROGRAFIA
- LIMITE MUNICIPAL
- ESTRADAS MUNICIPAIS, AVENIDAS E RUAS
- LIMITE DA ZONA URBANA
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EXISTENTE
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EXISTENTE
- COLETOR-TRONCO EXISTENTE
- LINHA DE RECALQUE EXISTENTE
- ÁREA DE COBERTURA ATUAL

1:10.000 — 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8km

ESCALA GRÁFICA

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO

N O T A S

SSE

APROVADO __/__/__

ENGECORPS

DES.: EDUARDO	08/2010
PROJ.: MARIA BERNARDETE SOUSA SENDER - CREA 0601694180	08/2010
APROV. POR: DANNY DALBERSON DE OLIVEIRA	08/2010
CREA Nº 0600495622	

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Saneamento e Energia

Planos Integrados Municipais de Saneamento Básico - UGRHI10

QUADRA
SISTEMA DE ESGOTO
SOLUÇÕES PROPOSTAS

Nº

REV.: FL.:

Nº CONTRATADA 1063SSEGSTQUES02

ESCALA: INDICADA
